

四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖 育肥项目竣工环境保护验收意见

2021年8月23日，业主单位组织成立了项目竣工环境保护验收工作组，验收工作组由四川绿晨上品农业开发有限公司（建设单位）、四川优千胜环境工程有限公司（验收报告编制单位）、和邀请的技术专家组成。验收工作组在项目所在地会议室召开了建设项目竣工环境保护验收会，进行了现场查看和资料查阅，并对照检查了验收监测报告。

根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖育肥项目位于简阳市三星镇游林村十组，项目总占地面积15.71亩，总建筑面积约为4770m²，养殖场主要建设内容：包括3栋猪舍、饲料库房、杂物间、配电房、生活及办公区、宿舍、医疗废弃暂存间、固废暂存间、污水处理设施等。本项目仅养殖育肥猪，无母猪饲养，仔猪主要从本公司其他种猪场购买，存栏量为4200头，预计年出栏8400头育肥猪。

（二）建设过程及环保审批情况

简阳市发展和改革局以“川投资备[2019-510185-03-03-407506]FGQB-0564号”文对本项目进行备案。

2020年4月，四川绿晨上品农业开发有限公司委托云南善水环境科技有限公司进行本项目的环评评价工作，并负责编制环境影响报告书。

2020年4月，云南善水环境科技有限公司编制完成《四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖育肥项目环境影响报告书》的报批本。

2020年4月10日，成都市简阳生态环境局出具关于绿晨上品商品猪养殖育肥项目《环境影响报告书》的批复（见附件：简环承诺环评审〔2020〕8号），



同意本项目的建设。

（三）投资情况

项目总投资 1500 万元，其中环保投资 70 万元，环保投资比例 4.67%。

（四）验收范围

项目主体工程及其配套的环保设施等。

二、工程变动情况

根据验收报告表，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），项目不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目污水处理站采用“格栅+集水池+固液分离+沼气池+储液池”工艺进行处理，养殖废水和生活污水经污水处理站后，作为农肥浇灌。

（二）废气

项目养殖场废气主要包括各类恶臭（包括猪舍恶臭、临时堆粪棚恶臭、污水处理设施恶臭）、厨房油烟、备用发电机尾气及沼气。

项目猪舍恶臭通过加强管理、使用排泄物少的饲料及消毒等措施控制源头恶臭。后通过密闭负压抽风将猪舍恶臭由排风扇抽至管道，后经生物滴滤床除臭系统进行处理，在通过 15m 排气筒达标排放。项目临时堆粪棚日常保持密闭状态，由风机将堆粪棚产生的恶臭气体经集中收集后，与猪舍恶臭一同经过生物滴滤床装置处理后由 15m 高排气筒排放。对污水处理设施进行加盖，做到全封闭，项目的格栅定期捞渣，沼液池定期排放沼液（格栅、沼液池平常盖板处于关闭状态，排放沼液时打开盖板）。沼气经脱水脱硫净化后通过火炬燃烧。厨房油烟经油烟净化器处理后由管道引至屋顶排放。柴油发电机废气由自身携带的废气净化装置处理，处理后经管道引至房顶排放。

（三）噪声

项目运营后，养猪场噪声主要是猪叫声及水泵、风机等设备运行噪声；通过通过选用低噪声设备，基座减振，猪舍（砖混结构）隔声等措施，减少项目噪声对周围环境的影响。

（四）固体废弃物

项目猪粪采用干清粪工艺，人工清粪，每日清扫，由人工使用加盖推车将猪粪收集后运至临时堆粪棚暂存，当天外运至成都市绿康有机肥有限公司作有机肥原料。病死猪通过加强卫生防疫要求管理，加强监控，及时联系处置单位清运，猪只清运后，立即做好消毒工作。生活垃圾及时交环卫部门清运，餐厨垃圾及时交有资质单位清运处置。设置一间医疗废物暂存间，产生的废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物由暂存间进行暂时存放，定期交由有资质的单位进行处理。废脱硫剂废料暂存于仓库，由脱硫剂供应商回收处理。污水处理系统污泥同猪粪一起进入临时堆粪棚处理。废包装材料自行处理或交由环卫部门统一清运，回收利用。产生的废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。

（五）地下水防渗措施

项目将猪舍、隔离区、粪便临时堆存间、医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理设施和事故应急池确定为重点防渗区；检疫区、仓库、一般固废暂存间、变配电室、控制室确定为一般防渗区；办公生活区、厂区内道路确定为简单防渗区。

四、环境保护设施调试效果

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，项目污染物排放情况如下：

1、废气

验收监测期间，无组织废气监测中氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值要求；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值要求。有组织废气监测中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。

2、噪声

验收监测期间，噪声监测中各监测点位昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

五、验收结论

综上所述，验收工作组建议四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖育肥项目竣工环境保护企业自主验收合格。

六、后续要求

- 1、加强环保设备的日常管理和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。
- 2、加强项目猪舍、污水处理站等易产生恶臭生产设施及环保设施的运维管理，确保养殖场恶臭不扰民。
- 3、建议企业根据环评及环评批复的要求，并参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业（HJ 1029—2019）》开展自行监测工作。
- 4、加强项目危险废物识别和管理，强化危险废物收集、贮存、转移处置全过程台账记录管理，落实危险废物最终处置去向。


七、验收人员信息

详见附表《四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖育肥项目建设项目竣工环境保护验收人员信息表》。

专家签字:

蒋小雷 吴智胜 刘2

四川绿晨上品农业开发有限公司绿晨上品商品猪养殖育肥项目
竣工环境保护验收组签到表

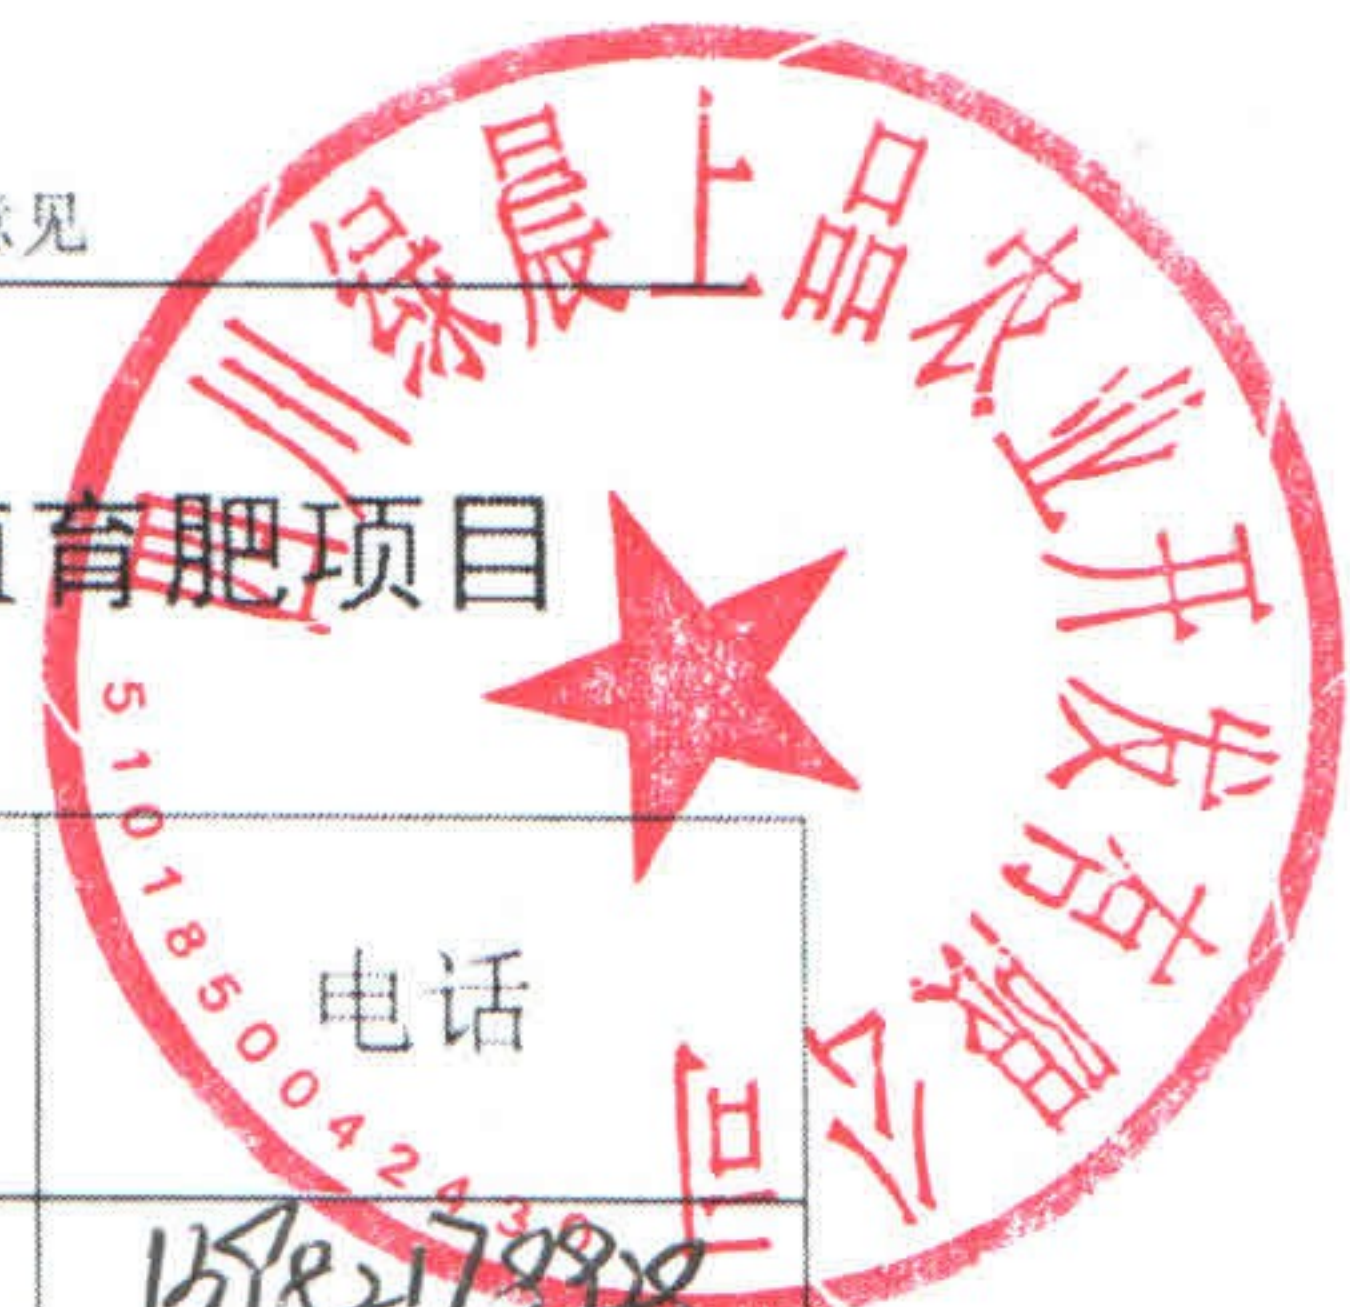

	姓名	职称（职务）	单位	电话
组长	曹静	总经理	四川绿晨上品农业开发有限公司	15982173928
专家	刘文	高工	成都市环境科学中心	13880767528
	蒋小雷	高工	西安爱特环保科技有限公司	1808057150
	吴官胜	高工	省评估中心	18728421880
相关部门及参会人员	周乐	工程师	四川优维环境工程有限公司	17628486919
	林大明	经理	四川绿晨上品农业开发有限公司	13320966006
	张其	组长	四川绿晨上品农业开发有限公司	18982988986

四川绿晨上品农业开发有限公司
