简阳市同合乡唐中顺家庭农场

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

日期：2023 年 11 月

目 录

1 项目概况 1
1.1 项目基本情况 1
1.2 项目环评历程 1
1.3 项目建设历程 1
1.4 排污许可证申领情况 1
1.5 验收工作内容 2
2 验收监测依据 3
3 项目建设情况 5
3.1 地理位置及平面布置 5
3.2 建设内容 6
3.3 主要原辅材料及设备 8
3.4 水源及水平衡 9
图 3-2 项目养殖场（其他季节）水平衡图（单位：t/d） 11
3.5 生产工艺 11
3.6 项目变动情况 15
4 环境保护设施 18
4.1 污染物治理 18
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况 22
5 环境影响评价主要结论、建议及批复 26
5.1 环境影响评价结论 26
6 验收执行标准 36
6.1 环境质量标准 36
6.2 污染物排放标准 38
6.3 质量保证和质量控制 39
6.4 总量控制指标 40
7 验收监测内容 41
8 质量保证及质量控制 42
8.1 无组织废气监测方法及仪器 42
8.2 噪声监测方法及仪器 42
8.3 执行标准 42
8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 42
8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 42
9 验收监测结果 44
9.1 环境保护设施调试效果 44
9.2 环境管理检查 45
10 周边公众意见调查 47
10.1 公众意见调查内容 47
11 验收监测结论 49
11.1 环保设施调试运行效果 49
11.2 验收结论 49

1 项目概况

1.1 项目基本情况

项目名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目（以下简称“本项目”）

建设性质：改扩建

建设单位：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

建设地点：简阳市三星镇干石山村 10 组

建设内容：项目于 2019 年建设一座生猪育肥场，包括 3 栋育肥舍以及配套的办公用房、环保工程及公辅工程设施，年存栏生猪 1000 头，出栏生猪 2000 头；后于 2020 年 2 月在原厂址内进行改扩建，新增 1 栋育肥舍及部分配套设施，并调整猪舍布局，养殖规模增加到年存栏 4000 头生猪（出栏 8000 头生猪）。

项目总投资：750 万元

生产班次：年工作 365 天，实行一班制（全天值班）。

1.2 项目环评历程

简阳市同合乡唐中顺家庭农场在简阳市三星镇干石山村 10 组建设简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目，项目总投资 750 万元。

简阳市发展和改革局以“川投资备［2205-510185-04-01-333937］FGQB-0100 号”文对本项目进行备案。

2022 年 4 月，简阳市同合乡唐中顺家庭农场委托四川优千胜环境工程有限公司进行本项目的环境影响评价工作，并负责编制环境影响报告书；

2022 年 8 月，四川优千胜环境工程有限公司编制完成《简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》的报批本；

2022 年 8 月 23 日，成都市简阳生态环境局出具关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目《环境影响报告书》的批复（见附件：简环评审〔2022〕22 号），同意本项目的建设。

1.3 项目建设历程

开工时间：本项目于 2022 年 9 月开始建设

竣工时间：于 2022 年 12 月竣工。

1.4 排污许可证申领情况

根据环境保护部第 48 号部令《排污许可管理办法（试行）》和环境保护部第 45 号部令《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》相关规定，本项目

已申请排污许可证，详见附件 7。

1.5 验收工作内容

1.5.1 验收工作由来

本项目工程现已建成，根据中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2020 年 4 月 16 日）、环境保护部国环规环评〔2017〕4 号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017 年 11 月 22 日）、生态环境部公告 2018 年第 9 号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告”（2018 年 5 月 15 日）等相关技术规范、标准要求，建设方自行组织进行项目竣工环保验收工作。

1.5.2 验收工作的组织与启动时间

本项目于 2022 年 12 月竣工，项目主体工程及配套建设的环保治理设施均按环评及其批复要求落实，并投入运行，项目主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常，具备项目验收监测条件。

2022 年 12 月，简阳市同合乡唐中顺家庭农场按照国家和四川省相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，简阳市同合乡唐中顺家庭农场特委托四川优千胜环境工程有限公司对本项目进行验收报告编制工作，四川优千胜环境工程有限公司接受委托后派出了专业人员队该项目进行现场踏勘，并对项目的环保手续履行情况、建成情况、环保设施建设情况进行了自查。并制定了验收监测方案，同时委托成都斯坦德分析检测有限公司进行本项目的验收监测工作，并于 2022 年 12 月 19 日至 12 月 20 日，对该项目废气、噪声及固废进行了现场监测检查；依据现场监测和检查结果，我公司于 2023 年 11 月完成了本项目验收监测报告的编制。

1.5.3 验收范围和内容

根据现场自查结果，本次验收范围主要涉及本项目主体工程、辅助工程、环保工程、办公及生活设施等，验收监测与调查主要包括下述内容：

（1）检查建设项目环境管理制度的执行和落实情况，各项环保设施或工程的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施的落实情况。

（2）监测分析建设项目废水、废气、噪声、固废排放达标情况和噪声达标情况。

（3）监测统计国家规定的总量控制污染物排放指标的达标情况。

2 验收监测依据

建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收依据如下：

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）；

2、中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2020 年 4 月 16 日）；

3、环境保护部国环规环评〔2017〕4 号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017 年 11 月 22 日）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1.施行）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1.实施）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1.施行）；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7.修改）；

8、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1.施行）；

9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号）；

10“关于进一步加强环境影响评价管理　防范环境风险的通知”（环发[2012]77 号）；

11、“关于切实加强风险防范 严格环境影响评价管理的通知”（ 环发[2012]98 号）；

12、国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知（国发〔2013〕37 号）；

13、国务院关于印发水污染防治行动计划的通知（国发〔2015〕17 号）；

14、国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31 号）；

15、《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38 号）；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 的公告（公告 2018 年 9 号），2018 年 5 月 15 日；

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

1、2022 年 8 月，四川优千胜环境工程有限公司编制完成《简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》的报批本；

2、2022 年 8 月 23 日，成都市简阳生态环境局出具关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目《环境影响报告书》的批复（见附件：简环评审〔2022〕22 号），同意本项目的建设。

2.4 其他文件

1、简阳市发展和改革局出具的四川省固定资产投资项目备案表，备案号：川投资备［2205-510185-04-01-333937］FGQB-0100 号（2022 年 05 月 31 日）。

2、其他业主提供资料 。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游，距成都市区 48 公里，距重庆市区约 220 公里。北倚龙泉驿区、金堂县，西连双流区、眉山市仁寿县，东南邻资阳市雁江区、乐至县，自古被誉为“蜀都东大门”。简阳地处四川盆地腹地，具有“密迩锦城，西控巴陵”的战略区位，位于四川盆地中部偏西边缘，踞沱江中游，龙泉山东麓。西北紧邻成都市中心城区，踞成渝高速公路、成渝高铁和国道 318、321 之要。市辖范围地跨东经 104°11′34″至 104°53′36″，北纬 30°04′28″至 30°39′0″，南北长 63.3 公里，东西宽 68.3 公里，面积 2213.4996 平方公里。

本项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，中心坐标：经度 104.619536°，纬度 30.600030°。具体地理位置见附图 1。

3.1.2 平面布置

猪场按照饲养分区的要求，场区功能分区大致分为猪舍区、办公生活区、环保粪污处理区。

①猪舍区

项目设置独立的车辆洗消区、转猪舍、烘干房、育肥舍。猪场按照饲养分区的要求，场区功能分区分为猪舍区、办公生活区、环保区。

项目包括 4 栋育肥舍，均为平层。每层猪舍的一端是水帘，另一端安装负压风机向外排风。猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，一方面起到降温的目的，另一方面可以将圈舍的少量恶臭气体排出。

所有圈舍都为封闭饲养，并备有夏季防暑、冬季保温设施。各类猪舍之间设有中央通道和周转车，用作猪群周转。排水系统实行雨污分离，场区内采取“干清粪工艺”，实现日产日清。

②综合办公生活区

项目综合办公生活区主要包括办公室、员工宿舍以及物资仓库，与猪舍生产区、粪污处理区严格分离开来。

③环保区

环保区主要包括污水处理站以及堆粪棚，污水处理站包括粪污收集调节池、干湿分离机、沼液池、储液池和储存池（位于山顶）。其中粪污收集调节池和干湿分离机均位于堆粪棚内。项目处理达标后的废水通过管道输送至项目四周的土地进行农灌，北侧专门设置 1 个出入口，便于粪污运出。

厂区总平面布置详见附图。

3.2 建设内容

基本情况：

1、项目名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

2、建设单位：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

3、建设地点：简阳市三星镇干石山村 10 组

4、建设内容及规模：项目于 2019 年建设一座生猪育肥场，包括 3 栋育肥舍以及配套的办公用房、环保工程及公辅工程设施，年存栏生猪 1000 头，出栏生猪 2000 头；后于 2020 年 2 月在原厂址内进行改扩建，新增 1 栋育肥舍及部分配套设施，并调整猪舍布局，养殖规模增加到年存栏 4000 头生猪（出栏 8000 头生猪）。

3.2.1 项目产品方案及规模

本项目仅养殖育肥猪，无母猪饲养，仔猪主要从本公司其他种猪场购买，存栏量为 4000 头，年出栏 8000 头育肥猪。根据现场踏勘情况，结合环评设计，本项目设计和实际生产的产品及规模对表见下表。

表 3-1　项目设计与实际生产的产品及规模对照表

序号	类别	环评存栏量（头）	环评出栏数量(头）	实际存栏量(头）	实际出栏量（头）
1	育肥猪	4000	8000	4000	8000

3.2.2 项目组成

本项目总占地面积 12.3956 亩，总建筑面积约 6176m^2。本项目仅养殖育肥猪，无母猪饲养，仔猪主要从本公司其他种猪场购买，存栏量为 4000 头，年出栏 8000 头育肥猪。其具体组成情况见下表。

表 3-2　项目组成情况一览表

项目组成		环评建设内容及规模	实际建设内容及规模	备注
主体工程	猪舍（包括 4 栋育肥舍）	项目猪舍位于厂区中部，包括 4 栋育肥舍。猪舍内为砖混结构，为密封式，采用自然通风和负压机械通风相结合。轴流式风机将舍内污浊空气抽出，舍内气压低于舍外，舍外空气由进风口流入。猪舍内为微负压状态。 育肥舍 1：为 1 栋 1F 平房，建筑面积 530m^2，长 53m，宽 10m，楼层高度 3.3m，设置 1 个育肥单元。通过调整布局，	与环评一致	

		可容纳 600 只生猪的圈养。		
		育肥舍 2：为 1 栋 1F 平房，建筑面积 610m^2，长 61m，宽 10m，楼层高度 3.3m，设置 1 个育肥单元。通过调整布局，可容纳 800 只生猪的圈养。		
		育肥舍 3：为 1 栋 1F 平房，建筑面积 854m^2，长 61m，宽 14m，楼层高度 3.3m，设置 1 个育肥单元。通过调整布局，可容纳 1000 只生猪的圈养。		
		育肥舍 4：为 1 栋 1F 平房，建筑面积 1764m^2，长 63m，宽 28m，楼层高度 3.3m，设置 2 个育肥单元。通过调整布局，可容纳 1600 只生猪的圈养。		
辅助工程	消毒房	设置 1 个烘干房，员工进入生产区之前均需要进行隔离消毒，建筑面积分别为 50m^2	与环评一致	
	堆粪棚	位于厂区北侧，1 间，建筑面积 162.5m^2，长 13m，宽 13m，内设 1 台干湿分离平台、1 个收集调节池（118m^3），需要整改新增 1 个粪便堆槽（长 4m，宽 3m，建筑面积 12m^2），主要用于粪便干湿分离	与环评一致	
	中转料塔	设置 3 个中转料塔，1 个料塔 15t，1 个 20t，1 个 25t，料塔直径 3m，分布于厂区东侧	与环评一致	
公用工程	供水	取水主要来自自来水	与环评一致	
	供电	市政供电，场外 10kv 专用供电线；场内 1 个配电房	与环评一致	
	供热	猪舍供热由保温灯、地暖	与环评一致	
	通风	设置空气源模块式热水机组，电加热	与环评一致	
	污水管网	项目全厂设置污水管网，污水管网沿着圈舍外侧铺设，采用地埋式铺设。污水管网将圈舍生活用房和猪舍废水收集起来后，最终进入场内污水处理站。	与环评一致	
	进出场道路	场内道路为混凝土路面，主干路宽 6m，场内道路 3m	与环评一致	
办公及生活设施	门卫房	位于厂区入口，1 栋 1F，建筑面积 42m^2。主要作为门卫用房，同时还包括生活区寝室、更衣室、淋浴室等	与环评一致 与环评一致 与环评一致 与环评一致	
	综合办公生活区	位于厂区入口处，设置有 1 栋门卫室，1 栋员工办公生活区，建筑面积 24m^2。包括仓库、办公室、会议室、监控室等		
	生产区消毒房	位于项目厂区中部，1 栋 1F，建筑面积 21m^2。主要用于生产人员进入养殖区进行消毒		
	生产区隔离房	位于项目厂区中部，1 栋 1F，建筑面积 10m^2。主要用于生产人员隔离		
环保工程	废水	本项目自建一座处理规模为 50m^3/d 的污水处理站，采用“粪污收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”的处理工艺处理后作为养殖废水进行粪污还田	与环评一致	
		事故池 80m^3，1 座，位于 4#圈舍旁	与环评一致	
		消纳区：项目不设置田间暂存池，采用电力抽排机为动力方式将污水处理区的水输送到消纳区田间。采用串联双电机组，可以达到 5km 的输送距离。 在污水站设置 1 座容积为 16900m^3 的储存池（储存池为不规则梯形体，池顶长 65m、平均宽 42m；池底长 55m、平均宽 35m；深 7.3m），项目共设置 11 个小型提升泵站，同时设置输送管网约 15km。	与环评一致	
	废气	圈舍水帘通风+猪舍投放吸附剂和喷洒除臭剂+优化饲料结构+圈舍出口生物喷雾除臭	与环评一致	

		粪污收集调节池、干湿分离机设置在堆粪棚内，对堆粪棚进行系统封闭，采用风机将堆粪棚内的臭气收集起来后，通入 4#养殖圈舍排气扇外，同圈舍内恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式进行处理。同时每天在堆粪棚内多次喷洒除臭剂	与环评一致	
		对储液池、储存池进行加盖，收集储液池沼气，与沼液池产生的沼气一同经脱水脱硫后收集起来，暂存于沼气柜内，然后通过 1 根 4m 的火炬燃烧	与环评一致	
	沼气柜	紧邻污水处理站新增 1 个沼气柜，容积为 50m³	与环评一致	
	固废	项目设置 1 间堆粪棚，建筑面积约 169m²，长 13m，宽 19m，位于厂区北侧。在堆粪棚内整改新增 1 个堆粪槽，长 4m，宽 3m，建筑面积 12m²	与环评一致	
		项目整改新增 1 间危废暂存间，位于 1#圈舍旁，长 4m，宽 3.6m，建筑面积 14.4m²	与环评一致	

3.3 主要原辅材料及设备

本项目环评和实际建设中原料、辅料、燃料消耗情况详见下表。

表 3-3　项目主要原辅材料消耗

项目	名称	环评改扩建后年耗量	实际改扩建后年耗量	主要化学成分	备注
主（辅）料	成品饲料原料（固态颗粒物）	3986.64t	3986.64t	玉米 70%，蛋白质原料 20%，其他 10%	外购
	脱硫剂	0.1t	0.1t	Fe_2O_3 屑(或粉)和木屑混合制成脱硫剂	改扩建整改完成后需要进行脱硫
	除臭剂	10t	10t	主要是一些多孔矿石粉	外购，用于养殖区、污水处理站、堆粪棚除臭
	杀虫剂	80L/a	80L/a	过氧乙酸、聚维碘酮等	外购
	消毒剂	10 桶（5L/桶）	10 桶（5L/桶）	过氧乙酸、次氯酸钠、聚维碘酮等	外购
	疫苗、兽药	/	/	根据投产后实际情况定	当地防疫站
能源	电	28 万 kWh	28 万 kWh	/	当地电网提供
	沼气	7813.76Nm³/a	7813.76Nm³/a	主要成分 CH_4	自产
	水	11844.17m³	11844.17m³	/	取用地下水

本项目实际建成的工艺设备与环评相符，详见下表。

表 3-4　环评设计及实际建成的设备对照表

序号	设备名称	单位	规格型号	环评扩建完成后数量	实际扩建完成后数量
一、猪舍					
1	水泥漏缝板	m²	1500*600*100MM	60	60
2	料塔	t	15T,20T,25T	60	60
3	风机	套	1400MM*1200MM,薄铁外壳，铸铁扇叶，0.75KW 电机	24	24

4	风机	套	1200MM*1000MM，薄铁外壳，铸铁扇叶，0.75KW 电机	6	6
5	水帘	套	1、湿帘纸型号为 7090 型，湿帘纸厚度为 150±2mm，湿帘外框材质为铝合金； 2、固定支架为镀锌板材质； 3、水帘尺寸 4.2m*1.35m	14	14
6	饮水器	个		400	400
二、消毒淋浴更衣室					
7	紫外线灯	套	益辰	3	3
三、检疫区					
9	显微镜	台	米欧特	1	1
10	针头	盒	/	50	50
11	缝合针	包	/	50	50
12	剪刀	把	得力	10	10
13	冰箱	台	美的	1	1
四、消毒设备					
14	消毒喷雾器	台	川阳	6	6
15	高压清洗消毒设备	台	卡赫	2	2
五、环保设备					
16	干湿分离机	台	盛鼎环保	1	1
17	沼气净化设施	套	/	1	1
18	沼气柜	台	/	1	1
六、其他					
19	工作服	套	/	13	13
20	赶猪板	个	/	3	3
21	推粪车	台	/	1	1
22	消防设备	套	/	1	1
23	场内饲料运输车	台	/	1	1
24	电脑管理软件	套	/	1	1

由上表可知，设备的数量、规格型号均一致。

3.4 水源及水平衡

3.4.1 养殖场用水情况

本项目用水主要包括猪只饮用水、猪舍冲洗水、车辆洗消用水、水帘降温用水、工作人员生活用水及未预见用水等。

3.4.2 养殖场废水情况

项目生产废水主要是猪尿、干湿分离机脱水、进入污水处理站的猪粪、猪舍冲洗水、车辆洗消废水、废气处理设施废水。

根据以上统计，项目水平衡见下图：

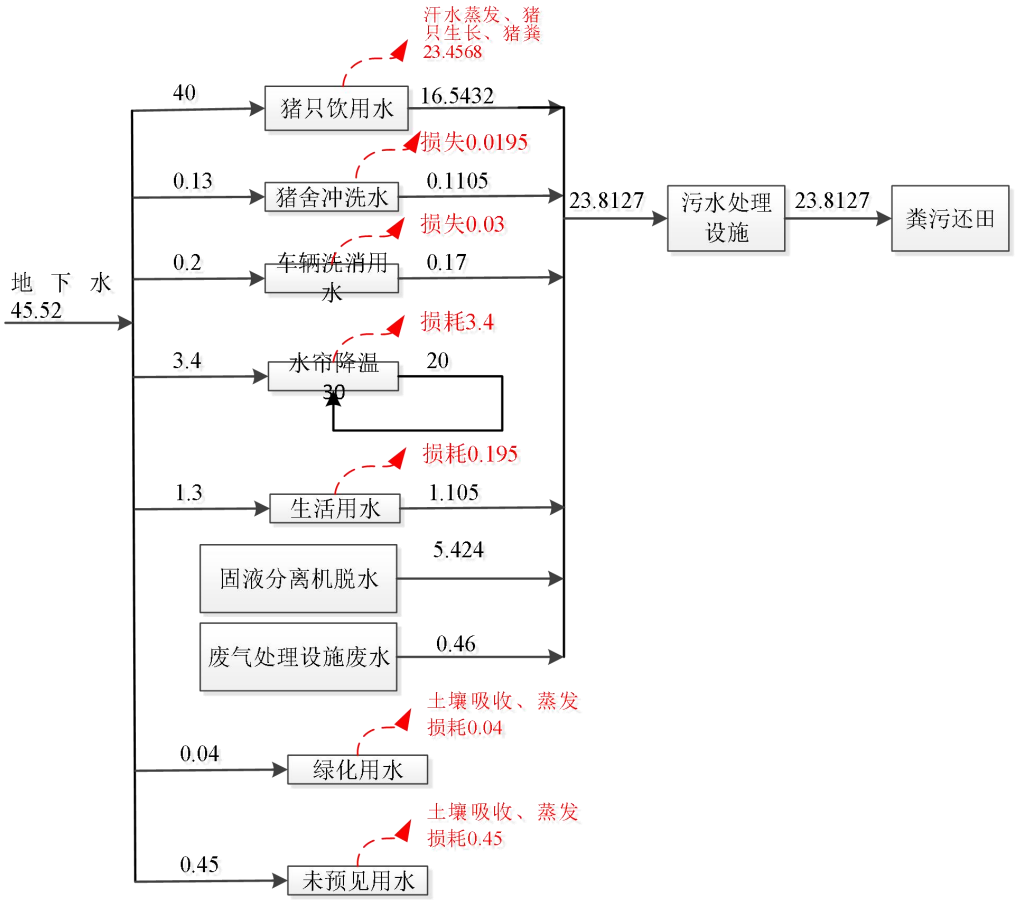


图 3-1 项目养殖场（夏季）水平衡图（单位：t/d）

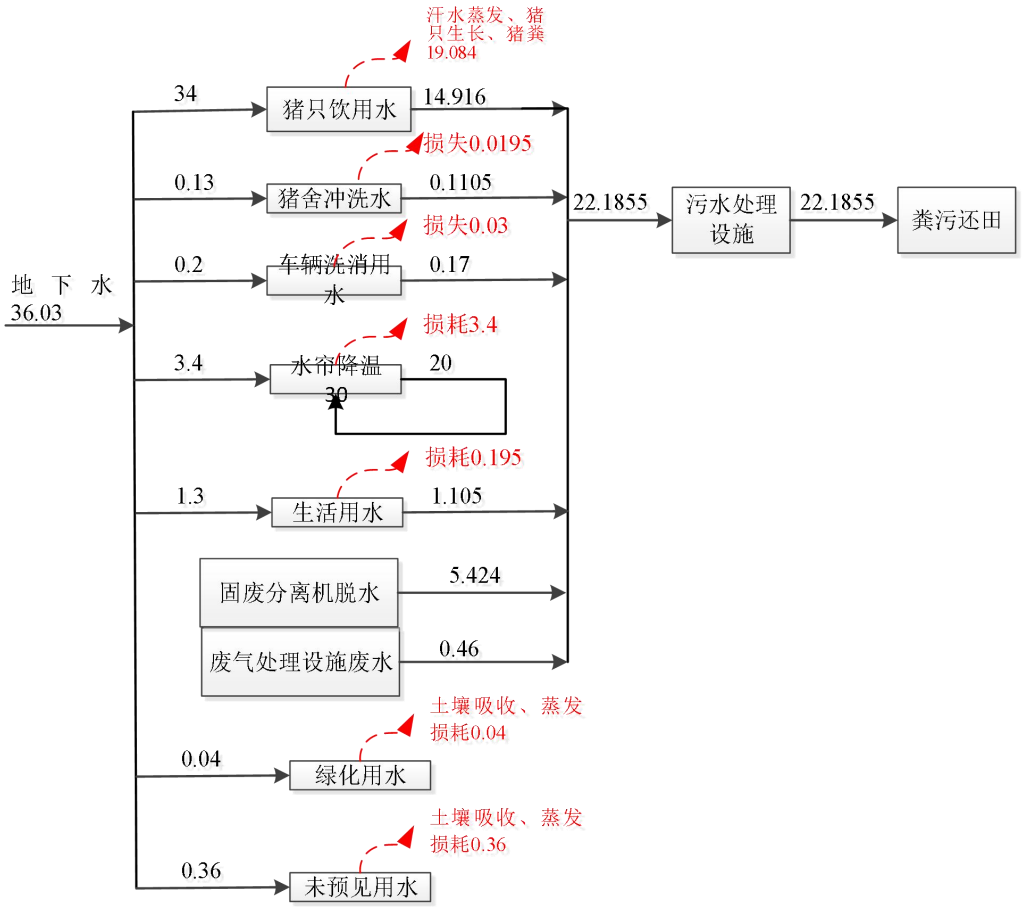


图 3-2 项目养殖场（其他季节）水平衡图（单位：t/d）

3.5 生产工艺

项目工艺生产流程主要包括生猪养殖工艺、饲养工艺、清粪方式、猪粪和污泥处理工艺、病死猪处置工艺、猪舍防疫及消毒措施工艺、沼气净化及综合利用工艺、其他工艺等。

3.5.1 生猪养殖工艺流程

本项目猪场为育肥猪场，猪场内不涉及母猪、种猪饲养。育肥品种来源于周边其他种猪场的仔猪，经哺乳 21 天左右，生长到约 7 斤，经体检合格后送入本养殖场进行育肥。进入本养殖场的仔猪首先进入猪场的隔离区，隔离观察约 1 周，经检查确保健康后再送入保育舍进行保育后，再送入育肥舍进行育肥。

养殖流程及产污位置如下图所示。

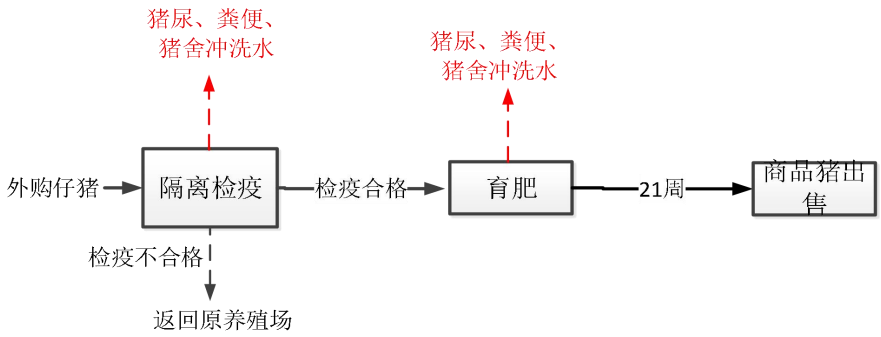


图 3-3 营运期养殖流程及产污位置示意图

工艺流程简述

本项目一年育肥两批次，一批次同进同出。项目引入周边其他种猪场的仔猪，一批次引入 4000 头体重 7 公斤的 21 天断奶仔猪，在圈舍内先经过 7 周的饲养先保育至 30 公斤，然后再经过 14 周饲养后育肥至 120 公斤出栏，一批次出栏量 4000 头。项目一年育肥两批次，共引入 8000 头仔猪，出栏 8000 头生猪。

3.5.2 饲养工艺

（1）饲养环境：农村环境。

（2）饲养条件：外购成品饲料，饲料为颗粒状，通过自动喂料机进行投喂，不需进行场内二次加工。

（3）上料系统工艺说明

本项目不涉及饲料加工生产，直接外购成品饲料，采用饲料塔贮料，自动喂料。饲养采用干喂方法，饲料为颗粒状，无粉尘产生。猪只饲料喂养工艺流程主要包括饲料装卸、储运、使用等环节。

（4）饮水系统说明

项目采用猪只咬嘴进行饮水，当猪只需要喝水的时候，猪只只需要咬住咬嘴，咬嘴就会自动出水，一旦停止咬嘴，就停止出水。

3.5.3 清粪方式

项目采用全漏缝地板干清粪工艺，猪舍内产生的猪粪和尿首先依靠重力进入缝隙地板下的排粪沟，然后猪尿和猪粪分开进行收集和处理。

3.5.4 猪粪和污泥处理工艺

本项目猪粪及沼液池沼渣进行干湿分离后送入堆粪棚内进行短暂堆存后，运至简阳市三新惠农科技有限公司作为生产有机肥的原料。

3.5.5 病死猪处置工艺

（1）淘汰猪处理

隔离观察期被淘汰仔猪退回原养殖场。

（2）疫猪处理

一旦发现疫猪，第一时间向当地兽医卫生监督部门或其他上级主管部门报告并封闭全场，由主管部门按照《重大动物疫情应急条例》的相关规定进行处理和处置。

（3）病猪处置

病猪在育肥猪舍内设有专门的隔离区进行注射治疗。

（4）病死猪处理

本项目与简阳市汇迪无害化处理有限公司签订了协议，运营期产生的病死猪交由其进行无害化处理。

3.5.6 猪舍防疫及消毒措施工艺

1、未发生疫情时的预防措施

（1）建立兽医卫生防疫制度和承包责任制度，由主管兽医负责监督执行，建立猪舍日记、疫情报告制度等。

（2）生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆的消毒工作。

（3）建立隔离区，严禁场内兽医人员在场外兼职，严禁场外兽医进入生产区诊治疾病，确因需要必须从场外请进的兽医，进入隔离区应更换服装鞋帽，进行严格消毒后，方可进入生产区。

（4）饲养人员要坚守岗位，不得串舍。用具和所有设备都必须固定在本舍内使用。要经常搞好舍内外卫生，定期做好消毒工作。

（5）猪舍保持通风良好，光线充足，室内干燥；猪舍内外每天清扫一次，所用饲养用具应定期清洗消毒，经常保持清洁。

（6）每年进行 1~2 次猪体内、外寄生虫病的驱虫工作。

（7）猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。饲养用具消毒后再用清水洗涤晒干后使用。猪舍采取“全进全出”的消毒方法；每批猪出栏后彻底大消毒，空圈 4 周后方可进猪。

（8）兽医人员和饲养人员在工作期间必须穿工作服和工作鞋。工作结束，立即将工作服和工作鞋先留在更衣室内，严禁带出场外，工作服、鞋要经常消毒，保持清洁。

（9）为确保猪场安全、防止疫病传入，在引进种仔猪时，须从非疫区购入，经当地兽医部门检疫，并签发检疫证明书。进入本场时全身喷雾消毒后方可入舍饲养，并经兽医跟踪检验检疫。

（10）每周使用 84 消毒液喷雾带猪消毒 1 次；出栏后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用过氧乙酸、次氯酸钠溶液等消毒液喷洒消毒，间隔 1 天后重复进行一次。

（11）严格免疫操作规程冻干苗应在低温冷冻条件下保存，严禁反复冷冻使用，油剂或水剂严防冻结，应在 4℃～8℃条件保存。冻干苗按要求的方法进行稀释，稀释后的疫苗应按规定的方法保存和规定时间内使用；保证疫苗注射剂量；注射器械和注射部位严格消毒，保证一畜一个针头，防止交感染。

（12）兽医人员应定期对生猪群进行系统检查，观察生猪群健康状况，做好检查记录。如有疫病发生，进一步调查原因，作出初步判断，提出相应预防措施，防止疫病扩散蔓延，并按规定将疫情情况报告当地动物防疫监督机构。严禁迟报、瞒报动物疫情。

2、发生疫情时的预防措施：

（1）尽快确诊，并及时上报兽医和监督机关，建立疫情报告制度和报告网络，按国家有关法规，对病疫进行防治。

（2）及时扑杀病畜和同群猪只，在兽医人员的严格监督下，对病畜扑杀和尸体无害化处理。

（3）严格封锁疫点疫区，消灭疫源，杜绝疫病向外散播。场内应定期的、全面进行消毒。

（4）疫区内最后 1 头病畜扑杀后，经一个潜伏期的观察，再未发现新病畜时，经彻底消毒，报有关单位批准，才能解除封锁。

3.5.7 沼气净化及综合利用工艺

沼气先采用气水分离器进行气水分离后再通过脱硫装置进行脱硫，然后在通过火炬进行燃烧处置。

3.5.8 其他工艺说明

控温系统工艺说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换对进出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。

3.6 项目变动情况

根据现场勘察及资料调查，项目变动情况见表 3-7。

表 3-7 建设内容变更一览表

变化内容	环评阶段	验收阶段	备注
建设项目性质	改扩建	改扩建	不变
建设项目规模	年出栏 8000 头育肥猪	年出栏 8000 头育肥猪	不变
建设项目地点	简阳市三星镇干石山村 10 组	简阳市三星镇干石山村 10 组	不变
生产工艺	本项目猪场为育肥猪场，猪场内不涉及母猪、种猪饲养。育肥品种来源于周边其他种猪场的仔猪，经哺乳 21 天左右，生长到约 7 斤，经体检合格后送入本养殖场进行育肥。进入本养殖场的仔猪首先进入猪场的隔离区，隔离观察约 1 周，经检查确保健康后再送入保育舍进行保育后，再送入育肥舍进行育肥。	本项目猪场为育肥猪场，猪场内不涉及母猪、种猪饲养。育肥品种来源于周边其他种猪场的仔猪，经哺乳 21 天左右，生长到约 7 斤，经体检合格后送入本养殖场进行育肥。进入本养殖场的仔猪首先进入猪场的隔离区，隔离观察约 1 周，经检查确保健康后再送入保育舍进行保育后，再送入育肥舍进行育肥。	不变
环保设施	废水：项目废水通过“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺处理后全部还田利用，不外排。	废水：项目废水通过“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺处理后全部还田利用，不外排。	不变
	废气: 1、猪舍恶臭：主要采用“圈舍水帘通风+优化饲料+合理布局”等措施从源头减少恶臭，然后在风机排风口设置喷雾除臭网进行除臭，处理后无组织排放； 2、堆粪棚恶臭：堆粪棚全密闭，通过负压抽排风系统将废气引至 4#圈舍外生物喷雾除臭装置处理后排放； 3、污水处理站恶臭：污水处理站收集调节池、干湿分离机产生的臭气与 4#圈舍共用一套废气处理设施； 4、沼气：经脱水脱硫后用作进入沼气柜，然后通过火炬燃烧。	废气: 1、猪舍恶臭：主要采用“圈舍通风+优化饲料+合理布局”等措施从源头减少恶臭，然后在风机排风口设置喷雾除臭器进行除臭，处理后无组织排放； 2、堆粪棚恶臭：堆粪棚全密闭，通过风机将废气引出，同时在出风口加装生物喷雾除臭器处理后无组织排放； 3、污水处理站恶臭：污水处理站收集调节池、干湿分离机产生的臭气与 4#圈舍共用一套废气处理设施； 4、沼气：经脱水脱硫后用作进入沼气柜，然后通过火炬燃烧。	不变
	噪声：合理平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、加强绿化	已选用低噪声设备、已对设备采取了基础减震、并依托厂房和围墙隔声	不变
	固体废物： 1、猪粪：进入堆粪棚，后运至有机肥厂（简阳市三星惠农科技有限公司）用作有机肥原料。 2、污水处理系统沼渣：同干粪一起外售给简阳市三新惠农科技有限公	固体废物： 1、猪粪：进入堆粪棚，后运至有机肥厂（简阳市三星惠农科技有限公司）用作有机肥原料。 2、污水处理系统沼渣：同干粪一起外售给简阳市三新惠农科技有限公	不变

	司生产有机肥； 3、废包装材料：外售废品收购站； 4、生活垃圾：委托环卫部门处理； 5、废脱硫剂：厂家回收； 6、病死猪：委托简阳汇迪无害化处理有限公司处理； 7、医疗废物：委托资质单位处理。	司生产有机肥； 3、废包装材料：外售废品收购站； 4、生活垃圾：委托环卫部门处理； 5、废脱硫剂：厂家回收； 6、病死猪：委托简阳汇迪无害化处理有限公司处理； 7、医疗废物：委托资质单位处理。	

因此本项目参照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》进行判定，其情况判断过程见表3-8。

表 3-8 项目重大变动情况判定一览表

序号	类别	重大变更情况	本项目	判定情况
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化的。	未变	不属于
2	规模	1、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。	生产、处置或储存能力未变	不属于
		2、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	生产、处置或储存能力未变，不涉及第一类污染物	不属于
		3、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的	项目虽然位于不达标区，但是污染物排放未发生变化	不属于
3	地点	重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	未发生变化	不属于
4	生产工艺	1、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。	产品品种、生产工艺、原辅材料、燃料均未发生变化，未导致新增污染物种类，也未导致新增污染物排放量	不属于
		2、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	物料运输、装卸、贮存方式未发生变化	不属于
		3、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织	圈舍废气原环评要求将废气通过风机引出，并加装喷淋除臭网处理，经业主实际使用发现，会导致喷淋液发生倒吸，	不属于

		排放量增加 10%及以上的。	进入圈舍，给生猪造成安全隐患，故采用直接在风机口安装喷淋除臭器处理废气；堆粪棚单独使用风机引风，并加装喷淋除臭器处理废气；污水处理站调节池，干湿分离器产生的废气使用膜密闭，未增加污染物排放量	
		4、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	未新增废水直接排放口	不属于
		5、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。	未新增废气排气筒，排气筒高度未发生变化	不属于
		6、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化	不属于
		7、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	固体废物利用处置方式未发生变化	不属于
		8、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化	不属于

因此，根据以上分析，本项目不属于重大变动。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理

4.1.1 废水

本项目污水处理设施采用“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺进行处理，养殖废水、生活污水和先经隔油处理后的食堂废水经污水处理设施处理，不外排。

4.1.2 废气

本项目养殖场废气主要包括各类恶臭（包括猪舍恶臭、堆粪棚恶臭、污水处理系统恶臭）及沼气。饲养所用精饲料均为饲料公司提供成品饲料，不需在场区内进行粉碎，因此，无饲料粉碎粉尘产生。

（1）猪舍恶臭

主要采用“圈舍通风+优化饲料+合理布局”等措施从源头减少恶臭，然后在风机排风口设置喷雾除臭器进行除臭，处理后无组织排放。

（2）堆粪棚恶臭

堆粪棚全密闭，通过风机将废气引出，并在风机口加装生物喷雾除臭器处理后排放。

（3）污水处理系统恶臭

污水处理站收集调节池、干湿分离机产生的臭气与4#圈舍共用一套废气处理设施。

（4）沼气

经脱水脱硫后用作进入沼气柜，然后通过火炬燃烧。

4.1.3 固体废物

本项目固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪、办公区生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂、废包装材料等。

（1）猪粪

进入堆粪棚，后运至有机肥厂（简阳市三星惠农科技有限公司）用作有机肥原料。

（2）病死猪

治理措施：委托简阳汇迪无害化处理有限公司处理。

（3）生活垃圾

治理措施：委托环卫部门处理。

（4）医疗废物

治理措施：委托资质单位处理。

（5）废脱硫剂废料

治理措施：暂存于仓库，由脱硫剂供应商回收处理。

（6）污水处理系统沼渣

治理措施：同干粪一起外售给简阳市三新惠农科技有限公司生产有机肥。

（7）废包装材料

治理措施：外售废品收购站。

（8）危险废物

治理措施：与医疗废物共用一间暂存间，产生的废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置。

4.1.4 噪声

本工程噪声主要为猪叫声、猪舍排气扇、水泵和猪舍配套水帘风机等设备噪声，噪声源值约 70~85dB（A）。

主要采取以下治理措施：

（1）对高噪声设备采取减震、隔震措施；

（2）粪污潜水泵进出口管道采用柔性接头；

（3）猪舍通风机出风侧水平风道上安装消声器，风道内贴吸声材料；

（4）尽可能满足猪只饮食需要，避免发出叫声；

（5）场内车辆限速、禁鸣。

4.1.5 地下水防治措施

本项目地下水防治措施采取分区防控措施，将生产区域划分为一般防渗区和重点防渗区。

1）本项目将堆粪棚、危废暂存间、污水处理设施和事故应急池确定为重点防渗区；

2）猪舍、杂物库房、变配电室、隔离消毒区、储存池确定为一般防渗区；

3）办公生活区、厂区内道路确定为简单防渗区。

本项目分区防渗一览表见下表，本项目分区防渗图见附图。

表 4-8 分区防渗措施一览表

污染防治措施		具体措施内容	
分区防渗	重点防渗区	猪舍、隔离区、粪便临时堆存间、污水处理设施、事故应急池	2mmHDPE土工膜+水泥防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10^{-10}cm/s
		医疗废物暂存间、危险废物暂存间	
	一般防渗区	检疫区、仓库、一般固废暂存间、变配电室、控制室	粘土层+15cmP8厚抗渗混凝土防渗，防渗结构层渗透系数≤1.0×10^{-7}cm/s
	简单防渗区	办公生活区、厂区内道路	水泥硬化

4.2 其他环保设施

4.2.1 非正常排放及防范措施

4.2.1.1 废水事故排放

由于猪场废水含有大量的有机物、氨氮、病原体细菌等，若出现项目废水未经处理直接排入沟渠，会造成水体发臭，大量滋生细菌、臭虫等，近而影响周围家畜、家禽和人群健康。若遇雨水冲刷，污染地表水体。另一方面，若废水不经处理而排入项目附近的水体，长此以往，污水通过渗透会污染地下水环境。

4.2.1.2 恶臭非正常排放

项目非正常工况即项目除臭措施失效，除臭效率为 0，项目除臭措施如果失效，其排放量将大大的增加，因此，若发生除臭措施失效，建设单位应尽快维修恢复，同时采取其他除臭措施，如在圈舍增加喷洒吸附剂、除臭剂的频次以减少恶臭对外环境的影响。

4.2.1.3 环境事故防范对策和建议

为杜绝污水排入厂外周边水体，采取以下措施来确保废水不排放：

①派专人对废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小；

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到达标排放；

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

④保持猪场内管网的畅通，防止各污水池内污水泄漏。

⑤场址内设有一座事故池容积 80m³，位于 4#圈舍旁，在污水处理站发生事故时，可将废水导入事故池并暂存，不得直接排放。

4.2.2 环境监测计划

4.2.2.1 环境监测的意义

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。同时环境监测也是企业环境保护的重要组成部分，通过环境监测和污染源监测，可掌握环境质量现状和污染源基础数据，为企业污染源治理、生态环境保护提供依据，并为环境保护行政主管部门对企业进行监督管理及进行区域环境规划提供科学依据。

通过加强管理和环境监测，逐步掌握项目主要污染物的排放情况，为控制污染积累数据和资料，企业为掌握建设项目污染物排放情况及其对周边环境质量的影响等情况，需按照相关法律法规和技术规范，组织开展环境监测活动。若建设单位自行监测，则监测方案制定、监测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求等可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行；若企业不具备自行监测条件，则可委托当地环境监测站或第三方环境检测机构进行，建设单位应协助其开展监测工作。

4.2.2.2 环境监测计划

根据对项目工程分析及环境影响分析，项目环境监测计划见表 4-10。

表 4-10 项目监测计划表

类别	监测位置	委托监测		
		监测项目	监测时间与频次	执行标准
环境空气	场界外主导风向上风向、下风向各 1 个	NH_3、H_2S、臭气浓度	1 次/年	HJ 2.2-2018 附录 D
地表水	项目厂界南侧的农合水库和东侧的宽沟水库(各设置 1 个监测断面)	pH、水温、DO、BOD_5、COD、氨氮、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群	1 次/年	GB3838-2002III 类
土壤	项目厂区、灌溉区	pH、土壤容重、阳离子交换量、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘	1 次/2 年	GB36600-2018
地下水	场地内下游西侧/潜水	pH、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物（氯离子）、硫酸盐（硫酸根）、氟化物（氟离子）、耗氧量、氨氮、挥发酚、氰化物、六价铬、铅、镉、铁、锰、汞、砷、硝酸根、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、总	1 次/2 年	GB1561 8-2018

		大肠菌群、细菌总数		
噪声	厂区四周	等效连续 A 声级	1 次/年	GB3096-2008

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，结合《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019），污染源监测计划见表 4-11。

表 4-11 项目监测计划表

类别	污染源监测点	监测指标	监测方式	时间
废气	养殖区域、堆粪棚、污水站及厂界	NH_3、H_2S、臭气浓度	当地环境监测站或第三方检测机构定期监测	1年监测1次
废水	污水处理站进口及出口	废水量、COD、氨氮、TN、TP、悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群、蛔虫卵		臭气浓度1年监测1次；其余因子正常情况下，每季度1次；监督性抽查不定
噪声	厂界噪声（4个）	连续等效 A 声级		每季度1次。非正常情况下，视情况加测
地下水	场地内下游西侧/潜水	pH值、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、氯化物、氟化物、细菌总数、总大肠菌群		1次/年
土壤	厂区（1个）、灌溉区（3个）	pH、土壤容重、阳离子交换量、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘		1次/年

4.2.3 总量控制

本项目为养殖类项目，营运期间场内不涉及饲料加工，不涉及国控大气污染总量控制指标 SO_2、NO_x 的排放；项目营运期员工生活污水、养殖废水等经收集后送污水处理设施处理后，不外排，不涉及国控水污染总量控制指标 COD、NH_3-N 的排放。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

本项目环评估算总投资 750 万元人民币，其中环保投资 173.25 万元人民币，占总投资的 23.1%。

具体环保设施投资情况见下表：

表 4-6 项目环保治理措施及投资一览表

类型		环保措施	改扩建工程已新增环保投资（万元）	改扩建工程后期整改仍需新增环保投资（万元）	实际环保投资（万元）
施	废水	沉淀池1座；车辆清洗池及沉淀池1套，建议处理	1.2	0	1.2

工期	治理	规模≥5m³			
	废气治理	施工场地出口洒水抑尘设施；施工场地内洒水抑尘设施	0.5	0.2	0.7
		临时堆土、材料遮盖土工布	0.2	0.1	0.3
		场地四周 1.8m~2.5m 高围栏	0.2	0	0.2
	噪声治理	合理布置施工总平面图，文明施工，合理安排施工时间，选用低噪声设备、设备隔声减振措施等	0.6	0	0.6
	固废处置	建筑垃圾及时外运	0.3	0.2	0.5
		施工人员生活垃圾转运收集及外运	0.1	0.05	0.15
营运期	废水治理	50m³/d的污水处理站：粪污收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池，其中储存池为改扩建工程新增，对储存池进行加盖整改	15	2.5	17.5
		事故池80m³，1座，位于4#1圈舍旁	1.7	0	1.7
		1座16900m³的储存池。同时在消纳区范围修建污水输送管网，约15km，设置提升泵	65	0	65
	地下水防渗措施	场区防渗处理，重点防渗区（危废暂存间、污水处理站及污水管、堆粪棚及事故池）防渗层为防渗混泥土+2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10^{-7}cm/s（危废暂存间防渗系数≤10^{-10}cm/s）；一般防渗区（猪舍、生活污水预处理池、储存池、杂物库房、变配电室、隔离消毒区）地面采取粘土铺底，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10^{-7}cm/s，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。其中危废暂存间为整改新增，按照重点防渗区要求进行整改。山顶储存池西侧需要按照一般防渗区要求进行整改。	1.5	2.5	4
	大气治理	圈舍水帘通风+猪舍投放吸附剂和喷洒除臭剂+优化饲料结构+圈舍出口生物喷雾除臭	3.8	22.3	26.1
		堆粪棚封闭、喷洒除臭剂，与粪污收集调节池、干湿分离机臭气一起收集，通入4#圈舍排气扇外，同圈舍内恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式进行处理	1.2	5.4	6.6
		沼气脱硫脱水净化设施	0	5.0	5.0
	噪声治理	泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减振垫等	1.3	0.3	1.6
		风机房隔声、减振等			
		合理安排饲养时间、加强管理			
	固体废物	1个危废暂存间（已计入地下水防渗措施投资内），位于1#圈舍旁，面积14.4m²，医疗废物由具有危废处理资质的单位回收处置	0	1.3	1.3
		1个堆粪棚，169m²，紧邻污水处理站，暂存间四周建立收集渗滤液的截污沟，粪便、污泥外售有机肥厂	4.6	0	4.6
		病死猪原委托成都永新无害化处置有限公司进行处理，现委托简阳市汇迪无害化处理有限公司处理	15	0	15
		生活垃圾由环卫部门定期清运	1.3	0	1.3

		建立明确的粪便、污泥及无害化处理产出物入库单、出库记录及输送档案（或台账）	1.5	0	1.5
	绿化景观	生态保护及绿化措施，主要种植在项目猪舍北、东、南侧面	1.3	1.1	2.4
	风险防范	整改新增1台沼气柜，并对沼气进行应急监测、80m³事故池（计入废水投资内），隔离池事故隔断阀、风险应急预案	0	11.5	11.5
	环境管理	环境咨询、验收监测、营运期例行监测、环保培训等。	4.5	0	4.5
合计			120.8	52.45	173.25

4.3.2“三同时”落实情况

本项目需配套建设的环保设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，按照环境保护设计规范的要求完成项目的初步设计；在项目建设过程中同时组织实施本项目环评文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。结合现场施工及实际建成情况，核实本项目“三同时”落实情况，具体情况见下表。

表 4-7 “三同时”落实情况表

项目	环评及批复要求	实际建成	备注
废水治理	本项目自建一座处理规模为50m³/d的污水处理站，采用“粪污收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”的处理工艺处理后进行粪污还田	与环评一致	
	事故池80m³，1座，位于污水处理站北侧		
	设置1座16900m³的储存池，设置输送管网约15km，并设置11个提升泵		
废气治理	圈舍水帘通风+猪舍投放吸附剂和喷洒除臭剂+优化饲料结构+圈舍出口生物喷雾除臭	与环评一致	
	堆粪棚封闭、喷洒除臭剂，与粪污收集调节池、干湿分离机臭气一起收集，通入4#圈舍排气扇外，同圈舍内恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式进行处理		
	沼气柜及沼气脱硫脱水净化设施	与环评一致	
噪声治理	泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减振垫等	与环评一致	
	风机房隔声、减振等		
	合理安排饲养时间、加强管理		
固体废弃物处置	1个危废暂存间，位于1#圈舍旁，面积14.4m²，医疗废物由资质单位回收处置	与环评一致	
	建立明确的粪便、污泥产出物入库单、出库记录及输送档案（或台账）	与环评一致	
	病死猪送无害化处置公司进行处理	与环评一致	
	生活垃圾由环卫部门定期清运	与环评一致	

地下水防渗	场区防渗处理，重点防渗区（危废暂存间、污水处理站及污水管、堆粪棚及事故池）防渗层为防渗混泥土+2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10^{-7}cm/s（危废暂存间防渗系数≤10^{-10}cm/s）；一般防渗区（猪舍、生活污水预处理池、储存池、杂物库房、变配电室、隔离消毒区）地面采取粘土铺底，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10^{-7}cm/s，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。其中危废暂存间为整改新增，按照重点防渗区要求进行整改。山顶储存池西侧需要按照一般防渗区要求进行整改。	与环评一致	
风险防范	沼气柜沼气应急监测，隔离池事故隔断阀、风险应急预案	与环评一致	

5 环境影响评价主要结论、建议及批复

5.1 环境影响评价结论

5.1.1 产业政策符合性分析

简阳市同合乡唐中顺家庭农场于 2019 年 10 月投资 500 万元在简阳市同合乡干石山村 10 组建设了“简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖项目”，占地面积为 9.2636 亩，建设完成后，达到年存栏生猪 1000 头、出栏生猪 2000 头的养殖规模，建设单位于 2019 年 8 月 8 日填报了《简阳市同合乡唐中顺家庭农场建设项目环境影响登记表》，备案号 201951018500000461；因养殖市场发展需要，简阳市同合乡唐中顺家庭农场又于 2020 年 2 月投资 750 万元在原厂址内进行改扩建，建设“简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目”。本项目在现有工程基础上进行改扩建，养殖规模由现有工程的年存栏 1000 头生猪（出栏 2000 头生猪）增加到年存栏 4000 头生猪（出栏 8000 头生猪）。

项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的第一类“农业”中的第 4 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，为国家鼓励项目，符合国家产业导向政策，有利于简阳市农业产业结构的调整；简阳市发展和改革局同意备案（川投资备【2205-510185-04-01-333937】FGQB-0100 号）同意本项目的建设，因此，本项目符合国家现行产业政策。

5.1.2 选址合理性分析

本项目场址位于简阳市三星镇干石山村 10 组，不属于城镇居民生活区内，项目周围属农村环境，生态环境良好，人口较稀疏，不涉及水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，养殖区周围 500m 范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源。外环境关系相对简单，场址周围无明显环境制约因素。项目场界距离沱江 2.7m，不在城镇规划区、农村集中居住区以及主要河流纵深 100 米范围内，距离高速公路、主要交通干道两侧纵深 50 米以外。项目占地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区。因此本项目选址不在简阳市划定的畜禽养殖禁养区范围内，与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》相符合。

根据设施农用地备案文件，项目所用土地不涉及基本农田，根据简阳市三星镇农业农村局的证明文件可知，本项目未在简阳市三星镇畜禽养殖禁养区。本项目符

合农业产业规划、符合城镇规划。综上，拟建项目选址合理。

5.1.3 区域环境质量现状

（1）环境空气

本项目所在区为农村区域，根据《2020 年成都市生态环境质量公报》中公布数据可知，项目所在简阳市环境空气 SO_2、NO_2、CO、O_3、PM_{10} 环境质量现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，$PM_{2.5}$ 超出二级标准限值要求，项目所在区域成都市环境空气质量为**不达标区**。通过成都市达标规划，成都市环境空气质量在 2020 年达到四川省下达目标，力争到 2025 年实现空气质量全面达标，环境空气质量将明显改善。

评价区域 H2S、NH3 小时浓度补充监测值均小于《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。项目区各监测点各监测因子均满足相应的大气环境质量标准，评价区域环境质量良好。

（2）地表水

本项目位于成都市简阳市三星镇干石山村 10 组，本项目附近的地表水体包括厂界南侧 417m 处的农合水库（主要为干石山村居民提供灌溉用水，不涉及饮用功能，距离项目污水处理站贮存池 541m），厂界东侧红线外 631m 处为宽沟水库（主要为干石山村居民提供灌溉用水，不涉及饮用功能，距离项目污水处理站贮存池 838m），沱江位于本项目西侧 2.7km 处，阳化河位于项目东侧 13.2km 处。评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准。

（3）地下水

本项目现状监测中地下水中 4#监测点位总硬度超过《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的 III 类标准要求，5#监测点位总硬度和溶解性总固体超过《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的 III 类标准要求，超标的原因是当地地下水硬度较高。本项目距离两个监测点位均较远，超标并非本项目造成。

（4）声环境

养殖场各监测点的昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》2 类标准，表明评价区声环境质量良好。

（5）土壤环境

厂址和灌溉区各监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表 1 和表 2 规定的风险筛选值，同时也满足《畜禽

养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表 4 相关标准要求。综上，项目所在区域土壤环境良好。

5.1.4 环境污染防治及影响分析

（1）地表水环境保护措施及环境影响

猪舍粪便采取干清粪工艺，干清粪比例达到 90%以上，养殖场污水包括猪尿、猪舍冲洗水、车辆洗消废水、废气处理设施废水和生活废水，废水产生量为 18.75m3/d（6843.734t/a），污染物主要为 COD、BOD5、NH3-N、SS、TP。项目建有一座污水处理站，处理能力为 50m3/d，采用粪污收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池处理后进行粪污还田，项目建设对地表水影响较小。

（2）地下水环境保护措施及环境影响

通过采用源头控制、分区防渗、地下水环境监测与管理以及应急响应都措施，项目建设对地下水环境影响较小。

（3）大气环境保护措施及环境影响

恶臭污染防治措施主要包括：及时清理猪舍粪便、强化消毒措施、科学设计日粮以提高饲料利用率，因地制宜加强场区绿化。同时在圈舍恶臭采用喷洒生物除菌液进行处理；堆粪棚（包括堆粪槽、粪污收集调节池、干湿分离机臭气），堆粪棚封闭、喷洒除臭剂，与粪污收集调节池、干湿分离机臭气一起收集，通入 4#圈舍排气扇外，同圈舍内恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式进行处理。

本项目大气污染物成份主要是 NH3 和 H2S，无组织排放量分别为 0.072t/a 、0.0017t/a。项目建成投产后，大气预测范围内各敏感点污染物浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物场界标准值中的二级标准；H2S 及 NH3 最大落地浓度均出现在下风向 49m 处，分别为 0.00317mg/m3、0.002695mg/m3，其中养殖区排放的氨最大地面占标率最大，为 3.17%。

本项目以养殖区圈舍、污水处理站（粪污收集调节池、储液池）、堆粪棚边界外延 200m 范围设为卫生防护距离，在项目卫生防护距离内，根据现场调查分析以及四川腾博智宇测绘有限公司（丙测资字 51200352）对项目卫生防护距离内的农户距离测绘（测绘图见附图以及附件），调查到卫生防护距离内涉及到 10 户农户。因此，建设单位为了最大限度的减少对该农户的影响，建设单位对 200m 范围内 10 户农户进行租赁实现功能置换（见附件）。

同时评价要求：建设单位应切实做好环境管理、加强与周边农户的沟通，尽可

能减少恶臭气体对周边农户的影响。

（4）声环境保护措施及环境影响

养殖场噪声主要为猪群叫声、猪舍排气扇、水泵、风机、堆粪棚等设备噪声，同时还存在猪只生活叫声以及车辆运输等噪声。满足猪只饮食、饮水需要，减少外界噪声等对猪舍干扰，可有效降低猪叫频率；猪舍排气扇、风机选用高效低噪设备，基座加装减振弹簧等降噪、减振措施；污水处理站中水泵设置在水面以下，并选用高效低噪抽吸泵。车辆运输设置限速、禁鸣等措施。本项目场界噪声值昼、夜间均达标，满足《工业企业场界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准。

项目周边各敏感点处昼间、夜间噪声影响值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，运营期间的噪声对周围敏感点的影响较小。

（5）固体废物处置措施及环境影响

项目病死猪委托简阳市汇迪无害化处理有限公司进行处理；医疗废物要求委托有资质单位处置；养殖场的猪粪和污水站沼渣一同经堆粪棚堆存后外售有机肥厂作为有机肥原料；废脱硫剂由厂家回收；废包装材料外售给废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运送往当地垃圾卫生填埋场统一处置。本项目固废经分类处理处置后对环境影响小。

（6）环境风险防范措施及环境影响结论

本项目不存在重大危险源，主要风险源为厌氧工序产生的沼气以及危化品泄露，主要事故类型为火灾、爆炸和沼气及危化品泄漏，在事故发生后如果不能及时有效的采取措施，将对区域环境和人民生命财产造成较大的影响。评价通过认真分析和调研对事故风险提出了针对性防范和处置措施，并提出了应急预案，在实施上述有效的处理措施后，本项目环境风险及对环境造成的影响将降到最低程度。

建设单位应严格按照评价意见实施事故措施，严格管理，杜绝事故的发生。同时，建设单位应加强环境风险的管理，在日常应编制详细的应急救援预案，以应对突发事件的发生。

5.1.5 总量控制

本项目废气主要为硫化氢和氨以及少量沼气燃烧废气，其中硫化氢和氨不属于总量控制污染物。

本项目沼气燃烧废气排放量甚微，可以忽略不计，无需设置总量。

项目废水经污水处理设施处理后进行粪污还田，全部综合利用不外排；项目无

工业固废产生。因此，根据本项目的排污特征，本次评价不设总量控制指标。

5.1.6 环境经济损益分析

简阳市同合乡唐中顺家庭农场充分利用本地区的地理和环境优势，并对该养殖场采用先进的设备和技术，对产生的粪便、废水进行合理化处理。项目经处理后的废水用于用作周围农作物农灌，节约了能源消耗、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目实施过程中，加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中不可避免会对周围群众的生产和生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本评价从环境经济效益指标，如环保费用指标、污染损失指标、环保效益指标和环境经济的静态分析等方面进行了分析计算，从计算结果分析，本工程环境代价和环保成本较低，而环境效益却较为明显，从环境经济角度来看，项目建设是合理可行的。

5.1.7 环境管理与监测计划

评价提出设置专门环境保护管理机构，研究制定有关环保事宜，该机构由总经理亲自负责，下设环保处，配备专门技术人员负责企业日常环境管理和监测的具体工作，并建立健全必要的环境管理规章制度。环境管理应贯穿建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例。

5.1.8 公众参与

根据建设单位组织的项目公众参与调查情况，从反馈信息看，被调查者希望项目运营过程中采取有效措施加强对各类污染物排放的控制和管理，减轻对周边环境及居民的影响。无反对意见。建设单位表示将对各项环保措施予以落实，并根据国家建设项目环境保护“三同时”制度的管理规定实施，让工程建设给环境带来的不利影响降到最低限度。

因此，本报告采纳大多数公众的意见，同意本项目的建设。

5.1.9 评价结论

本项目建设符合国家产业政策要求，选址符合当地规划。项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。区域内无明显环境影响制约因素，项目所在区域大气环境、地表水环境、噪声环境质量现状良好，项目采取的污染防治措施技术经济可行。项目建成投产后，在“三废”污染源经有效治理、废水综合利用的前提下，不会改变地表水评价段、评价区域内大气环境质量和环境噪声的现有的功能。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址与当地规划相容，在确保各项污染治理措施落实和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言，该项目在简阳市三星镇干石山村 10 组的建设是可行的。

5.2 要求与建议

（1）要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。

（2）建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行，并建立环保档案。

（3）统一规划安排，作好项目垃圾和污水的收集管理工作，特别是严格按照相关要求。

（4）场区除绿化用地外应进行地面硬化处理；四周隔墙和建排水沟。

（5）猪粪、污泥、病死猪只等固体废物应及时进行无害化处理，避免固体废物中有害成份渗出污染地表水和地下水。

（6）在场区下游设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

（7）制定严格的卫生管理制度，防止蚊蝇孳生和散发臭气。

（8）生活区、生产区和污染区三大功能区之间设立隔离带，并实行严格消毒。

（9）场区大门口要设消毒池，场内应由专人管理，消毒池要定期更换和补充消毒液，以保持消毒浓度，并监督出入人员、车辆的消毒。

（10）发现病猪及时隔离治疗，以免延误治疗时机，造成猪只抵抗力下降，增加药物费用的投入。

（11）发现疑似流感疫情后，要及早诊断，严格隔离，快速制定相应的防疫措施。立即组织人员会诊，进行深入的流行病学的调查，进一步确定猪群的发病情况。

（12）平时注意通风换气。在保持温暖干燥的同时，适时通风换气，排出有害气体，保持舍内空气新鲜。

（13）为了让周边农户更好的了解猪场内环保设施的建设和实施情况，建议在场区大门口设置环保公示栏，公示猪场的基本情况、场内环保工程简介以及场内污水处理站工艺流程图等，并附上相应的环保工程照片。

5.3 审批部门审批决定

成都市简阳生态环境局关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境

影响报告书的批复

简阳市同合乡唐中顺家庭农场：

你单位报送的《简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》及专家意见已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省成都市简阳市三星镇干石山村 10 组。项目拟年存栏生猪 4000 头（年出栏生猪 8000 头），主要建设内容：1.主体工程：猪舍（育肥舍 4 栋）；2.辅助工程：消毒房、堆粪棚、中转料塔；3.公用工程：供水工程、供电工程、供热工程、通风系统、污水管网、进出场道路；4.办公及生活设施：门卫房、综合办公生活区、生产区消毒房、生产区隔离房；5.环保工程。项目总投资 750 万元，其中环保投资 173.25 万元。

项目取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2205-510185-04-01-333937】FGQB-0100 号），符合现代产业政策。项目取得了简阳市三星镇人民政府（原简阳市同合乡人民政府）、简阳市农业农村局、简阳市规划和自然资源局、成都市简阳生态环境局等部门联合认定的《成都市简阳市畜禽养殖场（户）选址确认申请表》和简阳市三星镇人民政府出具的《关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场设施农用地备案的函》（三府函［2022］121 号），规划和用地取得了相关许可。在严格落实报告书提出的防止生态破坏和防治环境污染的措施后，不利环境影响可得到减缓和控制。因此，我局原则同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、选线、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按报告书要求落实各项环保设施的建设，加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；加强运营期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。

（二）施行雨污分流制，落实废水处理措施。运营期，厂区自建污水处理设施，采取“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺处理，养殖废水、生活污水、圈舍冲洗废水、车辆清洗废水经污水处理设施处理达《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求后还田利用，不外排。

（三）落实报告书提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。运营期，

圈舍恶臭采取圈舍密闭、建设水帘通风系统、投放臭气吸附剂、喷洒除臭剂、圈舍出口建设生物喷雾除臭设施等措施处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准，其中臭气达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；堆粪棚、粪污收集调节池、干湿分离机、储液池臭气收集后同圈舍恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式处理；沼气经脱硫塔脱水脱硫处理后通过火炬燃烧器放空燃烧处理。

（四）加强噪声污染控制，选取低噪设施、安装减振设备，优化厂区平面布置，安装吸音材料，利用厂房隔声、距离衰减等措施处理后使噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（五）固体废物应严格按照报告书中的处置措施落实去向，危险废物依法向属地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并执行国家相关管理规范。运营期，猪粪、污水处理站沼渣经堆粪棚处理后外售手续齐全的有机肥厂综合利用；费脱硫剂交由厂家回收处理；废包装材料外售废品收购站；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；病死猪交由有相关处置资质的无害化处置单位处理；畜禽医疗废物交由有相应医疗废物处置资质的单位处理；泵维护废机油、废弃包装物交由有相应危废处置资质的单位处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制度并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。

（七）建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告书及专家评估意见予以落实。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。认真落实排污许可管理的有关规定，应在调试前依法取得排污许可。项目竣工后，必须按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）等相关法律法规规定做好验收工作。项目建设单位违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、请各相关职能部门按照职能职责做好该项目日常的环境保护监督管理工作。

七、行政复议与行政诉讼权利告知。

建设单位认为本批复侵犯其合法权益的，可以自收到本文件之日起六十日内向成都市生态环境局或者成都市人民政府提起行政复议，也可以自收到本文件之日起六个月内向成都高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。

根据实地勘察显示，本项目建设内容符合上述环评批复要求，实际建设情况与环评批复要求对照一览表见下表。

表 5-2　环评批复要求与实际建设情况对比一览表

环评批复要求	实际情况	对比
严格按报告书要求落实各项环保设施的建设，加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；加强运营期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。	已落实各项环保设施建设，施工期、运营期环保均达标排放。	符合环评批复要求
施行雨污分流制，落实废水处理措施。运营期，厂区自建污水处理设施，采取“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺处理，养殖废水、生活污水、圈舍冲洗废水、车辆清洗废水经污水处理设施处理达《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求后还田利用，不外排。	已施行雨污分流，运营期废水经自建污水处理系统处理后达标排放。	符合环评批复要求
落实报告书提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。运营期，圈舍恶臭采取圈舍密闭、建设水帘通风系统、投放臭气吸附剂、喷洒除臭剂、圈舍出口建设生物喷雾除臭设施等措施处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准，其中臭气达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；堆粪棚、粪污收集调节池、干湿分离机、储液池臭气收集后同圈舍恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式处理；沼气经脱硫塔脱水脱硫处理后通过火炬燃烧器放空燃烧处理。	已落实废气治理措施，运营期各废气均能达标排放，均能满足各废气排放标准。	
加强噪声污染控制，选取低噪设施、安装减振设备，优化厂区平面布置，安装吸音材料，利用厂房隔声、距离衰减等措施处理后使噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。	已加强噪声监管，运营期噪声均能达标排放，各指标均满足相关排放标准。	
固体废物应严格按照报告书中的处置措施落实去向，危险废物依法向属地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并执行国家相关管理规范。运营期，猪粪、污水处理站沼渣经堆粪棚处理后外售手续齐全的有机肥厂综合利用；费脱硫剂交由厂家回收处理；废包装材料外售废品收购站；生活垃圾交由环卫部门	已落实固废处理措施，各废物均按照环评要求处理，危险废物、医疗废物均暂存危废间，后交资质单位处理。	

统一清运处理；病死猪交由有相关处置资质的无害化处置单位处理；畜禽医疗废物交由有相应医疗废物处置资质的单位处理；泵维护废机油、废弃包装物交由有相应危废处置资质的单位处理。		
强化环境风险防范和应急措施。制度并落实应急预案和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。	已落实环境风险，并编制环境应急预案，已配备各项环境风险物质。	
建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告书及专家评估意见予以落实。	已落实环评报告书及专家意见的各项要求。	

6 验收执行标准

根据《简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》和本次验收监测的内容，本项目标准执行情况如下。

6.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH_3、H_2S 参考执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准限值见表 6-1。

表 6-1 环境空气质量标准

污染物名称	取值时间	二级
一、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（单位：mg/Nm^3）		
SO_2	年平均 24 小时平均 1 小时平均	0.06 0.15 0.50
NO_2	年平均 24 小时平均 1 小时平均	0.04 0.08 0.20
PM_{10}	年平均 24 小时平均	0.07 0.15
$PM_{2.5}$	年平均 24 小时平均	0.035 0.075
CO	24 小时平均 1 小时平均	0.004 0.01
O_3	日最大 8 小时平均 1 小时平均	0.16 0.2
二、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D（单位：mg/m^3）		
NH_3	1h 平均	0.2
H_2S	1h 平均	0.01

（2）地表水

评价区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准，具体标准限值见表 6-2。

表 6-2 地表水环境质量标准

项目	标准值(单位： pH 无量纲，mg/L)	标准来源
pH	6～9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
水温	周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2	
COD_{Cr}≤	20	

项目	标准值(单位： pH 无量纲，mg/L)	标准来源
BOD_5≤	4	
氨氮≤	1.0	
总磷(以 P 计) ≤	0.2	
石油类≤	0.2	
粪大肠菌群≤	10000（个/L）	

（3）地下水

评价区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准，具体标准限值见表 6-3。

表 6-3 地下水质量标准 单位：mg/L（pH、总大肠菌群、细菌总数除外）

项目	标准值(单位： pH 无量纲，mg/L)	标准来源
pH 值(无量纲)	6.5-8.5	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
氨氮	≤0.5	
耗氧量	≤3	
氟化物	≤1	
铜	≤1	
锌	≤1	
氯化物	≤250	
溶解性总固体	≤1000	
Na^+	≤200	
硫酸盐	≤250	
挥发酚	≤0.002	
氰化物	≤0.05	
六价铬	≤0.05	
铅	≤0.01	
镉	≤0.005	
铁	≤0.3	
锰	≤0.1	
汞	≤0.001	
砷	≤0.01	
硝酸盐	≤20	
亚硝酸盐氮	≤1.0	
总硬度	≤450	
总大肠菌群	≤3CFU/100mL	
菌落总数≤	100CFU/mL	

（4）声环境

评价区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准，具体标准限值见表 6-4。

表 6-4 声环境质量标准 单位：dB（A）

标准类别	标准限值	标准依据

	昼间	夜间	
2 类	60	50	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准

（5）土壤

本项目土壤质量标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），同时也与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表 4 相关标准进行对照分析，具体标准限值见表 6-5。

表 6-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg

项目		《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），标准值(单位： pH 无量纲，mg/L)		《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）
		6.5＜pH≤7.5		
基本项目	镉	水田 0.6 mg/kg	其他 0.3 mg/kg	1.0
	汞	水田 0.6 mg/kg	其他 2.4 mg/kg	1.5
	砷	水田 25 mg/kg	其他 30 mg/kg	40
	铅	水田 140 mg/kg	其他 120 mg/kg	500
	铬	水田 300 mg/kg	其他 200 mg/kg	300
	铜	果园 200 mg/kg	其他 100 mg/kg	400
	镍	100 mg/kg		200
	锌	250 mg/kg		500
其他项目	六六六总量	0.1 mg/kg		1.0
	滴滴滴总量	0.1 mg/kg		/
	苯并[a]芘	0.55mg/kg		/

6.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）；运营期臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB1554-93）中表 1、表 2 标准限值。

具体标准限值详见下表所示：

表 6-6 废气排放标准限值一览表

工段	污染物	污染因子	无组织排放限值		标准来源
施工期	施工扬尘	TSP	土石方开挖/土方回填阶段	0.6 mg/m^3	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）
			其他工程阶段	0.25mg/m^3	
营运期	养殖废气	硫化氢	厂界：0.06 mg/m^3		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
		氨	厂界：1.5 mg/m^3		

工段	污染物	污染因子	无组织排放限值		标准来源
施工期	施工扬尘	TSP	土石方开挖/土方回填阶段	0.6 mg/m^3	《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）
			其他工程阶段	0.25mg/m^3	
营运期	养殖废气	硫化氢	厂界：0.06 mg/m^3		《恶臭污染物排放标准》
		臭气浓度	70（无量纲）		《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

（2）水污染物排放标准

项目建成投产后产生的污水主要为猪尿及其他生产废水，粪污经“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”处理后，配套充足的土地，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积，粪污作为液态粪肥还田，全部资源化综合利用，不外排。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（4）固体废物

一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定；猪只粪便等畜禽养殖业废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准；病死猪只尸体的处理处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）以及兽医主管部门的规定。

表 6-7 畜禽养殖业废渣无害化环境标准

控制项目	指标
蛔虫卵	死亡率≥95%
粪大肠菌群数	≤10^5 个/kg

6.3 质量保证和质量控制

1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。

2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因

应予以详细说明。

3、监测质量保证按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。

4、项目竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

5、项目竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》的要求，进行全过程质量控制。

6、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级差≤0.5dB(A)。

7、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

6.4 总量控制指标

本项目废气不涉及总量控制污染物；废水经污水处理设施处理后全部综合利用；项目无工业固废产生。因此，根据本项目的排污特征，不设总量控制指标。

7 验收监测内容

成都斯坦德分析检测有限公司于2022年12月19日至12月20日对该项目无组织废气和噪声进行现场监测，监测内容及项目如下：

表 7-1 监测内容及频次

类别	监测点位	点位数	监测项目	监测频次	
				天	次/天
无组织废气	厂界上风向 K1 厂界下风向 K2 厂界下风向 K3 厂界下风向 K4	4	氨、硫化氢、臭气浓度	2	3
噪声	项目所在地厂界东侧 1# 项目所在地厂界南侧 2# 项目所在地厂界西侧 3# 项目所在地厂界北侧 4#	4	工业企业厂界环境噪声	2	昼夜各1次

8 质量保证及质量控制

8.1 无组织废气监测方法及仪器

表 7-2 无组织废气监测方法及仪器

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器型号及编号	检出限
硫化氢	亚甲蓝分光光度法	《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）	V723N 可见分光光度计 STD-A30013-20	0.001 mg/m^3
氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	V723N 可见分光光度计 STD-A30013-20	0.01 mg/m^3
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-93	/	/

8.2 噪声监测方法及仪器

表 7-3 噪声监测方法及仪器

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器型号及编号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 环境噪声监测技术规范噪声测量修正	GB 12348-2008 HJ706-2014	AWA6228+声级计 STD-A10012-20 AWA6221A 声校准器 STD-A10013-20

8.3 执行标准

表 7-4 执行标准

类别	执行标准
无组织废气	氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 1 中二级新扩改建标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表 7 中标准限值
噪声	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准限值

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

（3）烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核，在测试时保证采样流量的稳定。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声检测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于

0.5dB。测时无雨雪、无雷电天气，风速小于 5.0m/s。噪声测定的原始数据条现场打印，做好检测点位与文件号的对应关系以及检测点位示意图等相关的记录。打印条有项目编号、监测点位名称以及检测人员签名。填写采样记录并校核。

9 验收监测结果

9.1 环境保护设施调试效果

9.1.1污染物达标排放监测结果

9.1.1.1 废气

（1）无组织废气

项目无组织废气监测结果见表 9-1.

表 9-1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果			标准限值	结果判断
				1	2	3		
厂界上风向 K1	2022.12.19	氨	mg/m³	0.13	0.12	0.14	1.5	达标
	2022.12.20			0.12	0.12	0.14		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			0.11	0.15	0.16		达标
	2022.12.20			0.12	0.13	0.14		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			0.14	0.15	0.16		达标
	2022.12.20			0.14	0.14	0.13		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			0.14	0.15	0.14		达标
	2022.12.20			0.12	0.15	0.13		达标
厂界上风向 K1	2022.12.19	硫化氢	mg/m³	ND	ND	ND	0.06	达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界上风向 K1	2022.12.19	臭气浓度	无量纲	11	11	13	70	达标
	2022.12.20			11	11	11		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			11	11	13		达标
	2022.12.20			13	11	13		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			13	13	13		达标
	2022.12.20			11	13	11		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			13	11	11		达标
	2022.12.20			12	11	13		达标

备注：

1、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）无组织排放二级（新改扩建）标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 标准限值；

2、实测浓度低于方法检出限，以“ND 表示”。

9.1.1.2 噪声

项目噪声监测结果见表 9-2。

表 9-2 厂界噪声检测结果

检测点位	检测日期	检测项目	主要声源	检测结果（dB（A））		标准限值（dB（A））		结果判断	
				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
项目所在地厂界东侧 1#	2022.12.19	工业企业厂界环境噪声	猪叫声	46	39	60	50	达标	达标
	2022.12.20			48	44			达标	达标
项目所在地厂界南侧 2#	2022.12.19			38	36			达标	达标
	2022.12.20			43	41			达标	达标
项目所在地厂界西侧 3#	2022.12.19			53	38			达标	达标
	2022.12.20			42	40			达标	达标
项目所在地厂界北侧 4#	2022.12.19			57	40			达标	达标
	2022.12.20			51	43			达标	达标

备注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

9.1.1.3 固体废物

本项目营运期固体废物主要为:猪粪、污水处理系统沼渣、病死猪、生活垃圾、医疗废物、废脱硫剂和废包装材料等。

本项目猪粪、污泥置于堆粪棚当天外运至简阳市三星惠农科技有限公司作有机肥原料；项目产生病死猪均交由简阳汇迪无害化处理有限公司进行无害化处理。项目内产生的生活垃圾实行袋装化，集中收集后，交由环卫部门送至当地生活垃圾填埋场集中处理。运营期间产生的废弃药品、废弃兽药包装袋、过期兽药等医疗废物由暂存间进行暂时存放，定期交由成都瀚洋环保实业有限公司、四川绿行环保科技有限公司进行处理、废机油、废机油桶交由四川绿艺华福石化科技有限公司处理。废脱硫剂废料为纯度较高的硫磺级硫化铁，暂存于仓库，由脱硫剂供应商回收处理。

综上所述，本项目一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定要求，处置措施满足环评要求，符合验收条件。项目危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定，危废处置措施满足环评及国家废物处置管理要求，符合验收条件。

9.1.1.4 污染物排放总量核算

根据环评及其批复要求，本项目为养殖类项目，营运期间场内不涉及饲料加工，不涉及国控大气污染总量控制指标 SO_2、NO_x 的排放；项目营运期员工生活污水、养殖废水等经收集后送污水处理设施处理后，用于周边土地农灌，不外排，不涉及国控水污染总量控制指标 COD、NH_3-N 的排放。

9.2 环境管理检查

9.2.1 环保机构、人员及职责检查

简阳市同合乡唐中顺家庭农场配置了兼职环保管理人员，主要负责全厂日常环保管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与 完善。建立了专门的环保管理体系，各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作。编制了《环境保护管理制度》，在其中明确了环境保护管理机构、规定了人员及其职责，明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

9.2.2 环保档案管理情况检查

简阳市同合乡唐中顺家庭农场与项目有关的各项环保档案资料（环评报告书、环评批复、环保设备档案、危废协议等）由公司综合部保管，环保设施运行及维修记录由综合部保管。

9.2.3“三同时”执行情况

本项目环保审批手续（见附件）齐全。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投产使用，执行了“三同时”制度。

9.2.4 环保设施运行、维护情况

在现场验收监测期间，我们采取查看现场、查阅运行记录、询问相关人员三种方式对环保设施进行了检查，检查结果表明公司严格执行了各项环保设施运行、维护管理制度和操作规程，环保设施运行维护情况较好，主要措施如下：1、建立了环保设施运行维护管理制度，主要设备建立了操作规程，操作使用人员熟悉操作规程和维护管理制度，在实际工作中能正确使用。2、设立了环保设施兼职管理人员，职责明确，落实到位。每班次对废气、废水、噪声及固废等环保设施情况进行例检，检查结果作详细记录，如果发现异常情况及时上报，按相关程序处理。

9.2.5 风险防范事故应急措施检查

本项目医疗废物暂存间、堆粪棚、污水处理设施构筑物（包括预处理池、储液池、应急池、反应区等）、发电机房及储油间、药品集中库房、污水收集管（埋地）、各猪舍用防渗“混凝土+黏土防渗层”防渗处理。

10 周边公众意见调查

10.1 公众意见调查内容

为了了解企业所在区域范围内公众对企业的态度，根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，我公司在验收检测期间对项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查将以问卷统计形式进行，发放问卷 20 份，收回 20 份，回收率 100%，调查有效，调查结果统计见表 10-1、10-2。

表 10-1 调查对象基本情况（个人）

姓名	性别	年龄	职业	文化程度	联系方式	住址
胡海军	男	60			18349920338	简阳市三星镇干石山村 6 组
胡怀全	男	61			13684018297	简阳市三星镇干石山村 6 组
陈素兰	女	53			13440118964	简阳市三星镇干石山村 6 组
蒋俊英	女	50			13438222546	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐勇	男	24			18208183036	简阳市三星镇干石山村 6 组
蒋增容	女	52			13540796536	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐仕财	男	34			15228350119	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐中礼	男	50			18708204809	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐中明	男	54		初中	18780000261	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐中德	男	57			13289922048	简阳市三星镇干石山村 6 组
姚志兰	女	48			15775185068	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐仕林	男	27			17608047660	简阳市三星镇干石山村 6 组
李晓英	女	56			15982174221	简阳市三星镇干石山村 6 组
付贤清	女	56			15984650327	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐琼	女	35			13683477400	简阳市三星镇干石山村 6 组
刘凤英	女	56			13880216390	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐兵	男	24			15982424959	简阳市三星镇干石山村 6 组
唐中宣	男	62			13550346039	简阳市三星镇干石山村 6 组
黄得会	女	49			18227902650	简阳市三星镇干石山村 6 组
张丽	女	38			14702809335	简阳市三星镇干石山村 6 组

表 10-2 公众参与调查结果统计表

调查内容	可接受（或认同）程度	人数	百分比（%）
1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好	20	100
	一般	0	0
	较差	0	0
	非常差	0	0
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意	20	100
	基本满意	0	0
	不满意	0	0
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气	20	100
	固体废物	1	5
	生态破坏	1	5

	废水	20	100
	噪声	1	5
	环境风险	1	5
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响	0	0
	不利影响	0	0
	无影响	19	95
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无	20	100
	较轻	0	0
	较重	0	0
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治	1	5
	废水污染防治	20	100
	固体废物处置	1	5
	噪声污染防治	1	5
	生态减缓措施	1	5
	其他	1	5
7、你对该单位的环境保护工作满意程度	满意	20	100
	较满意	0	0
	不满意	0	0

由上表可以看出：群众对本项目建设的了解情况：被调查者基本都对本项目了解。100%被调查者认为本项目对周围的环境质量总体状况良好。100%对项目施工期、运行期采取的环保措施满意。100%的群众认为本项目运行期应重点关注废气，5%的群众认为本项目运行期应重点关注固体废物、生态破坏、废水、噪声、环境风险。95%的群众认为本项目对当地居民生活无影响。100%的群众认为固体废物储运及处理处置无影响。100%的群众认为本项目运行期应采取的环保措施主要为废水污染防治，5%的群众认为本项目运行期应采取的环保措施主要为废气污染防治、固体废物处置、噪声污染防治、生态减缓措施和其它的环保措施。100%的群众对本环境保护工作满意。

11 验收监测结论

11.1 环保设施调试运行效果

11.1.1 废气污染物排放监测结果

验收监测期间，厂界无组织排放废气中氨和硫化氢监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值；臭气浓度检测结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 中排放标准限值。因此，本项目监测期间各无组织废气均能实现达标排放，满足验收要求。

11.1.2 废水

验收监测期间，项目废水经污水处理设施处理后，储存于储液池，由建设单位建设的污水管道排至协议消纳地作为农肥，不外排。满足验收要求。

11.1.3 噪声

验收监测期间，厂界噪声监测中各监测点位昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准，满足验收要求。

11.1.4 固废

本项目一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定要求，处置措施满足环评要求，符合验收要求。项目危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定，危废处置措施满足环评及国家废物处置管理要求，符合验收要求。

11.1.5 总量控制

根据环评及其批复要求，本项目为养殖类项目，营运期间场内不涉及饲料加工，不涉及国控大气污染总量控制指标 SO_2、NO_x 的排放；项目营运期员工生活污水、养殖废水等经收集后送污水处理设施处理后，用于周边土地农灌，不外排，不涉及国控水污染总量控制指标 COD、NH_3-N 的排放。

11.2 验收结论

本项目在建设过程中，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的“三同时”制度。验收监测期间，项目运行过程中产生的废水、废气、噪声和固废均能够达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。符合通过建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目竣工环境保护设施验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 简阳市同合乡唐中顺家庭农场　　**填表人(签字):**　　**项目经办人(签字):**

建设项目	项目名称	简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目						建设地点		简阳市三星镇干石山村10组							
	建设单位	简阳市同合乡唐中顺家庭农场						邮编		641404		联系电话		15228350119			
	行业类别	A0313 猪的饲养			建设性质	□新建 ☑改扩建 □技术改造		建设项目开工日期		2022 年 8 月		实际完工日期		2022 年 12 月			
	设计生产能力	年存栏育肥猪 4000 头，出栏商品猪 8000 头养殖场						实际生产能力		与环评一致							
	投资总概算(万元)	750	环保投资总概算(万元)			173.25	所占比例%		23.1	环保设施设计单位			/				
	实际总投资(万元)	750	废气、废水等治理措施实际环保投资(万元)			173.25	所占比例%		23.1	环保设施施工单位			/				
	环评审批部门	成都市简阳生态环境局		批准文号		简环评审〔2022〕22 号	批准日期		2022 年 8 月 23 日	环评单位			四川优千胜环境工程有限公司				
	初步设计审批部门	/		批准文号		/	批准日期		/	环保设施监测单位			成都斯坦德分析检测有限公司				
	环保验收审批部门	/		批准文号		/	批准日期		/								
	废水治理(万元)	85.4	废气治理(万元)		38.9	噪声治理(万元)		2.2	固废治理(万元)		24.35	绿化及生态(万元)		2.4	其它(万元)		15
	新增废水处理设施能力		/			新增废气处理设施能力			/			年平均工作时		315			

污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氨氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	石油类	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	废气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	烟尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业粉尘	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	工业固体废物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	与项目有关的其它特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：厂区平面布置图

附图 3：项目分区防渗图

附图 4：项目环保设备设施照片

附图 5：竣工日期公示截图

附图 6：验收公示截图

附图 7：自验系统上传截图

附件：

附件 1：立项文件

附件 2：环评批复

附件 3：废水消纳协议

附件 4：病死猪无害化处理协议

附件 5：卫生防护距离内敏感点租赁协议

附件 6：有机肥协议

附件 7：排污许可登记回执

附件 8：医疗废物处置协议


附件 9：危废处置合同

附件 10：监测报告

附件 11：公参调查表

附件 12：验收意见

Autodesk

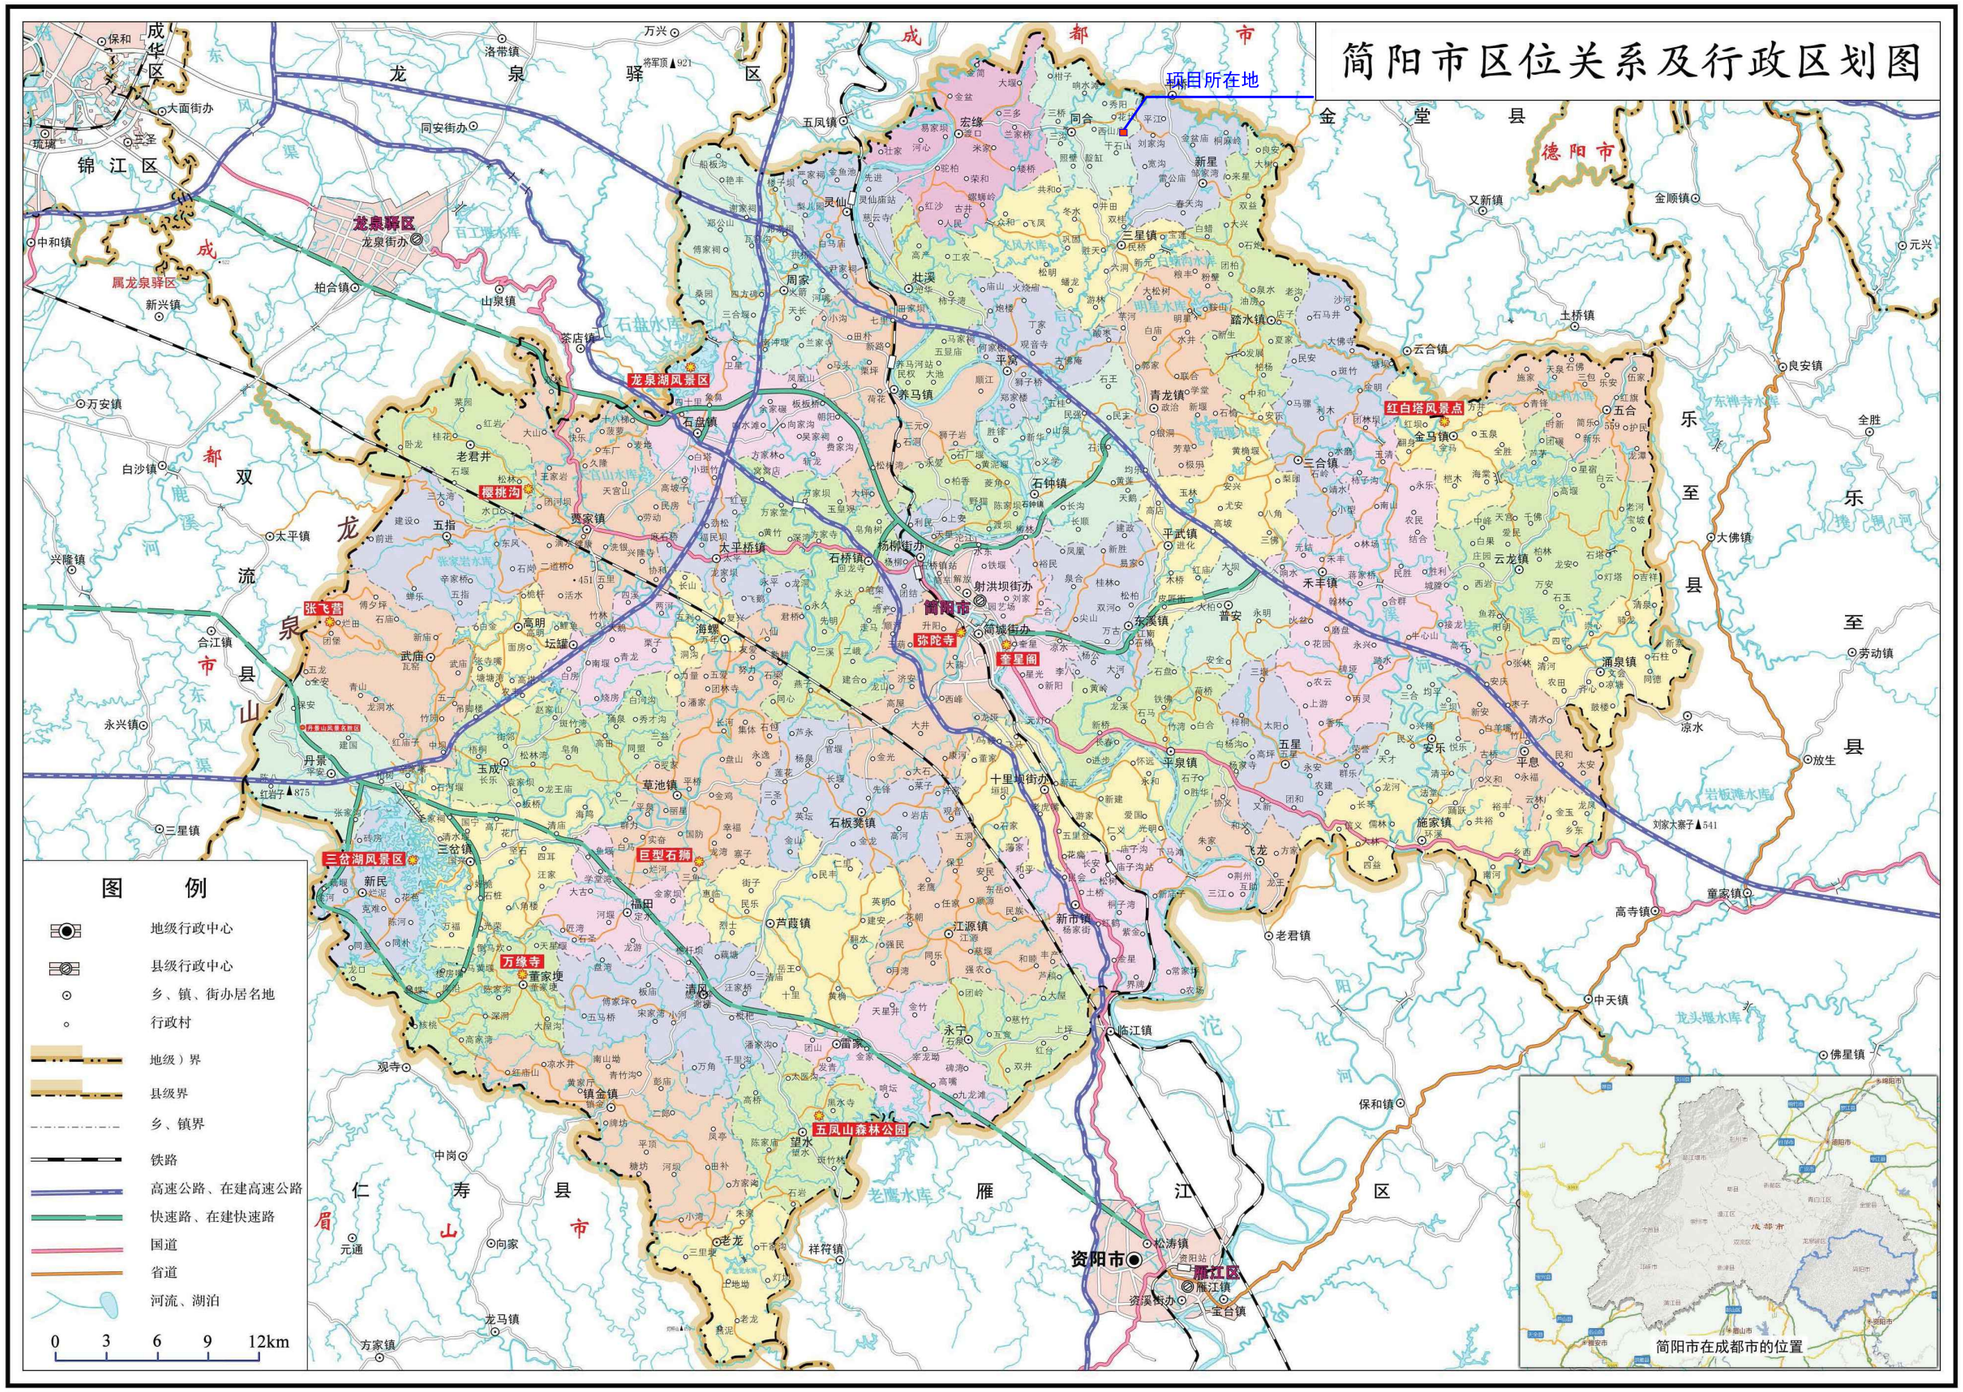


附图1 项目地理位置图

Autodesk

Autodesk

Autodesk

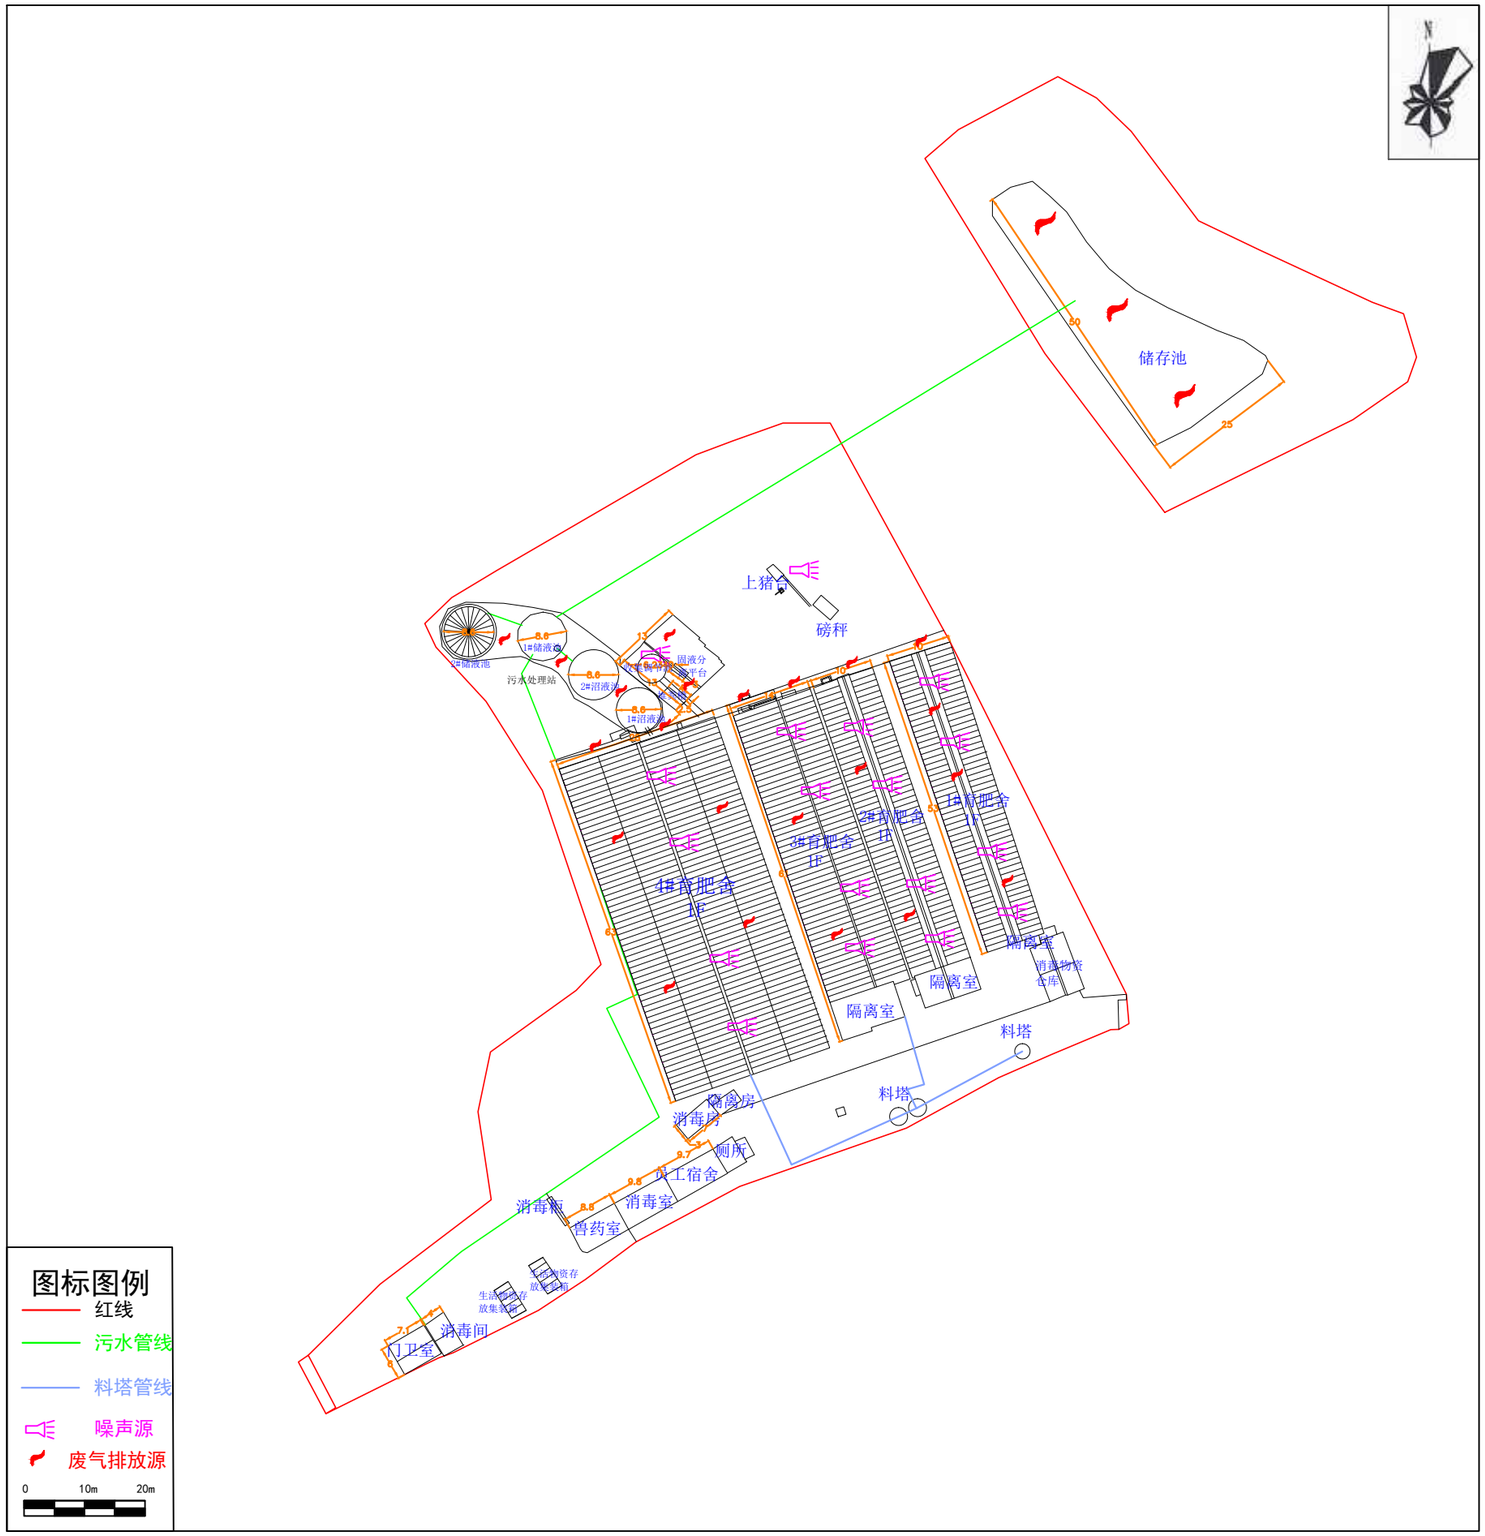


附图2 厂区平面布置图

Autodesk

Autodesk

Autodesk

Autodesk

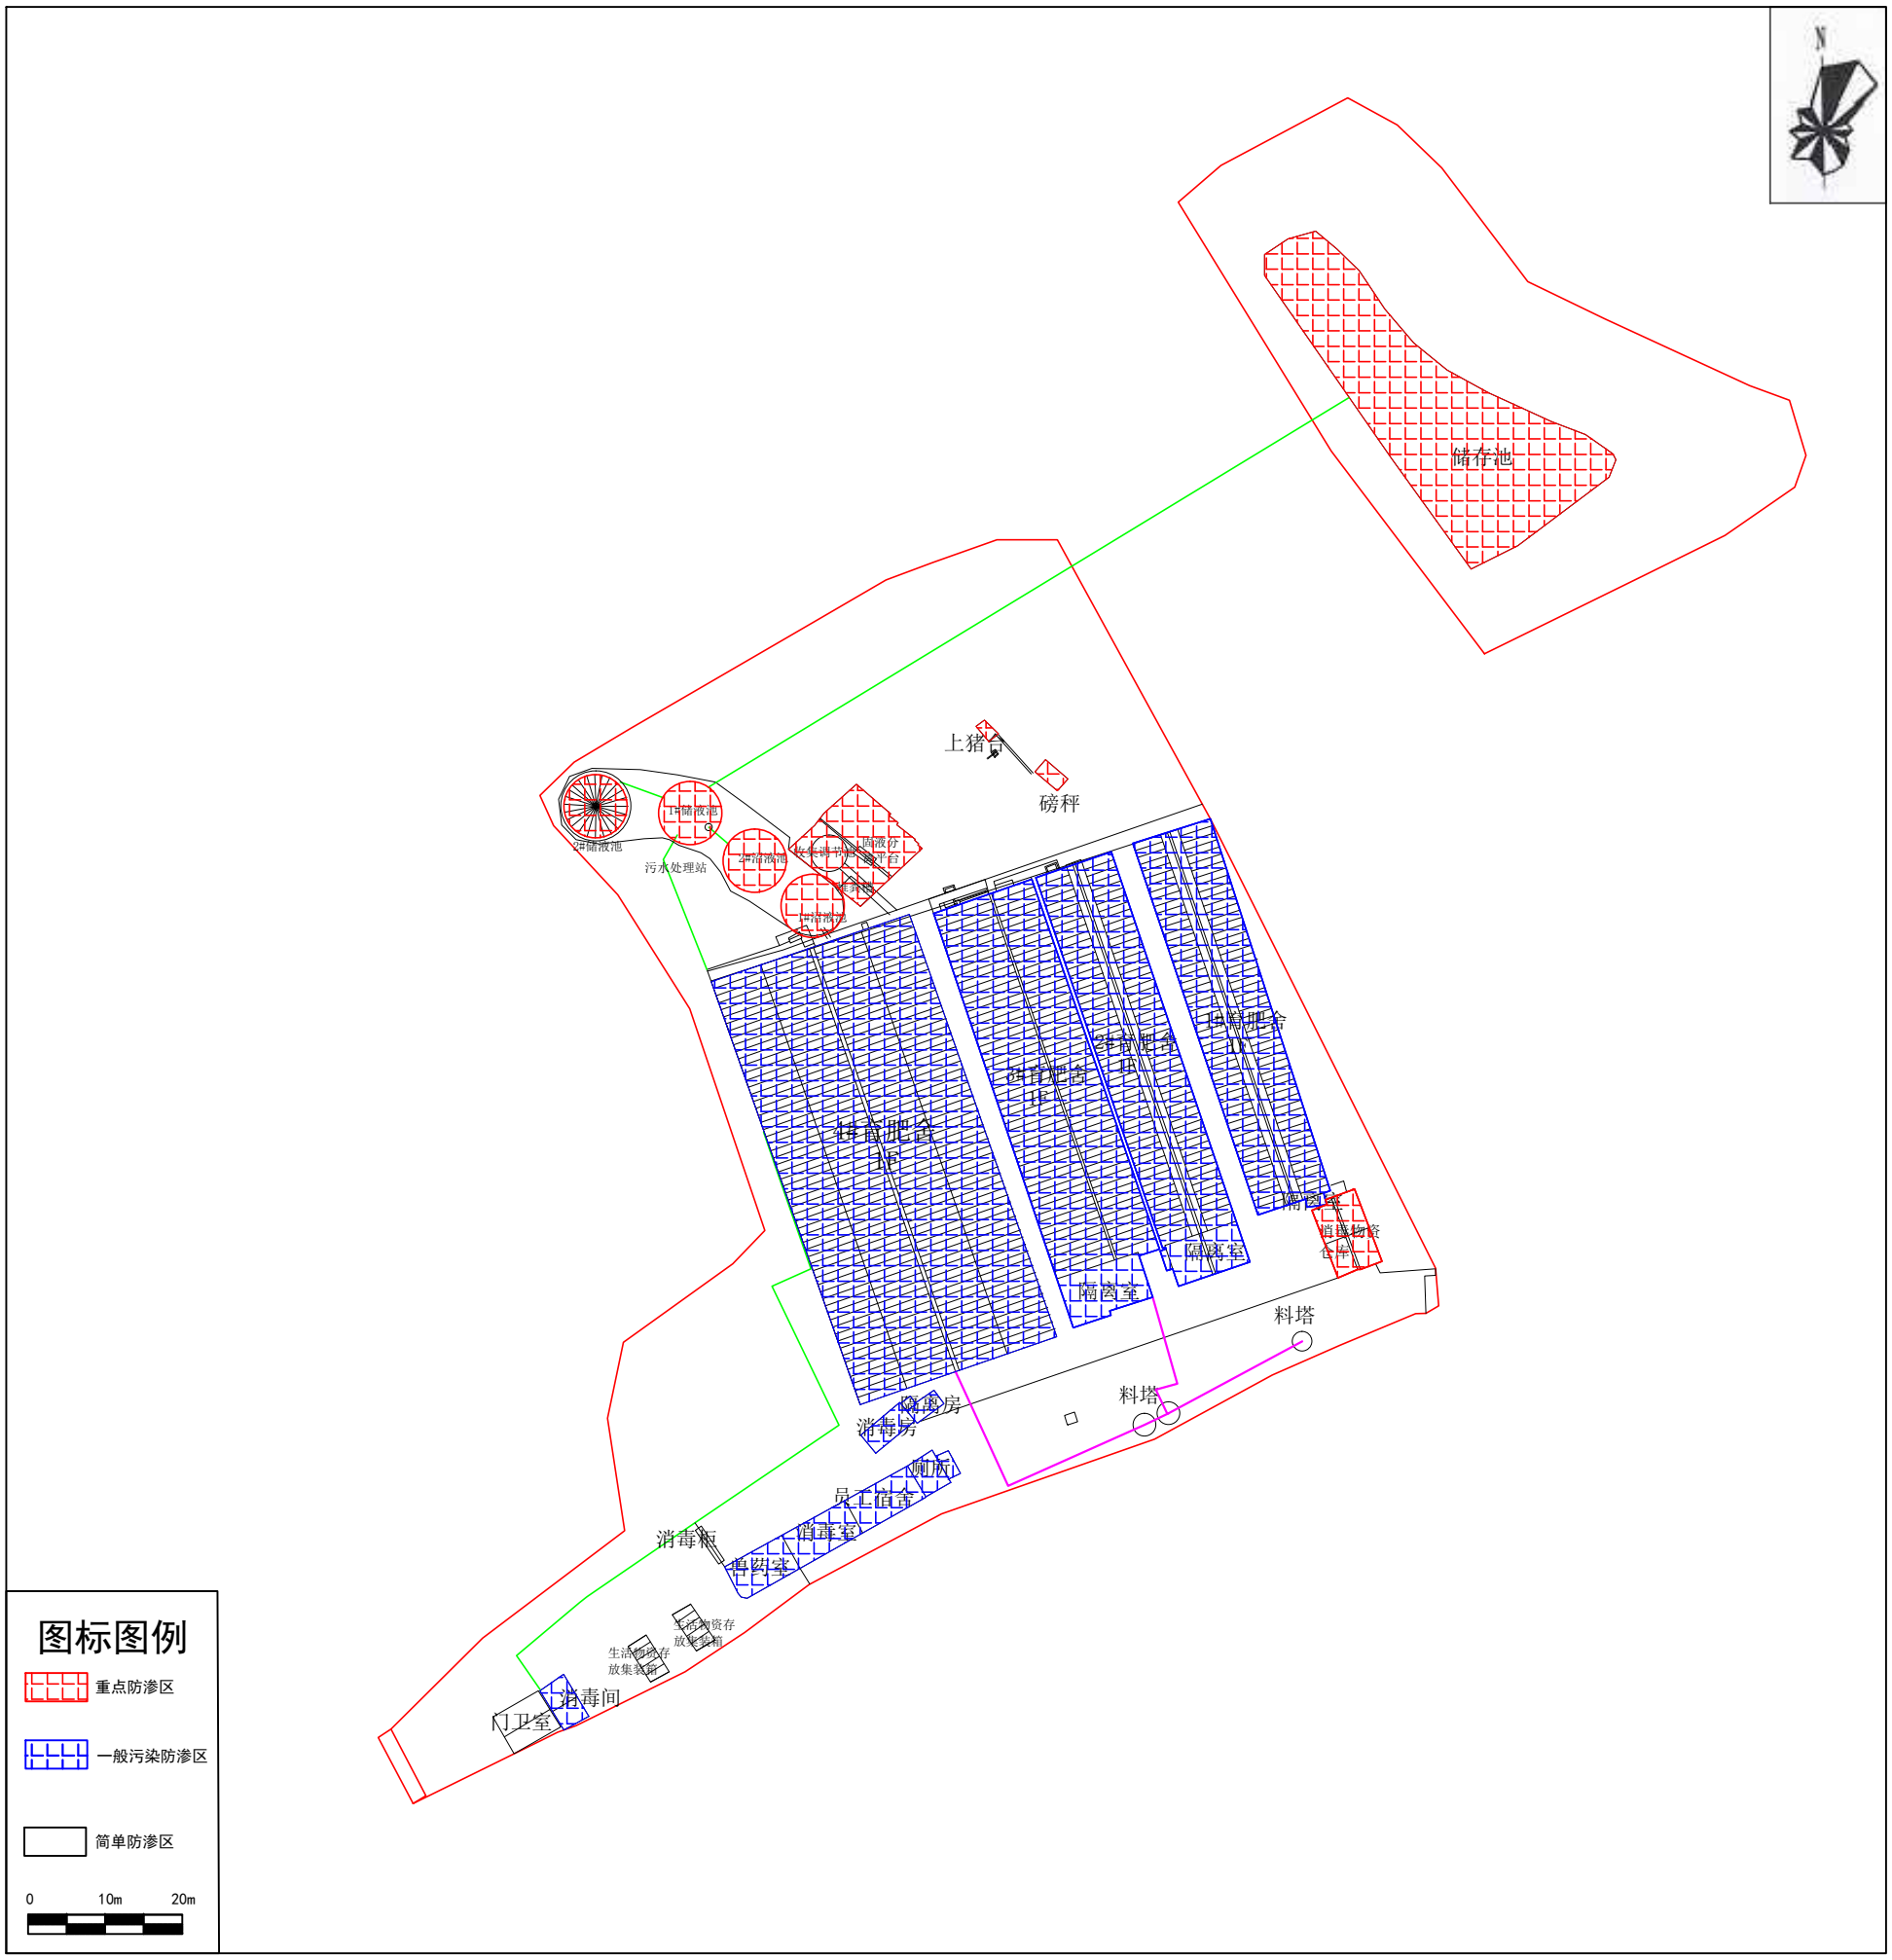

附图3 项目分区防渗图

Autodesk

	
圈舍水喷淋	圈舍水喷淋
	
调节池加盖	沼液池、储液池加盖

	
储存池	灌溉官网

http://www.scyqs.com/show-16-125-1.html
游戏大全 系统重装 精品购物 收藏夹栏
点此搜索

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目竣工日期公示

2022-12-08 10:45:00

根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，现将我公司（简阳市同合乡唐中顺家庭农场）简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目竣工信息公示如下:

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，项目主体工程及配套的环保设施已按环评及批复要求建成,项目竣工日期为2022年12月08日。

联 系 人：唐仕财

联系电话：15228350119

简阳市同合乡唐中顺家庭农场

2022年12月08日



建设项目竣工日期公示

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，现将我公司（简阳市同合乡唐中顺家庭农场）简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目竣工信息公示如下：

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，项目主体工程及配套的环保设施已按环评及批复要求建成，项目竣工日期为 2022 年 12 月 8 日。

联系人：唐仕财

联系电话：15228350119

简阳市同合乡唐中顺家庭农场

2022 年 12 月 8 日

四川省固定资产投资项目备案表

填报单位：简阳市同合乡唐中顺家庭农场 **备案申报时间：2022年05月31日**

项目单位基本情况	*单位名称	简阳市同合乡唐中顺家庭农场		
	单位类型	个体工商户		
	证照类型	企业营业执照(工商注册号)	证照号码	92510185MA6CQNE96T
	*法定代表人（责任人）	唐中顺	固定电话	13890170777
	项目联系人	唐中顺	移动电话	13890170777
项目基本情况	*项目名称	简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目		
	项目类型	基本建设（发改）	建设性质	扩建
	所属行业	农业		
	*建设地点详情	简阳市同合乡干石山村10组		
	*项目总投资及资金来源	项目总投资额【720】万元，其中：使用外汇【0】万美元，企业自筹【720】万元；		
	拟开工时间（年月）	2022年06月	拟建成时间（年月）	2022年07月
	*主要建设内容及规模	改造原有3栋圈舍，并扩建新增1栋圈舍，扩建后养殖厂房总面积约6176平方米，并配套建设环保设施及其他公辅设施。项目建成后，养殖规模由年存栏1000头生猪扩大到年存栏4000头生猪。		
声明和承诺	符合产业政策	备案者声明： √属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目 □属于未列入《产业结构调整指导目录》的允许类项目 □属于《西部地区鼓励类产业目录》的项目 √不属于产业政策禁止投资建设，不属于实行核准或审批管理的项目		√阅读产业政策 （二选一） （可选可不选） （必选）

填写说明：1．请用“√”勾选“□”相应内容。
2．表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
3．表格中栏目不够填写时可在备注中说明。

四川省发展和改革委员会
四川省经济和信息化厅 制表

全国投资项目在线审批监管平台（四川）

	填报信息真实	√保证提供的项目相关资料及信息是真实、准确、完整和合法的，无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，对项目信息的真实性负责，如有不实，我单位愿意承担相应的责任，并承担由此产生的一切后果。
	招投标活动承诺	√将按照招投标管理相关法律法规和政策规定，开展项目招投标活动。
备注		
备案机关确认信息	简阳市同合乡唐中顺家庭农场（单位）填报的简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目（项目）备案信息已收到。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》、《四川省企业投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，已完成备案。 备案号：川投资备【2205-510185-04-01-333937】FGQB-0100号 若上述备案事项发生重大变化，或者放弃项目建设，请你单位及时通过投资项目在线审批监管平台告知备案机关，并办理备案信息变更。 备案机关：简阳市发展和改革局 2022年05月31日	

注：

1．备案表根据备案者基于真实性承诺提供的项目备案信息自动生成，仅表明项目已依法履行项目信息告知的备案程序，不构成备案机关对备案事项内容的实质性判断或保证。

2．备案号“【】”内代码为投资项目在线审批监管平台赋码生成的项目唯一代码，可通过平台（http://tzxm.sczwfw.gov.cn）使用项目代码查询验证项目备案情况，有关部门统一使用项目代码办理相关手续。

3．按照国家相关要求，请及时通过在线平台如实将项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息报送项目备案机关，并遵循诚信和规范原则。

（扫描二维码，查看项目状态）

填写说明：1．请用“√”勾选“□”相应内容。
2．表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
3．表格中栏目不够填写时可在备注中说明。

四川省发展和改革委员会
四川省经济和信息化厅 制表

全国投资项目在线审批监管平台（四川）

成都市简阳生态环境局

简环评审〔2022〕22号

成都市简阳生态环境局
关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目
环境影响报告书的批复

简阳市同合乡唐中顺家庭农场：

你单位报送的《简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》及专家意见已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于四川省成都市简阳市三星镇干石山村10组。项目拟年存栏生猪4000头（年出栏生猪8000头），主要建设内容：1.主体工程：猪舍（育肥舍4栋）；2.辅助工程：消毒房、堆粪棚、中转料塔；3.公用工程：供水工程、供电工程、供热工程、通风系统、污水管网、进出场道路；4.办公及生活设施：门卫房、综合办公生活区、生产区消毒房、生产区隔离房；5.环保工程。项目总投资750万元，其中环保投资173.25万元。

项目取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2205-510185-04-01-333937】FGQB-0100号），符合现行产业政策。项目取得了简阳市三星镇人民政府（原简阳市同合乡人民政府）、

简阳市农业农村局、简阳市规划和自然资源局、成都市简阳生态环境局等部门联合认定的《成都市简阳市畜禽养殖场（户）选址确认申请表》和简阳市三星镇人民政府出具的《关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场设施农用地备案的函》（三府函[2022]121号），规划和用地取得了相关许可。在严格落实报告书提出的防止生态破坏和防治环境污染的措施后，不利环境影响可得到减缓和控制。因此，我局原则同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、选线、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按报告书要求落实各项环保设施的建设，加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响；加强运营期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。

（二）施行雨污分流制，落实废水处理措施。运营期，厂区自建污水处理设施，采取“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”工艺处理，养殖废水、生活污水、圈舍冲洗废水、车辆清洗废水经污水处理设施处理达《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246）、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求后还田利用，不外排。

（三）落实报告书提出的废气治理措施，确保大气污染物达

标排放。运营期，圈舍恶臭采取圈舍密闭、建设水帘通风系统、投放臭气吸附剂、喷洒除臭剂、圈舍出口建设生物喷雾除臭设施等措施处理达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）厂界标准，其中臭气达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；堆粪棚、粪污收集调节池、干湿分离机、储液池臭气收集后同圈舍恶臭废气一同采用生物喷雾除臭的方式处理；沼气经脱硫塔脱水脱硫处理后通过火炬燃烧器放空燃烧处理。

（四）加强噪声污染控制，选取低噪设施、安装减振设备，优化厂区平面布置，安装吸音材料，利用厂房隔声、距离衰减等措施处理后使噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（五）固体废物应严格按照报告书中的处置措施落实去向，危险废物依法向属地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并执行国家相关管理规范。运营期，猪粪、污水处理站沼渣经堆粪棚处理后外售手续齐全的有机肥厂综合利用；废脱硫剂交由生产厂家回收处理；废包装材料外售废品收购站；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；病死猪交由有相关处置资质的无害化处置单位处理；畜禽医疗废物交由有相应医疗危废处置资质的单位处理；泵维护废机油、废弃包装物交由有相应危废处置资质的单位处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制定并落实应急预案

和风险防范措施，杜绝污染事故的发生。加强环境风险防范工作，确保项目对环境的安全。

（七）建设应注意解决好的其它问题，结合环评报告书及专家评估意见予以落实。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。认真落实排污许可管理的有关规定，应在调试前依法取得排污许可。项目竣工后，必须按照原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等相关法律法规规定做好验收工作。项目建设单位违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、请各相关职能部门按照职能职责做好该项目日常的环境保护监督管理工作。

七、行政复议与行政诉讼权利告知。

建设单位认为本批复侵犯其合法权益的，可以自收到本文件之日起六十日内向成都市生态环境局或者成都市人民政府提起行政复议，也可以自收到本文件之日起六个月内向成都高新技术产

业开发区人民法院提起行政诉讼。

成都市简阳生态环境局联系方式

电话：028——27028827

通讯地址：四川省简阳市行政审批局生态环境窗口（641400）

成都市简阳生态环境局

2022 年 8 月 23 日

抄　送：局办公室、大气环境科、水生态环境科、污染防治综合科、农村生态科、应急和督察科、综合行政执法科、监测站，四川优千胜环境工程有限公司。

成都市简阳生态环境局法规和审批科　　2022 年 8 月 23 日印

猪粪（沼肥）消纳协议

甲方：郑州市惠园合乡唐中顺家庭农场

乙方：郑州市二七区侯寺镇千古山村4组

为提升农产品质量，发展生态循环农业，防止畜牧养殖污染，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就消纳猪粪(沼肥)达成如下协议：

一、甲方保证养殖生猪所产生的所有猪粪(沼肥)全部无偿提供给乙方作为有机肥使用，并为乙方装运猪粪(沼肥)提供方便。

二、乙方以“合作社+基地+农户”方式发展果蔬生产基地442余亩，以保证有足量土地消纳甲方猪粪(沼肥)，防止过量施用造成环境污染。

三、乙方定期安排车辆到甲方养殖场运输猪粪和沼肥(运输费用由乙方负担)，防止干粪场、沼液储存池满溢造成环境污染。

四、乙方保证所有猪粪(沼肥)全部用于自建果蔬基地、农业用地不得转卖、转送，一旦违反，甲方可单方终止协议。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方不得反悔，本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（签章）：

乙方代表（签章）：社长徐迎平

见证方：千古山村村民委员会

2021.5.1

签订日期：2021.5.1

猪粪（沼肥）消纳协议

甲方：简阳市阳合乡唐中顺家庭农场。

乙方：简阳市三星镇千石山村6组。

为提升农产品质量，发展生态循环农业，防止畜牧养殖污染，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就消纳猪粪(沼肥)达成如下协议：

一、甲方保证养殖生猪所产生的所有猪粪(沼肥)全部无偿提供给乙方作为有机肥使用，并为乙方装运猪粪(沼肥)提供方便。

二、乙方以“合作社+基地+农户”方式发展果蔬生产基地616余亩，以保证有足量土地消纳甲方猪粪(沼肥)，防止过量施用造成环境污染。

三、乙方定期安排车辆到甲方养殖场运输猪粪和沼肥(运输费用由乙方负担)，防止干粪场、沼液储存池满溢造成环境污染。

四、乙方保证所有猪粪(沼肥)全部用于自建果蔬基地、农业用地不得转卖、转送，一旦违反，甲方可单方终止协议。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方不得反悔，本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（签章）：

乙方代表（签章）：

见证方：千石山村村民委员会

签订日期：2021.5.1

2021.5.1

猪粪（沼肥）消纳协议

甲方：四川省合力庄仲顺家庭农场有限公司 法人：庄仲顺

乙方：中江县胡志亮家庭农场 法人：胡志亮

为提升农产品质量，发展生态循环农业，防止畜牧养殖污染，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就消纳猪粪(沼肥)达成如下协议：

一、甲方保证养殖生猪所产生的所有猪粪(沼肥)全部无偿提供给乙方作为有机肥使用，并为乙方装运猪粪(沼肥)提供方便。

二、乙方以“合作社+基地+农户”方式发展蔬菜生产基地1160余亩，以保证有足量土地消纳甲方猪粪(沼肥)，防止过量施用造成环境污染。

三、乙方定期安排车辆到甲方养殖场运输猪粪和沼肥(运输费用由乙方负担)，防止干粪场、沼液储存池满溢造成环境污染。

四、乙方保证所有猪粪(沼肥)全部用于自建蔬菜基地，不得转卖、转送，一旦违反，甲方可单方终止协议。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方不得反悔，本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（签章）：庄仲顺

乙方（签章）：胡志亮

电话：15106331465

签订日期：2022.5.1.

联系电话：13890190777

猪粪（沼肥）消纳协议

甲方：~~广州市白云区钟落潭镇顺家庭农场~~；法人：广州顺

乙方：~~广州市铭家庭农场~~ 法人：邓昌海

为提升农产品质量，发展生态循环农业，防止畜牧养殖污染，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就消纳猪粪(沼肥)达成如下协议：

一、甲方保证养殖生猪所产生的所有猪粪(沼肥)全部无偿提供给乙方作为有机肥使用，并为乙方装运猪粪(沼肥)提供方便。

二、乙方以“合作社+基地+农户”方式发展蔬菜生产基地680余亩，以保证有足量土地消纳甲方猪粪(沼肥)，防止过量施用造成环境污染。

三、乙方定期安排车辆到甲方养殖场运输猪粪和沼肥(运输费用由乙方负担)，防止干粪场、沼液储存池满溢造成环境污染。

四、乙方保证所有猪粪(沼肥)全部用于自建蔬菜基地，不得转卖、转送，一旦违反，甲方可单方终止协议。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方不得反悔，本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（签章）：~~广州市白云区钟落潭镇顺家庭农场~~

乙方（签章）：广州铭家庭农场

联系电话：13801170777.

签订日期：2022.4.1.

13582718361

猪粪（沼肥）消纳协议

甲方：~~广州市白云区钟落潭镇顺家庭农场~~；法人：广州顺

乙方：~~广州市铭家庭农场~~ 法人：邓昌海

为提升农产品质量，发展生态循环农业，防止畜牧养殖污染，甲、乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就消纳猪粪(沼肥)达成如下协议：

一、甲方保证养殖生猪所产生的所有猪粪(沼肥)全部无偿提供给乙方作为有机肥使用，并为乙方装运猪粪(沼肥)提供方便。

二、乙方以“合作社+基地+农户”方式发展蔬菜生产基地680余亩，以保证有足量土地消纳甲方猪粪(沼肥)，防止过量施用造成环境污染。

三、乙方定期安排车辆到甲方养殖场运输猪粪和沼肥(运输费用由乙方负担)，防止干粪场、沼液储存池满溢造成环境污染。

四、乙方保证所有猪粪(沼肥)全部用于自建蔬菜基地，不得转卖、转送，一旦违反，甲方可单方终止协议。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，双方不得反悔，本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（签章）：~~广州市白云区钟落潭镇顺家庭农场~~

乙方（签章）：广州铭家庭农场

联系电话：13801170777.

签订日期：2022.4.1.

13582718361

动物及动物产品无害化处置
委托协议书

委托方(甲方)：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

受托方(乙方)：简阳市汇迪无害化处理有限公司

依照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条列》、《病死及病害动物无害化处理技术规范》和《成都市病死畜禽集中无害化处理工作实施方案》相关规定要求，为确保人民群众身体健康和社会稳定，结合简阳市实际情况，在甲乙双方指定专人实施全程监控下，甲方委托乙方对病死猪进行无害化处置。经甲乙双方协商一致，协议如下。

一、甲方职责和义务

(一)负责将需要进行无害化处置的死猪进行包装处理，方便运输，包装内不得含有非肉类的其他物品。如因甲方病死猪含有非肉类的其他物品造成乙方运输车辆和处理设备损坏，甲方承担由此造成的一切损失。

(二)负责提供无害化运输专用车停靠的场地，并将需要进行无害化处置的死猪搬运至该场地。

(三)负责指派专人和监督人员对需要进行无害化处置的肉类进行清点和交接，并签字确认。

（四）甲方所有病死猪须交由乙方进行无害化处置，不得私自贩卖、丢弃、填埋。

二、乙方职责和义务

(一)乙方负责甲方所有死猪的无害化处置事宜；

(二)乙方在接到甲方通知后24小时内派出专业人员和专用车辆到达指定地点按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》采取有效措施进行收集，并对现场进行消毒，办理好交接手续；

(三)乙方必须严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》的要求进行无害化处置，要确保在甲方收集的病死猪不得流入社会，一旦流入乙方承担全部责任；

三、未尽事宜

未尽事宜由双方协商解决，并补签书面协议。

四、协议效力

本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

本协议式肆份，由甲乙双方各执贰份。

委托方(甲方)：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

委托方签字(盖章)：

2022年6月14日

受委托方(乙方)：简阳市汇迪无害化处理有限公司

受委托方签字(盖章)：

2022年6月14日

房屋租赁合同

出租方：唐中宝　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有280平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇千石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金280元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计3400元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：唐中宝

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：胡怀玉　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有126平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金150元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1800元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：胡怀玉

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：胡怀东　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有130平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金_____元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计_____元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：胡怀东

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：胡收成　　（简称甲方）
承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有180平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇平石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金180元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计2160元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：胡收成　　乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日　　2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：胡仕云　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有120平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金120元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1560元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：胡仕云

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：胡海军　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有108平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议，

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金110元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1320元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：胡海军

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：[illegible]（简称甲方）

承租方：[illegible]（简称乙方）

甲方有120平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金120元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1440元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：[illegible]

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：[illegible]

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：唐中德　　（简称甲方）
承租方：唐顺　　（简称乙方）

甲方有86平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金180元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1080元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：唐中德
2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐顺
2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：钟树洁　　（简称甲方）
承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有100平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金110元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1320元，以后应在付款末前10天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：钟树洁

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

房屋租赁合同

出租方：罗湘永　　（简称甲方）

承租方：唐中顺　　（简称乙方）

甲方有P5平方米面积的房屋租给乙方作为乙方员工宿舍用房。地址：简阳市三星镇干石山村6组，经甲乙双方协商，达成以下协议：

（1）租房从2021年5月1日起至2026年4月30日止，有效期为5年，期满后要续签，协议另签，房租另行协商。

（2）甲方出租房屋的月租金100元，乙方向甲方缴租方式为每年支付一次，租金合计1200元，以后应在付款末前 10 天支付。

（3）乙方入住后，无权将甲方用房转租他人，不得擅自改动房屋使用性质，更不得擅自改变房屋结构，必须爱护房内设施，如有损坏应及时维修，否则照价赔偿。

（4）此房属于民用房。

（5）乙方在第一次交纳房租时，应多交一个月房租作为押金，待合同期满后，乙方结清水电气费并保证房屋设施完好后，甲方将押金退还给乙方。

（6）乙方在协议期满需继续租用此房，应提前一月与甲方商议。

（7）甲、乙双方应共同遵守此协议，不得违约，如有违约，由违约方按照房屋租金的两倍付违约金给对方。

（8）本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效，到期自行作废。

甲方（盖章/签字）：罗湘永

2021年5月1日

乙方（盖章/签字）：唐中顺

2021年5月1日

固体废物协议

甲方：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

乙方：简阳市三新惠农科技有限公司

签订时间：2021 年 1 月 1 日

甲乙双方经过友好协商，本着互利互惠的原则，就畜禽粪污消纳事项自愿合作，为明确甲乙双方责任、权利关系，特签订协议书如下：

一、甲乙双方的责任、权利和义务

1.甲方应按照有关部门的要求，积极完善粪污的处理设施，积极推行生态健康养殖，实行干湿分离，并建有干粪堆积储存场所，用于储存粪便。

2.甲方将固体粪便按每吨 0 元出售给乙方（乙方作为有机肥生产的原料使用），对于不符合标准的（重金属超标），乙方有权拒收。

二、乙方的责任、权利和义务

1.乙方必须具有相应的有机肥生产能力，为甲方处理粪便。

2.乙方自行到甲方养殖场运输粪便，所产生的费用由乙方承担。

3.乙方清运完毕后，应立即将甲方干粪堆积场所打扫干净。

4.乙方在清运养殖粪便过程中不得发生二次污染，严禁弃、

撒、抛，并自行负责清运人员的人身和清运用具的安全，若发生安全事故或清运用具损坏，所发生的一切后果均由乙方承担。

三、违约责任

甲乙双方在自愿合作的基础上签订本协议，双方应加强沟通，任何一方不得以任何理由拒绝协议正常执行，否则由此产生的任何损失或责任由违约方承担，确因不可抗力导致无法履行协议，应免于双方责任。

四、其他事项

本协议一式叁份，甲、乙双方各执一份，一份交属地镇（街道）畜牧兽医部门存档，甲乙双方所在村委会为鉴证方，未尽事宜由甲乙双方协商解决，若产生纠纷由所在镇（街道）协商解决。

五、协议时间

2021 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日

简阳市同合乡唐中顺家庭农场：

甲方代表签字（盖章）：

简阳市三新惠农科技有限公司

乙方代表签字（盖章）：

统一社会信用代码

91510185MA64R14R87

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　简阳市三新惠农科技有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　陈俊光

经营范围　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息技术咨询服务；土地整治服务；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；肥料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；食用农产品批发；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；家禽饲养；活禽销售；食品经营；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册资本　伍亿元整

成立日期　2018年12月03日

营业期限　2018年12月03日至 长期

住　　所　成都市简阳市东城新区大地国际花园2号楼7楼

登记机关　市行政审批局

2021 年 4 月 20 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

固定污染源排污登记回执

登记编号：92510185MA6CQNE96T001X

排污单位名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

生产经营场所地址：简阳市同合乡干石山村10组

统一社会信用代码：92510185MA6CQNE96T

登记类型：☑首次 □延续 □变更

登记日期：2023年02月22日

有 效 期：2023年02月22日至2028年02月21日

注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。

更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

医疗废物安全处置委托协议

协议编号：

甲　　方：　简阳市同合乡唐中顺家庭农场

乙　　方：　四川绿行环保科技有限公司

危险废物安全处置委托协议

医疗废物产生方：简阳市同合乡唐中顺家庭农场　　（以下简称甲方）

医疗废物处置方：四川绿行环保科技有限公司　　（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《医疗废物管理条例》、《四川省固体废物污染环境防治条例》等法律法规规定，现双方就甲方委托乙方处置危险废物达成如下协议：

一、 委托事项：

甲、乙双方商定，甲方委托乙方对其产生的感染性医疗废物、化学性医疗废物、药物性医疗废物、损伤性医疗废物、进行回收清运和无害化处理。

二、双方责任及义务：

（一）甲方责任及义务

1.甲方负责在危险废物产生、暂存环节对危险废物进行分类和包装，应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装容器，具体要求见《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，并放置于甲方专门的医疗废物收集贮存库（点）中，按要求贴上危险废物标签。甲方的危险废物收集、贮存必须符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求，不得将不同性质、不同类别的医疗废物混放，对其收集、贮存过程产生的环境污染事故及其他损害承担责任。

2.甲方委派专人负责医疗废物的转移交接工作，乙方的运输车辆到达后，甲方组织人员将危险废物转运至乙方运输工具上。

3.甲方应配置计重装置，对转移的医疗废物准确称重。

4.甲方严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定规范填写危险废物转移联单并加盖公章后，交付乙方运输驾驶员填写联单中运输栏的内容后随车带回乙方。

5.协议签订时，甲方应向乙方提供以下资料的复印件并加盖甲方公章：营业执照、开户许可证、开票信息。

6.特别约定：对于乙方不能处置的放射性医疗废物、高压容器、废弃的细胞毒性药品、剧毒物品、易燃易爆品、重金属（铅、铬、汞等）含量高的医疗废物，甲方应做好源头分类，杜绝将上述物品交给乙方或混入其他医疗废物交由乙方处置，违反此项约定造成的一切后果，由甲方负责。

7.甲方需自行完成污泥的取样检测，达标后再进行污泥的清掏的工作。

（二）乙方责任及义务

1.乙方向甲方提供有效的危险废物经营许可证、营业执照、道路危险货物运输许可证等资质复

印件。

2. 乙方进入甲方工作区域作业时应严格遵守甲方明示的管理规定。

3. 乙方每次转运危险废物，结算计重依据现场《危险废物转移联单》双方经办人员签字确认的文字凭证为准。

4. 乙方必须按照环境保护相关法律法规、标准规范的要求对收集的医疗废物进行运输、贮存和安全处置。

5. 甲方在接受乙方的服务过程中若对乙方工作人员的服务不满意，可向乙方提出投诉，乙方应在五个工作日内向甲方通报投诉事项的处理情况。

三、处置价格和付款方式

（一）处置费用：

1. 处置价格：

废物类别	废物代码	废物名称	废物成分	预计转运量（千克）	处置价格（元/千克）	处置费（元）
HW01	841-001-01	感染性			6 元	
HW01	841-002-01	损伤性			6 元	
HW01	841-004-01	化学性			60 元	
HW01	841-005-01	药物性			40 元	
合计						

2. 运输费：_____元/车次_____

3. 合计费用（按实产生计算）：服务费总额为：_____元（大写：_____）。

注：对于单位处置量较小，按照处置价格核算处置费不足 1 万元的，因为运输成本、人员成本、运行成本较高等原因，按照 1 万元收费。

（二）付款方式：

1. 银行转账（以乙方提供的转入账号为准）。

2. 本协议生效后 7 日内，甲方向乙方预付处置费 1 万元。在约定的期限后付款的，甲方每延迟一天按应付金额的千分之一向乙方支付延迟给付金。

3. 若在合同时间范围内，非乙方的原因造成医疗废物未能转移处置的，乙方不退还甲方处置费。

4. 乙方收到甲方付款后，向甲方开具合格发票。

5. 如甲方发票遗失，乙方可以按税法规定提供加盖发票专用章的原遗失发票记账联的复印件提供给甲方。

四、违约责任

（一）乙方的车辆到达甲方后，甲方应及时组织装运，因为甲方的原因导致乙方无法对甲方医疗废物进行安全合法装载及运输，时间超过 8 小时的，甲方应向乙方支付车辆来回的返空费，返空费的标准为 4000 元 / 车次。

（二）甲、乙双方任意一方违约的，违约方应当承担守约方因维护合同权利而支出的差旅费、误工费（按工作人员日薪和出差时间计算）、律师费、公证费、诉讼费、资料费等全部费用。

（三）甲方应妥善保管乙方提供的危险废物经营许可证、营业执照、道路危险货物运输许可证等资质复印件。若甲方未合理保管导致被非法利用，致使乙方受损的，甲方应承担全部责任。

五、争议的解决

双方在履行本协议过程中产生争议的，应当协商解决；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

其他约定

1. 对本协议未尽事宜，可由双方协商签订补充协议。本协议与补充协议有冲突的以补充协议为准。

2. 本协议自双方签字盖章后生效。

3. 本协议期限自 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日止，期满时双方可商定续签。

4. 本协议一式 贰 份，甲方执有 壹 份、乙方执有 壹 份，具有同等法律效力。

七、本协议相关附件

1. 乙方营业执照、危险废物经营许可证正本复印件各一份。

2. 运输公司营业执照、道路危险货物运输许可证正本复印件各一份。

3. 运输合同、驾驶员资格证、押运员资格证各一份。

签　章　处	
甲方：　简阳市同合乡唐中顺家庭农场	乙方：四川绿行环保科技有限公司
单位代表（签章）：	单位代表（签章）：
联系电话：15228350119	联系电话：0830-3716058
公司电话：	公司电话：
公司传真：	公司传真：
开户行：　中国农业银行股份有限公司简阳三星分理处	开户行：中国银行股份有限公司泸州分行
账号：22740801040001717	账号：　126630609898
地址：　简阳市同合乡干石山村 10 组	地址：　纳溪区新乐镇长安村三社
税号：92510185MA6CQNE96T	税号：91510500099078704H
财务电话：	财务电话：0830-2295676
票据类型：●专票　　●普票	投诉电话：

合同签订日期：　2023 年　6 月　21 日

成都兴蓉环保科技股份有限公司

危险废物处置服务合同

合同编号：WFCB-2023355

甲　方：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

乙　方：成都兴蓉环保科技股份有限公司

二〇二三年六月

成都兴蓉环保科技股份有限公司
危险废物处置服务合同

甲方（委托方）：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

乙方（受托方）：成都兴蓉环保科技股份有限公司

合同签订日期：　2023 年 6 月 29 日

合同签订地点：成都市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》、《国家危险废物名录（2021 修订）》及相关标准和技术规范，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经充分沟通、友好协商，就甲方生产经营活动产生的危险废物委托乙方实施处置服务事宜，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条　名词和术语

本合同（含所有合同附件）涉及的名词和术语解释如下：

危险废物或危废：是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

处置服务：乙方对甲方产生的危废进行取样，利用气质联用仪/原子吸收/原子荧光/荧光光谱分析仪等仪器对危废样品中有毒、有害物质作出定性/定量的检测分析，依据检测分析结果制定科学处置方案，根据方案采用焚烧、物化、稳定化后安全填埋或资源化利用等处置方式，实现危险废物的专业化、减量化、无害化和资源化处置的全过程服务。

第二条 服务内容及费用

乙方为甲方提供包括但不限于以下服务，甲方可根据需要进行勾选，本合同暂定总金额为_1000 元，具体费用按附件 1 的相应价格执行。

(一）危废处置服务：乙方提供危废处置服务，最终按照实际转运数量及单价进行结算。

☒（二）危废运输服务：乙方提供运输服务，将委托第三方具有危险废物运输资质的运输单位进行运输。

☒（三）危废包装服务：乙方提供危险废物的包装物或包装容器。

☒（四）废物分拣服务：乙方为甲方提供专业技术人员参与现场分拣危险废物的技术服务。

☒（五）危废分析检测服务：转运前，乙方派专人前往甲方对甲方所产危废进行分析检测。

☒（六）危废咨询服务：在合同执行期内，乙方为甲方提供危废管理相关咨询服务。

☒（七）其他：除上述服务以外，乙方也可以提供例如装车、清理等劳务服务或其他事宜，

并收取相应费用。

第三条　合同期限及服务进度

本合同有效期 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日止，服务按乙方生产进度进行。

第四条 付款和结算

（一）结算方式

单价结算：按单次实际转运的危险废物种类、重量（含包装重量）及对应的处置费单价（详见附件 1）的乘积的总和计算，其他费用按附件 1 相应价格结算。种类、重量按照经双方确认的危险废物转移联单记载的为准（若为电子联单，则以双方确认的四川省固体废物环境管理信息系统办结的电子联单重量为准）。

（二）结算周期以及发票开具时间：

1.预付款：合同签订前，甲方已向乙方支付预付款 1000 元(可用于抵扣不超过 0.2 吨的危废处置费)，乙方在收取预付款后 20 个工作日内双方未签署合同的，将预付款返还甲方（无息）。

2.合同有效期限内，若甲方未发生危险废物转运处置的，预付款不予退还；

3.合同有效期限内，甲方发生了危险废物转运处置的，预付款仅能抵扣处置费，合同到期后预付款尚有结余的不予退还。若实际转运的处置费超过预付款金额的，甲方应补足剩余费用。

4.☒按季度结算，则在完成当季度危废转运后，甲乙双方对本次结算周期的处置费及其他费用进行对账，费用确认无误后 / 个工作日内，乙方必须完成发票开具并送至甲方。甲方自收到乙方的合格发票后 / 个工作日内以银行转账形式向乙方支付费用。

☒按月结算，则在完成当月危废转运后，甲乙双方对本次结算周期的处置费及其他费用进行对账，费用确认无误后 / 个工作日内，乙方必须完成发票开具并送至甲方。甲方自收到乙方的合格发票后 / 个工作日内以银行转账形式向乙方支付费用。

☑按次结算，则在完成当次危废转运后，甲乙双方对本次结算周期的处置费及其他费用进行对账，费用确认无误后 10 个工作日内，乙方必须完成发票开具并送至甲方。甲方自收到乙方的合格发票后 7 个工作日内以银行转账形式向乙方支付费用。

5.乙方收取预付款后向甲方开收据，每次转运完成后按实际处置量开具处置费发票，若合同期内预付款未抵扣完，剩余部分开具技术服务费发票。乙方将根据甲方实际支付的费用及类别（如处置费、运输费、包装费、分拣服务费、劳务费、咨询费、服务费等）分别开具相应金额及税率的符合国家税法规定增值税合格发票。

第五条 危险废物转运

（一）甲方提出转运需求后，乙方根据当时的处置能力和库存情况，由乙方来判定是否转运，并安排具体转运时间。本条中所述的风险指：转运过程中产生的环保、安全等民事、行政、刑事责任风险。

☑危废运输由甲方（含委托具有危险废物运输资质的第三方）自行负责。

1. 甲方自行运输危废的，须服从乙方的计划；甲方须提前__1__个工作日提出转运申请，通知乙方拟转运的危废类别、数量；乙方接到甲方通知后__1__个工作日内，根据乙方生产安排，做出合理的接收安排。

2. 发生转运前甲方应提供的技术资料：需转运危险废物的基本信息（包括危险废物的成分、物理形态、包装物情况、预计转运数量、必要的安全预防措施等）；与运输单位的合作协议或委托等，运输车辆的相关证照（行驶证、危险废物道路运输许可证等）及司机、押运员信息。

3. 甲方自行负责运输，运输车辆应服从乙方的安排，有序、安全、环保的进入乙方厂区，到成都市龙泉驿区万兴乡鲤鱼村乙方生产区大门之前的风险、以及车辆暂停乙方厂区运载危险废物卸载之前的环保、安全和其他责任风险由甲方承担，危废到场经乙方确认之后的风险由乙方承担，但因甲方包装不当、掺杂合同范围或联单记载外的危险废物以及运输或押运人员操作不当等原因导致产生的事故责任由甲方承担。

□危废运输由乙方（含委托具有危险废物运输资质的第三方）承担。

1. 根据乙方生产计划安排，对甲方危险废物进行及时转运。

2. 危废运输由乙方承担的，危废离开甲方厂界（主物流出口大门）前的环保、安全和其他责任风险，由甲方自行承担；危废离开甲方厂界后，风险转移至乙方承担。甲方有多处危废暂存点的，以最后一处暂存点所在厂界作为甲乙双方风险转移的分界点。但因甲方包装不当、掺杂合同范围或联单记载外的危险废物等原因导致乙方运输过程中产生的事故责任由甲方承担。

（二）联单报送及返还

甲方必须向乙方提供内容真实、准确、完整的《危险废物转移联单》。若为纸质联单，则第一联由甲方留存，第二联由甲方转交移出地环保部门，第三联由运输单位留存，第四联由乙方留存，第五联由乙方转交移入地环保部门；若甲方属地环保局规定必须执行电子联单的，从其规定。若合同有效期内，国家、省、市等行政主管部门颁布实施联单管理办法新规定的，按新规定执行。

第六条　甲方责任

为保证乙方安全有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

（一）提供技术资料

有关危险废物的基本信息（包括危险废物的成分、物理形态、包装物情况、预计委托转移数量、必要的安全预防措施等）。

（二）提供工作条件

1. 甲方负责对乙方进入甲方厂区人员进行甲方各项规定的培训、交底工作。

2. 甲方负责将废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录（2021

修订）》等相关现行的法律规定及本合同附件的要求进行安全分类和包装，不得将不同性质、不同危险类别的废物混放，应满足安全转移和安全处置的条件；直接包装物明显位置标注废物名称和主要成分；在收集和临时存放过程中，甲方需将同类形态、同类物质、同类危险成分的废物进行统一存放，不得与其它物品进行混放，并详细标注废物特性与危险禁忌。对于化学品须提供明细清单，对可能具有爆炸性和剧毒性等高危特殊废物，甲方有责任在运输前告知乙方废物的具体情况，并按附件包装要求进行包装、标识，确保运输和处置的安全。

3. 委托专人负责危险废物转移的交接工作：转移联单的申请、协调废物的装载工作；乙方承担危废装卸任务时，对人力无法装载的包装件，甲方应协助提供叉车等装备或工具，确保装载过程中不发生环境污染。

4. 在危险废物转移前，甲方必须持有有效的危险废物转移联单手续。

5. 甲方有责任严格遵守国家针对易制毒类化学品、剧毒化学品、爆炸性物品等高危废物（包括但不限于 2016 修订版剧毒化学品目录中涉及到的物品）的交接、运输、处置等相关法律、法规的规定。

第七条　乙方责任

（一）乙方保证按照国家、四川省危险废物处置法规、技术规范要求合法合规地处置危险废物。

（二）乙方保证其拥有的危险废物处理资质在合同履行期内合法有效。

（三）乙方保证按照危险废物运输的要求选择有相应资质的运输单位进行运输，在转移过程中严格按国家有关危险废物运输的规范和要求，采取防散落、防流失、防渗漏等防止污染环境和危及运输安全的措施，确保规范收集，安全转移处置。

第八条　违约责任

（一）合同双方中任何一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方继续履约，并承担相应违约责任。若造成守约方经济损失，守约方有权向违约方索赔。

（二）甲方因违反本合同第六条约定，未如实告知乙方真实信息或欺瞒乙方的，由此在乙方运输和处置废物过程中造成安全、环保事故的，甲方应承担相应的安全、环保法律责任和乙方的经济损失。

（三）甲方不得在委托乙方接收的危险废物中夹带本合同及转运联单约定范围外的其他危险废物，若发现不相符的，乙方拒绝收运，已收运的退还甲方，并将情况如实反映给甲方，甲方必须在接到乙方通知后 24 小时内响应。甲方还应承担相应产生的运输装卸费等所有损失和运输过程中的安全、环保责任，若乙方在处置过程中发现不符的，甲方应承担乙方在运输和处置过程中引起的安全、环保事故，造成环境污染或至乙方及第三方财产损失和人员人身损害的，甲方承担全部责任。

（四）乙方按照本合同接收危险废物后，但因甲方未按照合同约定进行分类、包装、保管报、转移危险废物或未按照本合同约定履行相应义务，致使乙方在履行本合同过程中遭受行政部门处罚的，乙方有权向甲方追偿因此遭受的损失，上述损失包括但不限于乙方因此支付罚款、乙方业绩及声誉造成的负面影响。

（五）甲方未按时支付合同费用，每逾期一日按应付费用的0.1%支付逾期付款违约金，且方有权停止收处甲方危废，直至甲方付款为止，并应承担乙方追偿款项所产生的一切费用（包括不限于案件受理、财产保全、强制执行、律师代理等费用），非因甲方原因造成的延期付款除外

（六）乙方未按照国家、四川省危险服务处置法规、技术规范要求合法合规地处置危险废物因此给甲方造成损失的，应赔偿由此给甲方造成的直接损失。

第九条　保密及知识产权归属

（一）合同协商、订立、履行期间，双方对所获得的对方任何资料、信息数据等文件均负有保密义务。未经对方书面同意，另一方不得向任何第三人披露。

（二）保密期限：长期。

（三）涉密人员范围：双方参与或知晓本合同内容及履行情况人员。

（四）泄密责任：违约方承担守约方相应经济损失及相关费用，守约方经济损失和相关费用难以确定的，违约方按照本合同总金额的30%承担责任。

（五）本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归乙方所有。

第十条　联络、通知和送达条款

（一）甲、乙双方任一方向对方发出的通知、以及双方就本合同所涉事项进行的沟通、协商、变更、补充均应以书面形式发出，采用直接送达或电子送达或邮寄送达的方式送达对方。采用直接送达方式的，一方将书面文件送达至另一方下列地址并交由指定人员或交由该方前台人员，视为已送达。指定人员或前台人员应在送达回执上签字确认。采用电子送达方式的，一方应将书面文件发送至另一方下列电子邮箱或qq或微信号，邮件发出日视为送达日。采用邮寄送达方式的，一方应将书面文件寄送至另一方下列地址及联系人，邮件寄出之日起第四日视为送达日。任何一方变更上述地址、接收人、电子邮箱或qq或微信号的，应当及时通知另一方，在另一方未接收到变更通知前，直接交由或寄送或发送电子邮件至原联系人、原地址、原邮箱或qq或微信号的，视为送达。一方依据合同约定行使解除权的，自解除通知送达对方之日合同解除。

（二）直接送达、邮寄送达、电子送达地址和联系人详见合同签字盖章处。

第十一条　其他

（一）本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（二）本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签名（或盖章），在合同签订后并加盖双方公章（或合同专用章）之日起生效。

（三）本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同附件与合同正文具有同等效力。

（四）本合同内容的变更须经双方协商并签订书面补充协议。非双方法定代表人或委托人签名（或盖章）并加盖双方公章（或合同专用章），对本合同的任何改动，修订，增加或删减均属于无效。

（五）本合同执行期间，如遇不可抗力因素（如战争、地震、洪灾、强降雨、地质灾害、职能部门政策变更、政府管辖等），致使合同无法履行时，甲乙双方均不承担违约责任，并按有关法规政策及时协商处理。

（六）本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；若双方协商未达成一致，向原告所在地人民法院提起诉讼。

□第十二条：补充约定（若补充约定与前文不一致的，以补充约定为准）

_____/_____。

附件： 1、危险废物处置价格表

2、危险废物包装技术要求

3、危险废物收集、贮存、处置安全环保告知书

4、廉政协议书

□5、其他___

（以下无正文）

甲方：简阳市同合乡唐中顺家庭农场

（公章或合同专用章）

乙方：成都兴蓉环保科技股份有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人

或委托代理人：

法定代表人

或委托代理人：

开票地址：简阳市同合乡干石山村 10 组
营业执照注册地址：简阳市同合乡干石山村 10 组
现在生产经营地址：简阳市同合乡干石山村 10 组
税　　号：92510185MA6CQNE96T

开户银行：农行简阳三星分理处

银行账号：22740801040001717

联系人：付贤清

开票电话（座机）：
联系人（手机）：15984650327

邮箱：
QQ：
微信号：

地址：成都市锦江区东较场街 57 号

税　　号：915101005972729l3C

开户银行：工商银行成都东大支行

银行账号：4402298019000067792

联系人：蒋志冬

联系电话（座机）：028-86283905

（手机）：　13350883100

邮箱：769326382

QQ:769326382

微信号：13350883100

附件 1 危险废物处置价格表

一、处置费

序号	危险废物类别	废物代码	危险废物名称	预计年产废量（吨）	预判处置方式	处置单价（元/吨）	预计处置费（元）	备注
1	HW08	900-214-08	废矿物油（废油油水）	0.07	焚烧	2500	175	
2	HW08	900-249-08	废矿物油（废油桶）	0.02	焚烧	2500	50	
3	HW49	900-041-49	其他废物（含油棉纱、抹布、手套、包装物、危废沾染物等）	0.01	焚烧	2500	25	
合计							250	

备注：1、以上年产废量为预估量，具体数量以实际转运数量为准。

2、附件 1 中的报价均为含税价，税率为国家规定的当期税率。若遇国家税率调整，不含税价不变，含税价按调整后的税率重新计算。

3、最终处置方式以入场鉴定为准。

☒4、以上综合处置单价包含●运输费●包装费●分拣服务费 ●分析检测服务费 ●咨询服务费 ●其他费用：__/__。

二、运输费（含 9%增值税）

☒1、按车型载重量（t）车次计费：

①选用 t≤5 吨的货车，运费为：__/__ 元/车.次；

②选用 5<t≤10 吨的货车，运费为：__/__元/车.次；

③选用 10<t≤20 吨的货车，运费为：__/__ 元/车.次；

④选用 t>20 吨的货车，运费为：__/__元/车.次。

☒2、按重量计费，重货__/__元/吨，非重货__/__元/吨，最终以转移联单记载的重量进行结算。

☒3、顿时费：因甲方原因造成车辆无法当天发车产生的车辆停滞费用。__/__元/天。

☒4、放空费：因甲方原因，造成乙方派出车辆到达甲方取货地点后无法转运产生的费用。_____元/车次。

5、其他：如果甲方需要乙方单独配送包装容器的，按相应载重车型计费。

☒三、包装费（含 6%增值税）

吨袋：__/__元/根、吨桶：__/__元/个、200L 桶：__/__元/个、塑料桶：__/__元/个 。

☒四、分拣服务费（含 6%增值税）

__/__元/人/日。

●五、危废分析检测服务费 （含 6%增值税）__/__元/次

●六、危废咨询服务费 （含 6%增值税）__/__元/年

☒七、其他费用：__/__

附件 2

危险废物包装技术要求

（一）禁止不相容危废在同一容器混装。

（二）盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容。

（三）盛装危险废物的容器必须标识，且符合规范。

（四）容器、包装必须完好无损，密封严密。

（五）容器和材质符合强度标准。

（六）标识准确、规范。

（七）危废贮存不漏不洒。

（八） 装载液体和半固体的危险废物采用未破损的密封桶包装，包装桶的材质为钢、铁和高密度塑料，选用的包装容器不能与所装的危险废物发生化学反应。所装载的容器须留足够空间，容器顶部与液体表面留 10cm 以上的空间。

（九） 对于一般性、化学性质相对稳定的固体、半固体（含水率低，即不产生明显滴漏）的危险废物可采用中度强度以上的不破损的塑料编制袋进行包装。装袋完毕，封口严实。

（十）电镀污泥应按电镀种类用塑料编织袋分类进行包装。

（十一）含重金属元素的实验室废液、不同工艺产生的实验室废液、有机相和无机相废液等必须分开收集包装并标识，特别是含汞、铅、铬、砷的废液必须分类收集和包装并标识；有机相中包含汞、铅、铬、砷等重金属元素的，需要特别说明。对于高腐蚀性的危险废物必须选用耐腐蚀性强的包装材质，口盖必须密封严密。

（十二）对于易燃易爆的危险废物必须选用气密性、抗爆性能良好的包装材质。

附件 3

危险废物收集、贮存、处置安全环保告知书

尊敬的客户：

您好！

首先感谢您将危险废物交由我公司进行环保无害化处置，感谢您支持与信任。为保证废物在收集、运输、贮存、处置过程中的安全，请您认真阅读以下安全提示。恳请您能够配合我公司落实废物分类收集和临时贮存的相关安全工作，以此确保收集、运输、处置过程中人员和设备的安全。具体安全环保内容告知如下：

1、在收集、贮存废物过程中，杜绝将具有自燃性、爆炸性、放射性、剧毒品、特殊高危物品、不明物等混入待转运的普通危险废物当中。

2、在收集、贮存废物过程中需在包装物明显位置注明废物名称和安全禁忌，杜绝与其它废物随意混存。酸碱要杜绝堆放在一起。有机溶剂等易燃物远离明火、高温以及强氧化性物质和活泼金属。

3、在车间和实验室收集危险废物时，请根据物理形态、主要成分、危险特性等进行分类收集和贮存。杜绝同一个包装物内混合收集不同形态、不同成分、不同特性的废物，杜绝生产、实验等现场人员随意将各种废物混乱放入同一个包装物内，杜绝贮存时各种危险废物混乱摆放。废物贮存时建议每批每种废物有明确标识，说明该种废物主要成分、产生来源，以便后续装车运输转移。

4、在科研院所及学校实验室实验过程中产生混合废液时，收集过程中应如实确认废液主要成分，并在包装物明显位置注明该主要成分和安全禁忌，以及重要安全提示。杜绝废液收集后无标识、无信息、无法直观确认废液的主要成分和危险特性。化学试剂原有标签应尽量保存完好，或重新张贴标签说明化学名称；如为废瓶盛装其他废化学试剂或者实验废液，请张贴新标签并说明主要成分。

5、在收集瓶装废化学试剂和空瓶时，确保试剂瓶体有试剂名称标签，确保同一性质的试剂放入同一包装箱内，试剂和空瓶均采用纸箱和木箱收集，在收集装箱过程中做到正置码放，确保瓶体完好，瓶口有盖。杜绝有机物和无机物的混放，杜绝酸碱混放，杜绝可能发生剧烈反应的物资混放。杜绝将试剂瓶倾倒无序摆放，杜绝试剂空瓶采用编织袋和空桶无序收集存放。

6、在收集废油水、废乳化液、废酸液、废碱液等废液类废物时，须注明废液的主要成分和安全禁忌，同时杜绝不相容的废液混合，确保选择相适应的完好包装物。

7、在电镀、涂装、水处理等生产过程中产生的漆渣、污泥、残渣等固态、半固态废物中不得混入其它废物，确保物质的单一性；杜绝将手套、棉丝等垃圾、螺丝螺母、铁丝、塑料块、

木块、石块、混凝土等坚硬杂物混入待运输处置的废物当中。

8、在收集废胶、树脂、油墨等粘稠状危险废物废料时，确保物质的单一性和稳定性，尽量避免上述废物凝固在铁桶或塑料桶等包装物内形成不易分割的大块。杜绝将手套、棉丝等沾品垃圾、铁块、塑料块、木块、石块、混凝土等坚硬杂物混入待运输处置的废物。

9、在实验和生产过程中产生的沾染废溶剂、废油、废漆、废墨等有机废物垃圾时，杜绝混入易燃、易爆、有毒、有害危险品；杜绝将铁块、塑料块、木块、石块、混凝土等坚硬杂物混入有机溶剂废物中。

10、在通知我公司转运废物前，需落实本次转运废物的种类、数量、安全包装情况等；按种类和数量申请有效的危险废物转移联单并加盖公章，确保转运工作正常进行。

为了我们大家的人身安全，为了危险废物的无害化安全处置，请您认真阅读该安全环保告知书内容，并严格进行落实。

附件 4：

廉政协议书

甲方：【简阳市同合乡唐中顺家庭农场】

乙方：成都兴蓉环保科技股份有限公司

为了防止公司经营过程中发生不廉洁等违纪违法行为，促进公司的党风廉政建设，根据国家和省、市有关廉政建设的各项规定，订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守法律、法规以及国家和四川省、成都市关于党风廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到：

（一）甲方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向乙方工作人员（含子女等近亲属，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）甲方工作人员不得为谋取私利擅自与乙方工作人员就危险废物无害化处置合同数量、合同价款、合同支付等进行私下商谈或者达成默契。

（三）甲方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请乙方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）甲方不得为乙方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

三、乙方及其工作人员应做到：

（一）乙方及其工作人员（含子女等近亲属，下同）不得以任何形式向甲方及其工作人员索要赞助和收受回扣等好处费。

（二）乙方工作人员应当保持与甲方的正常业务交往，不得接受甲方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向甲方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在甲方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）乙方工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（四）乙方工作人员不得向甲方介绍家属或亲友从事与乙方经营有关危险废物无害化处置、材料设备供应、工程分包等经济活动。

四、甲方如发现乙方及其工作人员有违反上述协议者，应当向乙方相关部门或者乙方上级单位举报，乙方不得对甲方进行报复或刁难。

五、乙方发现甲方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂乙方工作人员，乙方应向甲方上级

领导或有关部门举报，如被司法机关立案查处的，乙方有权将甲方列入客户“黑名单”，有权拒绝接收处置甲方任何危险废物。

六、本协议为双方业务合同附件，生效日期、合同期限等与业务合同保持一致，若双方业务合同因故需要变更期限时，本协议也随之变更。

七、本协议份数与双方业务合同一致，由双方加盖公章或合同专用章后生效，双方业务合同履行完成后失效。

甲方：【简阳市同合乡唐中顺家庭农场】

（公章或合同专用章）

乙方：成都兴蓉环保科技股份有限公司

（公章或合同专用章）

统一社会信用代码

91510100597272913C

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　成都兴蓉环保科技股份有限公司

类　　型　其他股份有限公司(非上市)

法定代表人　于扬文

经营范围　许可项目：危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；再生资源销售；工程管理服务；洗车服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；国内货物运输代理；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑砌块销售；废旧沥青再生技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本　贰亿元整

成立日期　2012年06月06日

营业期限　2012年06月06日 至 长期

住　　所　四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街998号19栋、21栋

本复印件仅供　使用
有效复印无效，经办人
年　月　日

登记机关

2021 年 2 月 25 日

ZHB

危险废物经营许可证

法人名称：成都兴蓉环保科技股份有限公司

法定代表人：于物文

经营设施地址：第一、二部分：[illegible]社区2组[illegible]30° 38′ 31″ [illegible]第三部分：成都市龙泉驿区[illegible]组66号 东经104° 22′ 52″ 北纬30° 39′ 22″

核准经营方式：收集、贮存、利用、处置

核准经营危险废物类别：

第一、二、三部分：

[illegible]变更部件仅供[illegible]客户核对使用
[illegible]
[illegible]
[illegible]

成都兴蓉环保科技股份有限公司
危险废物废物类别及代码

（第一部分）

表 1-1　焚烧处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	10000 吨/年	全代码
2	HW03	废药物、药品		全代码
3	HW04	农药废物		全代码
4	HW06	废有机溶剂与含有机溶剂废物		全代码
5	HW07	热处理含氰废物		全代码
6	HW08	废矿物油与含矿物油废物		全代码
7	HW09	油/水、烃/水混合物或乳化液		全代码
8	HW11	精（蒸）馏残渣		251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11、252-017-11、309-001-11
9	HW12	染料、涂料废物		全代码
10	HW13	有机树脂类废物		全代码
11	HW16	感光材料废物		全代码
12	HW17	表面处理废物		336-064-17（仅限金属或塑料表面除油产生的污泥）、336-067-17
13	HW18	焚烧处置残渣		772-005-18
14	HW23	含锌废物		336-103-23
15	HW29	含汞废物		261-053-29、265-001-29、265-002-29、387-001-29
16	HW33	无机氰化物废物		全代码
17	HW37	有机磷化合物废物		全代码
18	HW39	含酚废物		全代码
19	HW49	其他废物		309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49、900-053-49
20	HW50	废催化剂		全代码

表 1-2　物化处理危废类别

四川省生态环境厅　印制

（第二部分）

表 2-1　焚烧处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	30000 吨/年	全代码
2	HW03	废药物、物品		全代码
3	HW04	农药废物		全代码
4	HW05	木材防腐剂废物		201-001-05、201-002-05、266-003-05、900-037-05
5	HW06	废有机溶剂与含有机溶剂废物		900-401-06、900-402-06、900-404-06
6	HW08	废矿物油与含矿物油废物		071-001-08、251-001-08
7	HW11	精（蒸）馏残渣		252-011-11、451-002-11
8	HW12	染料、涂料废物		264-009-12、264-010-12、900-252-12
9	HW16	感光材料废物		266-009-16
10	HW17	表面处理废物		336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17
11	HW18	焚烧处置残渣		772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、772-006-18
12	HW19	含硫废物		261-138-21、336-100-21
13	HW20	含铅废物		304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22
14	HW21	含铬废物		306-001-23、900-021-23
15	HW22	含铜废物		398-052-31、900-052-31
16	HW23	含锌废物		336-104-33、900-029-33
17	HW24	含砷废物		231-007-29、265-003-29、321-103-29
18	HW29	含汞废物		900-042-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49
19	HW31	含铅废物		243-001-31、384-001-31、900-052-31
20	HW33	无机氰化物废物		091-001-33、091-002-33、336-105-33、900-027-33
21	HW34	废酸		251-014-34、251-015-34、261-057-34、261-058-34、261-059-34、900-300-34、900-349-34
22	HW35	废碱		251-015-35、261-059-35
23	HW36	石棉废物		全代码
24	HW37	有机磷化合物废物		261-063-37
25	HW39	含酚废物		261-071-39
26	HW46	含镍废物		全代码
27	HW47	含钡废物		全代码
28	HW48	有色金属采选和冶炼废物		091-001-48、091-002-48、321-003-48、321-004-48、321-006-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-012-48、321-013-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-023-48、321-025-48、321-026-48、321-028-48、321-029-48、321-032-48、323-001-48
29	HW49	其他废物		309-001-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、772-006-49、900-053-49
30	HW50	废催化剂		全代码

表 1-3　填埋处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	15000 吨/年	272-003-02、273-001-02
2	HW03	废药物、药品		全代码
3	HW04	农药废物		263-006-04、263-007-04、263-010-04
4	HW05	木材防腐剂废物	7600 吨/年	201-001-05、201-002-05、266-003-05、900-037-05
5	HW06	废有机溶剂与含有机废物		900-401-06、900-402-06、900-404-06
6	HW08	废矿物油与含矿物油废物		071-001-08、251-001-08
7	HW11	精（蒸）馏残渣		252-011-11、451-002-11
8	HW12	染料、涂料废物		264-009-12、264-010-12、900-252-12
9	HW16	感光材料废物		266-009-16
10	HW17	表面处理废物		336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17
11	HW18	焚烧处置残渣		772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、772-006-18
12	HW19	含硫废物		261-138-21、336-100-21
13	HW20	含铅废物		304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22
14	HW21	含铬废物		306-001-23、900-021-23
15	HW22	含铜废物		398-052-31、900-052-31
16	HW23	含锌废物		336-104-33、900-029-33
17	HW24	含砷废物		231-007-29、265-003-29、321-103-29
18	HW29	含汞废物		900-042-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49
19	HW31	含铅废物		243-001-31、384-001-31、900-052-31
20	HW33	无机氰化物废物		091-001-33、091-002-33、336-105-33、900-027-33
21	HW34	废酸		251-014-34、251-015-34、261-057-34、261-058-34、261-059-34、900-300-34、900-349-34
22	HW35	废碱		251-015-35、261-059-35
23	HW36	石棉废物		全代码
24	HW37	有机磷化合物废物		261-063-37
25	HW39	含酚废物		261-071-39
26	HW46	含镍废物		全代码
27	HW47	含钡废物		全代码
28	HW48	有色金属采选和冶炼废物		091-001-48、091-002-48、321-003-48、321-004-48、321-006-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-012-48、321-013-48、321-016-48、321-017-48、321-019-48、321-020-48、321-022-48、321-023-48、321-025-48、321-026-48、321-028-48、321-029-48、321-032-48、323-001-48
29	HW49	其他废物		309-001-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、772-006-49、900-053-49
30	HW50	废催化剂		全代码

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
22	HW35	废碱		251-015-35、261-059-35、900-399-35
23	HW36	石棉废物		全代码
24	HW37	有机磷化合物废物		261-063-37
25	HW39	含酚废物		261-071-39
26	HW46	含镍废物		全代码
27	HW47	含钡废物		全代码
28	HW48	有色金属采选和冶炼废物		091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、323-001-48、321-034-48
29	HW49	其他废物		309-001-49、900-042-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、772-006-49、900-053-49
30	HW50	废催化剂		全代码

（第二部分）

表 2-1　焚烧处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	30000 吨/年	全代码
2	HW03	废药物、物品		全代码
3	HW04	农药废物		全代码
4	HW05	木材防腐剂废物		201-001-05、201-002-05、266-001-05、266-003-05、900-004-05
5	HW06	废有机溶剂与含有		全代码

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
		机溶剂废物		
6	HW07	热处理含氰废物		全代码
7	HW08	废矿物油与含矿物油废物		全代码
8	HW09	油/水、烃/水混合物或乳化液		全代码
9	HW11	精（蒸）馏残渣		251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
				261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11
10	HW12	染料、涂料废物		全代码
11	HW13	有机树脂类废物		全代码
12	HW14	新化学物质废物		全代码
13	HW16	感光材料废物		全代码
14	HW18	焚烧残渣		772-005-18
15	HW33	无机氰化物废物		全代码
16	HW37	有机磷化合物废物		全代码
17	HW38	有机氰化物废物		全代码
18	HW39	含酚废物		全代码
19	HW40	含醚废物		全代码
20	HW45	含有机卤化物废物		全代码
21	HW49	其它危险废物		900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49
22	HW50	废催化剂		251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-049-50

表 2-2　物化处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW06	废有机溶剂与含有机溶剂废物	10500 吨/年	900-401-06、900-402-06、900-404-06、
2	HW08	废矿物油与含矿物油废物		251-001-08、251-005-08、900-204-08
3	HW09	油/水、烃/水混合物或乳化液		全代码
4	HW12	染料、涂料废物料		264-009-12、264-010-12
5	HW45	含有机卤化物废物		261-078-45、261-080-45、261-084-45、
6	HW49	其他废物		900-042-49、900-047-49、900-999-49

表 2-3　填埋处理危废类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	20000 吨/年	271-001-02、271-005-02、272-003-02、275-001-02、275-003-02、275-005-02
2	HW04	农药废物		263-006-04、263-010-04、263-011-04
3	HW06	废有机溶剂与含有机溶剂废物		900-405-06、900-409-06
4	HW07	热处理含氰废物		336-002-07
5	HW08	废矿物油与含矿物油废物		251-003-08、251-012-08、900-210-08、900-213-08
6	HW11	精（蒸）馏残渣		252-010-11、451-002-11
7	HW12	染料、涂料废物		264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-012-12、900-255-12
8	HW13	有机树脂类废物		265-104-13
9	HW16	感光材料废物		266-010-16
10	HW17	表面处理废物		全代码
11	HW18	焚烧处置残渣		772-002-18、772-003-18、772-004-18
12	HW20	含铜废物		
13	HW21	含铬废物		193-001-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、

四川省生态环境厅　印制

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW02	医药废物	50000吨/年	全代码
2	HW03	废药物、药品		全代码
3	HW04	农药废物		263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04
4	HW05	木材防腐剂废物		全代码
5	HW06	废有机溶剂与含有机溶剂废物		900-405-06、900-407-06、900-409-06
6	HW07	热处理含氰废物		336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-049-07
7	HW08	废矿物油与含矿物油废物		071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-003-08、251-006-08、251-012-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08
8	HW11	精（蒸）馏残渣		252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-012-11、451-001-11、451-002-11、261-007-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-033-11、309-001-11、900-013-11
9	HW12	染料、涂料废物		264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-011-12、264-012-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12
10	HW13	有机树脂类废物		265-101-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-451-13
11	HW14	新化学物质废物		全代码
12	HW16	感光材料废物		全代码
13	HW17	表面处理废物		全代码
14	HW18	焚烧残渣		全代码
15	HW20	含铍废物		全代码
16	HW21	含铬废物		193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21
17	HW22	含铜废物		304-001-22、398-005-22、398-051-22
18	HW23	含锌废物		全代码
19	HW24	含砷废物		全代码
20	HW25	含硒废物		全代码
21	HW26	含镉废物		全代码
22	HW27	含锑废物		全代码
23	HW28	含碲废物		全代码
24	HW29	含汞废物		072-002-29、091-003-29、331-002-29、231-007-29、261-052-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、321-000-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-452-29
25	HW30	含铊废物		全代码
26	HW31	含铅废物		304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31
27	HW33	无机氰化物废物		092-003-33
28	HW34	废酸		900-349-34
29	HW35	废碱		251-015-35、261-059-35、900-399-35
30	HW36	石棉废物		全代码
31	HW37	有机磷化合物废物		261-061-37、261-062-37、261-063-37
32	HW38	有机氰化物废物		261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38

四川省生态环境厅 印制

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
				314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21
14	HW22	含铜废物		304-001-22、398-005-22、398-051-22
15	HW23	含锌废物		全代码
16	HW24	含砷废物		全代码
17	HW25	含硒废物		全代码
18	HW26	含镉废物		全代码
19	HW27	含锑废物		全代码
20	HW28	含碲废物		全代码
21	HW29	含汞废物		072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-024-29（仅限废氧化汞电池和废汞开关）、900-452-29
22	HW31	含铅废物		304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31
23	HW33	无机氰化物废物		092-003-33
24	HW34	废酸		251-014-34、900-349-34
25	HW35	废碱		261-059-35、900-399-35
26	HW36	石棉废物		全代码
27	HW37	有机磷化合物废物		261-063-37
28	HW39	含酚废物		261-071-39
29	HW46	含镍废物		384-005-46、900-037-46
30	HW47	含钡废物		全代码
31	HW48	有色金属采选和冶炼废物		091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、323-001-48
32	HW49	其他废物		900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49
33	HW50	废催化剂		251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50

表 2-4　废包装物利用类别

序号	类别	危废名称	接收处置量	废物代码
1	HW49	废包装物	2500 吨/年	900-041-49

（第三部分）

表 3 刚性填埋处理危废类别

四川省生态环境厅　印制

序号	类别	危废名称	接收处置厂	废物代码
33	HW39	含酚废物		全代码
34	HW40	含醚废物		全代码
35	HW45	含有机卤化物废物		全代码
36	HW46	含镍废物		全代码
37	HW47	含钡废物		全代码
38	HW48	有色金属采选和冶炼废物		091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-031-48、321-032-48、
39	HW49	其他废物		900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-999-49
40	HW50	废催化剂		251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50

四川省生态环境厅 印制

STANDARD TEST 斯坦德检测

统一社会信用代码：	91510112MA61TCNC4B
项目编号：	CDSTDFXJCYXGS113-0001

202312050087

检　测　报　告

斯坦德（环）检（2022）第 12015 号

项目名称： 简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场废气、噪声检测

委托单位： 四川优千胜环境工程有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2022年12月30日

成都斯坦德分析检测有限公司

Chengdu STANDARD Analysis & Testing Co., Ltd.

检 测 报 告 说 明

1、检测报告无相关责任人签字及“检验检测专用章”无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改、删增无效。

3、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告，不得将本报告用于商业性宣传。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送样样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、除客户特殊声明并支付样品保管费外，所有超过规定时效期的样品均不再做留样保存。

6、如若对本报告有异议，请于收到报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

7、本公司保证检测的公正性、科学性，对所出具数据负责，并承诺保护客户机密信息和所有权。

8、报告未加盖“CMA”资质认定专用章，不具备法律效应，仅做参考使用。

机构通讯资料:

名　称：成都斯坦德分析检测有限公司

地　址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 B1 栋 1 号楼 601 号

邮　编：610100

电　话：028－84849613

1、检测内容

受四川优千胜环境工程有限公司委托，我公司于2022年12月19日至12月20日对简阳市同合乡唐中顺家庭农场废气、噪声进行现场采样及检测，并于2022年12月19日至2022年12月20日进行了检测分析，该项目位于简阳市三星镇干石山村10组（经度104.619536°，纬度30.600030°）。

2、检测项目

本次检测项目内容见表2-1。

表2-1 检测项目内容、频次及点位

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
无组织废气	厂界上风向K1	H_2S、NH_3、臭气浓度	检测2天，每天检测3次
	厂界下风向K2		
	厂界下风向K3		
	厂界下风向K4		
噪声	项目所在地厂界东侧1#	工业企业厂界环境噪声	检测2天，昼、夜各检测1次
	项目所在地厂界南侧2#		
	项目所在地厂界西侧3#		
	项目所在地厂界北侧4#		

3、检测分析方法及方法来源

本次检测项目分析方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-1~表3-2。

表3-1 无组织废气检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

项目	检测方法	方法来源	分析仪器及编号	检出限
氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	V723N可见分光光度计 STD-A30013-20	0.01 mg/m³
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）	V723N可见分光光度计 STD-A30013-20	0.001 mg/m³
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-93	/	/

表3-3 噪声检测方法、方法来源、使用仪器

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 环境噪声监测技术规范 噪声测量修正	GB 12348-2008 HJ 706-2014	AWA6228+声级计 STD-A10012-20 AWA6221A声校准器 STD-A10013-20

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1～表 4-2。

表 4-1 无组织废气检测结果

检测点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果			标准限值	结果判断
				1	2	3		
厂界上风向 K1	2022.12.19	氨	mg/m^3	0.13	0.12	0.14	1.5	达标
	2022.12.20			0.12	0.12	014		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			0.11	0.15	0.16		达标
	2022.12.20			0.12	0.13	0.14		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			0.14	0.15	0.16		达标
	2022.12.20			0.14	0.14	0.13		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			0.14	0.15	0.14		达标
	2022.12.20			0.12	0.15	0.13		达标
厂界上风向 K1	2022.12.19	硫化氢	mg/m^3	ND	ND	ND	0.06	达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			ND	ND	ND		达标
	2022.12.20			ND	ND	ND		达标
厂界上风向 K1	2022.12.19	臭气浓度	无量纲	11	11	13	70	达标
	2022.12.20			11	11	11		达标
厂界下风向 K2	2022.12.19			11	11	13		达标
	2022.12.20			13	11	13		达标
厂界下风向 K3	2022.12.19			13	13	13		达标
	2022.12.20			11	13	11		达标
厂界下风向 K4	2022.12.19			13	11	11		达标
	2022.12.20			12	11	13		达标

备注：

1、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）无组织排放二级（新扩改建）标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 标准限值；

2、实测浓度低于方法检出限，以“ND”表示；

（以下空白）

表 4-3 厂界噪声检测结果


检测点位	检测日期	检测项目	主要声源	检测结果（dB(A)）		标准限值（dB(A)）		结果判断	
				昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
项目所在地厂界东侧 1#	2022.12.19	工业企业厂界环境噪声	猪叫声	46	39	60	50	达标	达标
	2022.12.20			48	44			达标	达标
项目所在地厂界南侧 2#	2022.12.19			38	36			达标	达标
	2022.12.20			43	41			达标	达标
项目所在地厂界西侧 3#	2022.12.19			53	38			达标	达标
	2022.12.20			42	40			达标	达标
项目所在地厂界北侧 4#	2022.12.19			57	40			达标	达标
	2022.12.20			51	43			达标	达标

备注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值。

（以下空白）

5、检测点位示意图

测点示意图：

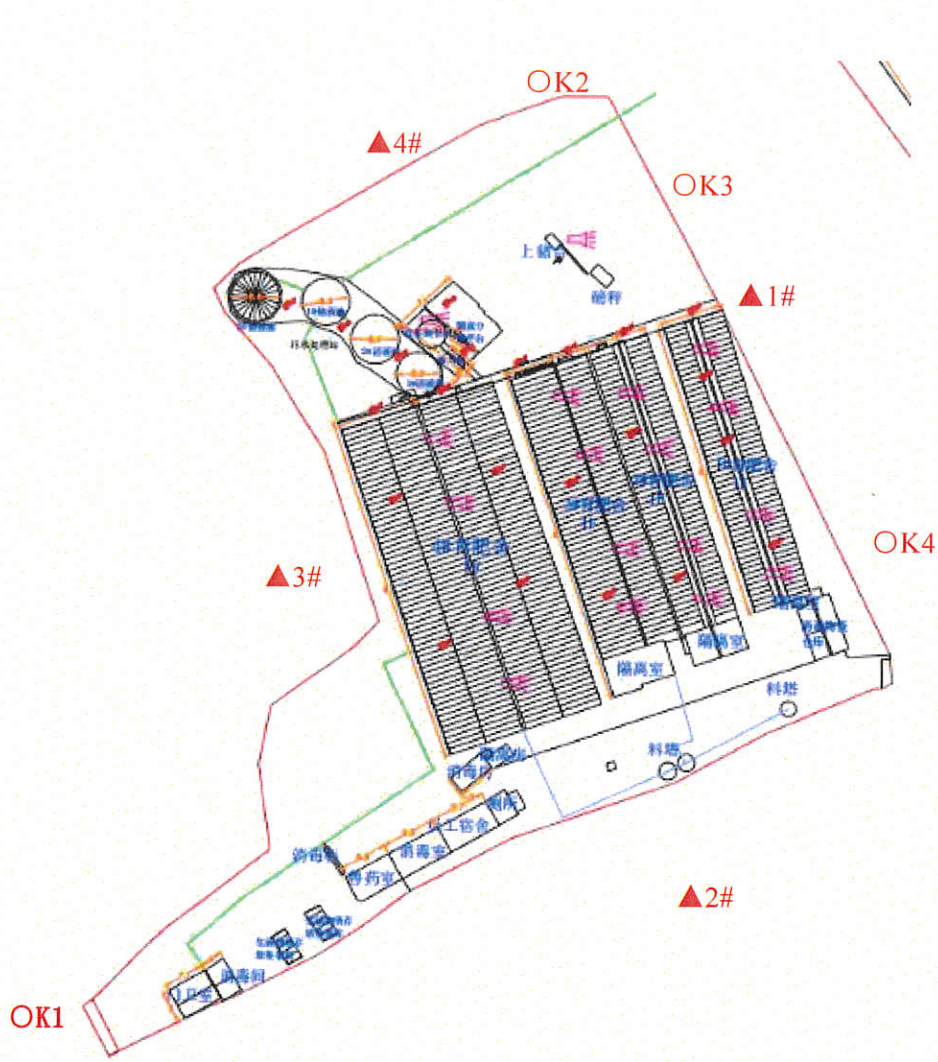

图中标识符：

无组织废气 ○ 噪声▲

报告编制：；审核：；签发：

日期：2022.12.5；日期：2022.12.30；日期：2022.12.30

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，占地面积12.3956亩。项目计划新建年存栏仔猪4000头，年出栏育肥猪8000头养殖场一处。新建各类猪舍6176m²，主要建设内容包括：（1）4栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建50m³沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	胡海罗	性别	男	年龄	60	职业	
	联系方式	18349920338	文化程度		身份证号	511027196312136352		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

工程概况	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	胡小金	性别	男	年龄	61	职业	
	联系方式	13684018297	文化程度		身份证号	511021196210076352		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况							
	姓名	陈素兰	性别	女	年龄	53	职业	
	联系方式	13440118964	文化程度		身份证号	511027197010286368		
	住址	四川省简阳市三星镇干石山村6组						

调查内容		
	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☑ 不利影响☐ 无影响☑
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	蒋俊英	性别	女	年龄	50	职业	
联系方式	13438222546	文化程度		身份证号	510271973102163 61		
住址	简阳市三星镇干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	詹勇	性别	男	年龄	24	职业	
联系方式	18208183036	文化程度		身份证号	513024199052263?3		
住址	简阳市干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，占地面积12.3956亩。项目计划新建年存栏仔猪4000头，年出栏育肥猪8000头养殖场一处。新建各类猪舍6176m²，主要建设内容包括：（1）4栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建50m³沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	蒋增容	性别	女	年龄	52	职业	
联系方式	13540786536	文化程度		身份证号	511027197103106485		
住址	简阳市干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	唐仕财	性别	男	年龄	34	职业	
	联系方式	15228350119	文化程度		身份证号	513821198803046351		
	住址	简阳市三星镇干石山村 6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般□ 较差□ 非常差□						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意□ 不满意□						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物□ 生态破坏□ 废水☑ 噪声□ 环境风险□						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响□ 不利影响□ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻□ 较重□						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治□ 废水污染防治☑ 固体废物处置□ 噪声污染防治□ 生态减缓措施□ 其它□						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意□ 不满意□						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）：							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	唐中元	性别	男	年龄	50	职业	
	联系方式	18708204809	文化程度		身份证号	511027197301216351		
	住址	简阳市平泉村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	詹中明	性别	男	年龄	54	职业	
联系方式	18780000261	文化程度	初中	身份证号	511027 1969 1121 6354		
住址	四川省成都市简阳市三星镇干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☑ 生态破坏☑ 废水☑ 噪声☑ 环境风险☑
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☐
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☑ 废水污染防治☑ 固体废物处置☑ 噪声污染防治☑ 生态减缓措施☑ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐

8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）：

无

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	袁中德	性别	男	年龄	57	职业	
联系方式	13289922048	文化程度		身份证号	511021196110066358		
住址	简阳市三星镇干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般□ 较差□ 非常差□
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意□ 不满意□
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物□ 生态破坏□ 废水☑ 噪声□ 环境风险□
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响□ 不利影响□ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻□ 较重□
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治□ 废水污染防治☑ 固体废物处置□ 噪声污染防治□ 生态减缓措施□ 其它□
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意□ 不满意□
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

工程概况	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	姚志兰	性别	女	年龄	48	职业	
	联系方式	15775185068	文化程度		身份证号	512821975101532 81		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？			良好☑ 一般□ 较差□ 非常差□			
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？			满意☑ 基本满意□ 不满意□			
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？			废气☑ 固体废物□ 生态破坏□ 废水☑ 噪声□ 环境风险□			
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？			有利影响□ 不利影响□ 无影响☑			
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。			无☑ 较轻□ 较重□			
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：			废气污染防治□ 废水污染防治☑ 固体废物处置□ 噪声污染防治□ 生态减缓措施□ 其它□			
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度			满意☑ 较满意□ 不满意□			
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无						

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇千石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	唐仕林	性别	男	年龄	27	职业	
联系方式	17608047660	文化程度		身份证号	513902199603046354		
住址	简阳市三星镇千石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

工程概况	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，占地面积12.3956亩。项目计划新建年存栏仔猪4000头，年出栏育肥猪8000头养殖场一处。新建各类猪舍6176m²，主要建设内容包括：（1）4栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建50m³沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	李晓英	性别	女	年龄	56	职业	
	联系方式	15982174221	文化程度		身份证号	511027196702216366		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况							
姓名	付贤清	性别	女	年龄	56	职业	
联系方式	15984650327	文化程度		身份证号	511027196706096461		
住址	简阳市平石山村6组						

调查内容	
1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☐ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）：	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况

姓名	唐琼	性别	女	年龄	35	职业	
联系方式	13683477400	文化程度		身份证号	513902198804066365		
住址	简阳市干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐

8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）：

无

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	刘凤英	性别	女	年龄	56	职业	
	联系方式	13880216390	文化程度		身份证号	510122196705118764		
	住址	简阳市三星镇干石山村 6 组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）：							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
工程概况	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，占地面积12.3956亩。项目计划新建年存栏仔猪4000头，年出栏育肥猪8000头养殖场一处。新建各类猪舍6176m²，主要建设内容包括：（1）4栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建50m³沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	唐兵	性别	男	年龄	24	职业	
	联系方式	15982924959	文化程度		身份证号	513902199905226377		
	住址	简阳市干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？			良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐			
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？			满意☑ 基本满意☐ 不满意☐			
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？			废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐			
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？			有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑			
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。			无☑ 较轻☐ 较重☐			
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：			废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐			
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度			满意☑ 较满意☐ 不满意☐			
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无						

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

工程概况	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村10组，占地面积12.3956亩。项目计划新建年存栏仔猪4000头，年出栏育肥猪8000头养殖场一处。新建各类猪舍6176m²，主要建设内容包括：（1）4栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建50m³沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	唐中宣	性别	男	年龄	62	职业	
	联系方式	13550346039	文化程度		身份证号	511027196106146359		
	住址	四川省简阳市干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般□ 较差□ 非常差□						
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意□ 不满意□						
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物□ 生态破坏□ 废水☑ 噪声□ 环境风险□						
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响□ 不利影响□ 无影响☑						
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻□ 较重□						
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治□ 废水污染防治☑ 固体废物处置□ 噪声污染防治□ 生态减缓措施□ 其它□						
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意□ 不满意□						
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无							

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

工程概况	名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收						
	简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m²，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m³ 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。 目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。						
基本情况	姓名	黄得会	性别	女	年龄	49	职业	
	联系方式	18227902650	文化程度		身份证号	510121197402148 29		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						
调查内容	1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？			良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐			
	2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？			满意☑ 基本满意☐ 不满意☐			
	3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？			废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐			
	4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？			有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑			
	5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。			无☑ 较轻☐ 较重☐			
	6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：			废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐			
	7、您对该单位的环境保护工作满意程度			满意☑ 较满意☐ 不满意☐			
	8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无						

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

竣工环境保护验收公众参与调查表

名称：简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保验收

工程概况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目位于简阳市三星镇干石山村 10 组，占地面积 12.3956 亩。项目计划新建年存栏仔猪 4000 头，年出栏育肥猪 8000 头养殖场一处。新建各类猪舍 6176m^2，主要建设内容包括：（1）4 栋育肥舍；（2）消毒房、堆粪棚、中转料塔、公用设施、办公生活区、隔离房及门卫等；（3）新建 50m^3 沼气柜及相配套的污水处理设施，喷淋处理设施，建造废水贮存池及消纳污水管网设施；（4）相关水电、道路、围墙、绿化等配套工程和设备工程。

目前项目主体及配套工程已建成投入使用，整个工程可以进行环保验收。为了在工程竣工环境保护验收中充分了解公众意见，尊重公众的看法和选择，特向您发放此表，请您认真填写，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。

基本情况							
	姓名	张丽	性别	女	年龄	38	职业	
	联系方式	14702809335	文化程度		身份证号	513428198510180827		
	住址	简阳市三星镇干石山村6组						

调查内容

1、您认为项目区周围的环境质量总体状况如何？	良好☑ 一般☐ 较差☐ 非常差☐
2、您对本项目施工期、运行期采取的环保措施是否满意？	满意☑ 基本满意☐ 不满意☐
3、您认为本项目运行期应重点关注哪些环境问题？	废气☑ 固体废物☐ 生态破坏☐ 废水☑ 噪声☐ 环境风险☐
4、您认为本项目是否有利于当地居民生活？	有利影响☐ 不利影响☐ 无影响☑
5、固体废物储运及处理处置对您的影响程度。	无☑ 较轻☐ 较重☐
6、您认为本项目运行期应采取的环保措施主要为：	废气污染防治☐ 废水污染防治☑ 固体废物处置☐ 噪声污染防治☐ 生态减缓措施☐ 其它☐
7、您对该单位的环境保护工作满意程度	满意☑ 较满意☐ 不满意☐
8、其他方面要求或建议（您对本工程运行期环境保护方面的建议和要求）： 无	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场
简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目
竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境管理条例》（2017年修订）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）等法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，2023年10月15日，简阳市同合乡唐中顺家庭农场主持召开了“简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目”。参加会议的有：建设单位简阳市同合乡唐中顺家庭农场、验收报告编制单位四川优千胜环境工程有限公司及特邀专家等。会议成立了项目竣工环保验收工作组（名单附后）。通过审阅验收相关资料，并对照本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成如下意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

简阳市同合乡唐中顺家庭农场实施的“简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目”（以下简称“本项目”）位于简阳市三星镇干石山村10组，总占地面积12.3956亩，总建筑面积约6176m²。项目于2019年建设一座生猪育肥场，包括3栋育肥舍以及配套的办公用房、环保工程及公辅工程设施，年存栏生猪1000头，出栏生猪2000头；后于2020年2月在原厂址内进行改扩建，新增1栋育肥舍及部分配套设施，并调整猪舍布局，养殖规模增加到年存栏4000头生猪（出栏8000头生猪）。

本项目仅养殖育肥猪，无母猪饲养，仔猪主要从本公司其他种猪场购买，存栏量为4000头，年出栏8000头育肥猪。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年5月31日简阳市发展和改革局以“川投资备［2205-510185-04-01-333937］FGQB-0100号”文对本项目进行备案；2022年8月，四川优千胜环境工程有限公司编制完成《简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环境影响报告书》的报批本；2022年8月23日，成都市简阳生态环境局出具关于简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目《环境影响报告书》的批复（见附件：简环评审〔2022〕22号）；2023年2月22日完成排污登记（登记编号：92510185MA6CQNE96T001X）。

本项目于2022年9月开工建设，2022年12月建成并试运营。

（三）投资情况

本项目实际总投资750万元，其中环保投资173.25万元，占项目总投资的23.1%。

（四）验收范围

年生猪存栏4000头，年出栏育肥猪8000头所配套建设的主体工程、辅助工程、公用工程、办公生活设施和环保工程等。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目实际建设内容与环评阶段核定建设内容一致，项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要包括养殖废水（含猪尿液、猪舍冲洗废水）、生活污水。

养殖废水（含粪便）及生活污水通过1套污水处理系统（处理工艺为“收集调节池+固液分离+沼液池+储液池+储存池”）进行处理；经污水处理系统处理后的废水全部用于周边农田施肥，不外排（农灌协议见附件）。

本项目废水处理系统主要包括1座总容积为16900m^3的废水暂存池及其配套管网和喷洒系统、1座处理规模为50m^3/d的污水处理站、1座容积为80m^3的事故应急池。

（二）废气

本项目养殖场废气主要包括各类恶臭（包括猪舍恶臭、堆粪棚恶臭、污水处理系统恶臭）及沼气。

（1）养殖区猪舍恶臭治理措施：主要采用“圈舍通风+优化饲料+合理布局”等措施从源头减少恶臭，然后在风机排风口设置喷雾除臭器进行除臭，处理后无组织排放。

（2）猪粪暂存间恶臭治理措施：堆粪棚全密闭，通过风机将废气引出，并在风机口加装生物喷雾除臭器处理后排放。

（3）污水处理设施恶臭治理措施：污水处理站收集调节池、干湿分离机产生的臭气与4#圈舍共用一套废气处理设施。

（4）沼气治理措施：经脱水脱硫后用作进入沼气柜，然后通过火炬燃烧。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于猪舍猪叫、风机、固液分离机和水泵等设备及进出车辆噪声。本项目采取了如下噪声防治措施：①对高噪声设备采取减震、隔震措施；②粪污潜水泵进出口管道采用柔性接头③猪舍通风机出风侧水平风道上安装消声器，风道内贴吸声材料；④尽可能满足猪只饮食需要，避免发出叫声；⑤场内车辆限速、禁鸣。

通过上述措施治理后，再经距离衰减从而实现厂界噪声达标排放。

（四）固废

本项目营运期固体废物主要为员工生活垃圾袋装收集后交市政环卫部门清运处置；废包装袋集中收集外售废品收购站；废脱硫剂废料暂存于仓库，交由脱硫剂供应商回收处理；猪粪（经干湿分离处理后暂存的猪粪）和污水处理系统的沼气池污泥一起收集暂

存于猪粪暂存间，定期再交简阳市三星惠农科技有限公司处置（猪粪清运处置合同见附件）；病死猪委托简阳汇迪无害化处理有限公司处理；医疗废物（畜禽医疗废物）集中收集交四川绿行环保科技有限公司处置（处置协议见附件）；危险废物交由成都兴蓉环保科技有限公司处置（处置协议见附件）。

（五）分区防渗

本项目重点防渗区（猪舍、隔离区、粪便临时堆存间、污水处理设施、事故应急池、医疗废物暂存间、危险废物暂存间）满足重点防渗要求（采取 2mmHDPE 土工膜+水泥防渗）；一般防渗区（检疫区、仓库、一般固废暂存间、变配电室、控制室）满足一般防渗要求（粘土层+15cmP8 厚抗渗混凝土防渗）；办公生活区、厂区道路满足简单防渗要求（一般水泥硬化）。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险事故措施

本项目建设有 1 座容积约 80m³ 的事故应急池；同时企业设置相应的风险防范措施和管理制度；编制突发环境事件应急预案并进行了备案。

2、环境管理及监测

本项目设立环境管理小组，定期委托具有监测资质的单位进行环境监测工作。

3、卫生防护距离

本项目以养殖区、环保设施（包括猪舍、污水处理站、猪粪暂存间、无害化处理间）边界设置了 200m 的卫生防护距离，该防护距离范围内无散居农户等环境敏感保护目标（建设单位已与防护距离范围内原有10处民房所有者签订了租用协议实现了功能置换，见附件）。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

本项目营运期废水经处理后用于周边农田施肥不外排，同时建设单位已与简阳干石山村村民 4 组、6 组及简阳胡志亮家庭农场等签订《猪粪（沼肥）消纳协议》。

2、废气

废气监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织排放废气中氨和硫化氢监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值；臭气浓度检测结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 7 中排放标准限值。因此，本项目监测期间各无组织废气均能实现达标排放，满足验收要求。

3、噪声

噪声监测结果表明：厂界噪声监测中各监测点位昼间、夜间噪声值均满足《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 2 类区标准，满足验收要求。

4、固废

根据现场检查：本项目营运期间各类固废均得到妥善处置，去向明确，未产生二次污染。

（二）环境管理检查

本项目从开工到运行履行了各项环保手续，严格执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。各项环保设施设备基本按照环评要求建设，有相应的环境管理制度。

五、工程建设对环境的影响

根据《简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目竣工环境保护验收监测报告》可知：本项目废水全部用于周边农田施肥不外排，废气和噪声经相关措施处置后均能达标排放，各类固废均能做到妥善处置、去向明确；营运期加强管理，确保设施正常运行，本项目的实施未对周边环境产生明显不利影响。

六、验收结论

简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目环保手续齐全，基本落实了环评及其批复提出的环保措施和要求，无施工期环境遗留问题。验收监测结果表明：本项目废水全部用于周边农田施肥不外排，废气和噪声均达到相应的验收标准，各类固废得到妥善处置；公司制定了环保管理制度；建议通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求及建议

1、严格落实场区消毒、灭菌要求，加强疫病风险防范。

2、加强各项环境管理制度的落实和环保设施（含田间暂存间、输水管道等）的定期检查及维护，确保废水全部用于周边农田施肥不外排，废气和噪声长期稳定达标排放。

3、加强固废管理，做好处理台账；搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，做好卫生防疫工作。

4、加强项目日常环保档案管理，执行定期环境监测制度。

5、严格落实安全管理相关规定，避免因安全事故引发突发环境污染事件。

八、验收组人员信息

验收组人员信息见附表。

验收组人员信息表				
姓　名	工作单位	职务/职称	电　话	备注
唐仕财	简阳市同合乡唐中顺家庭农场	经理	15228350119	
闵林	成都创境环保工程有限公司	高工	18011491805	专家
李世飞	四川中蜀宇投环保工程有限公司	高工	13880384591	专家
蒋小雨	四川爱欧特环保科技有限公司	高工	18080457150	专家
李小川	四川优千胜王环境工程有限公司	工程师	13881973113	

简阳市同合乡唐中顺家庭农场

2023 年 10 月 15 日

简阳市同合乡唐中顺家庭农场

简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

简阳市同合乡唐中顺家庭农场（以下简称“我公司”）简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

我公司简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，该项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

我公司简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目于 2022 年 12 月竣工。2022 年 12 月，我公司开展了本项目的竣工环境保护验收工作，对公司进行自查，并根据自查结果编制了验收监测方案。并委托成都斯坦德分析检测有限公司于 2022 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对本项目进行竣工环境保护验收监测。根据监测结果，我公司于 2023 年 2 月编制了该项目竣工环境保护验收监测表。

2023 年 2 月 6 日，我公司组织成立的验收工作组对简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目开展了验收评审会，在勘察现场和验收监测报告内容核查的基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成了

科学合理的验收意见。验收意见的结论为：简阳市同合乡唐中顺家庭农场简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

我公司为加强环境保护管理，明确了各级各部门的环保职责，以及具体负责环境保护的日常管理工作。公司内部配备专人管理，负责公司内部日常环保监督管理工作。我公司制定了《环境保护管理制度》，保证环保工作正常有序地开展，也为环保设施的正常稳定运行提供了保证。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

我公司简阳市同合乡唐中顺家庭农场养殖场扩建项目未涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目环境影响报告表中不设置卫生防护距离，无居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，因此，不会对区域生态环境产生不良影响。

2.4 项目变更情况

经现场勘查，该项目实际建设内容与环评设计建设内容一致。

3 整改工作情况

项目验收期间未发现本项目存在问题。
